





Almirante Brown
Avellaneda
Capital Federal
Esteban Echeverría
Ezeiza
La Matanza
Lanús
Lomas de Zamora
Morón

CUENCA MATANZA - RIACHELO
ESTADO de PROYECTOS y OBRAS
Al 30-06-2018

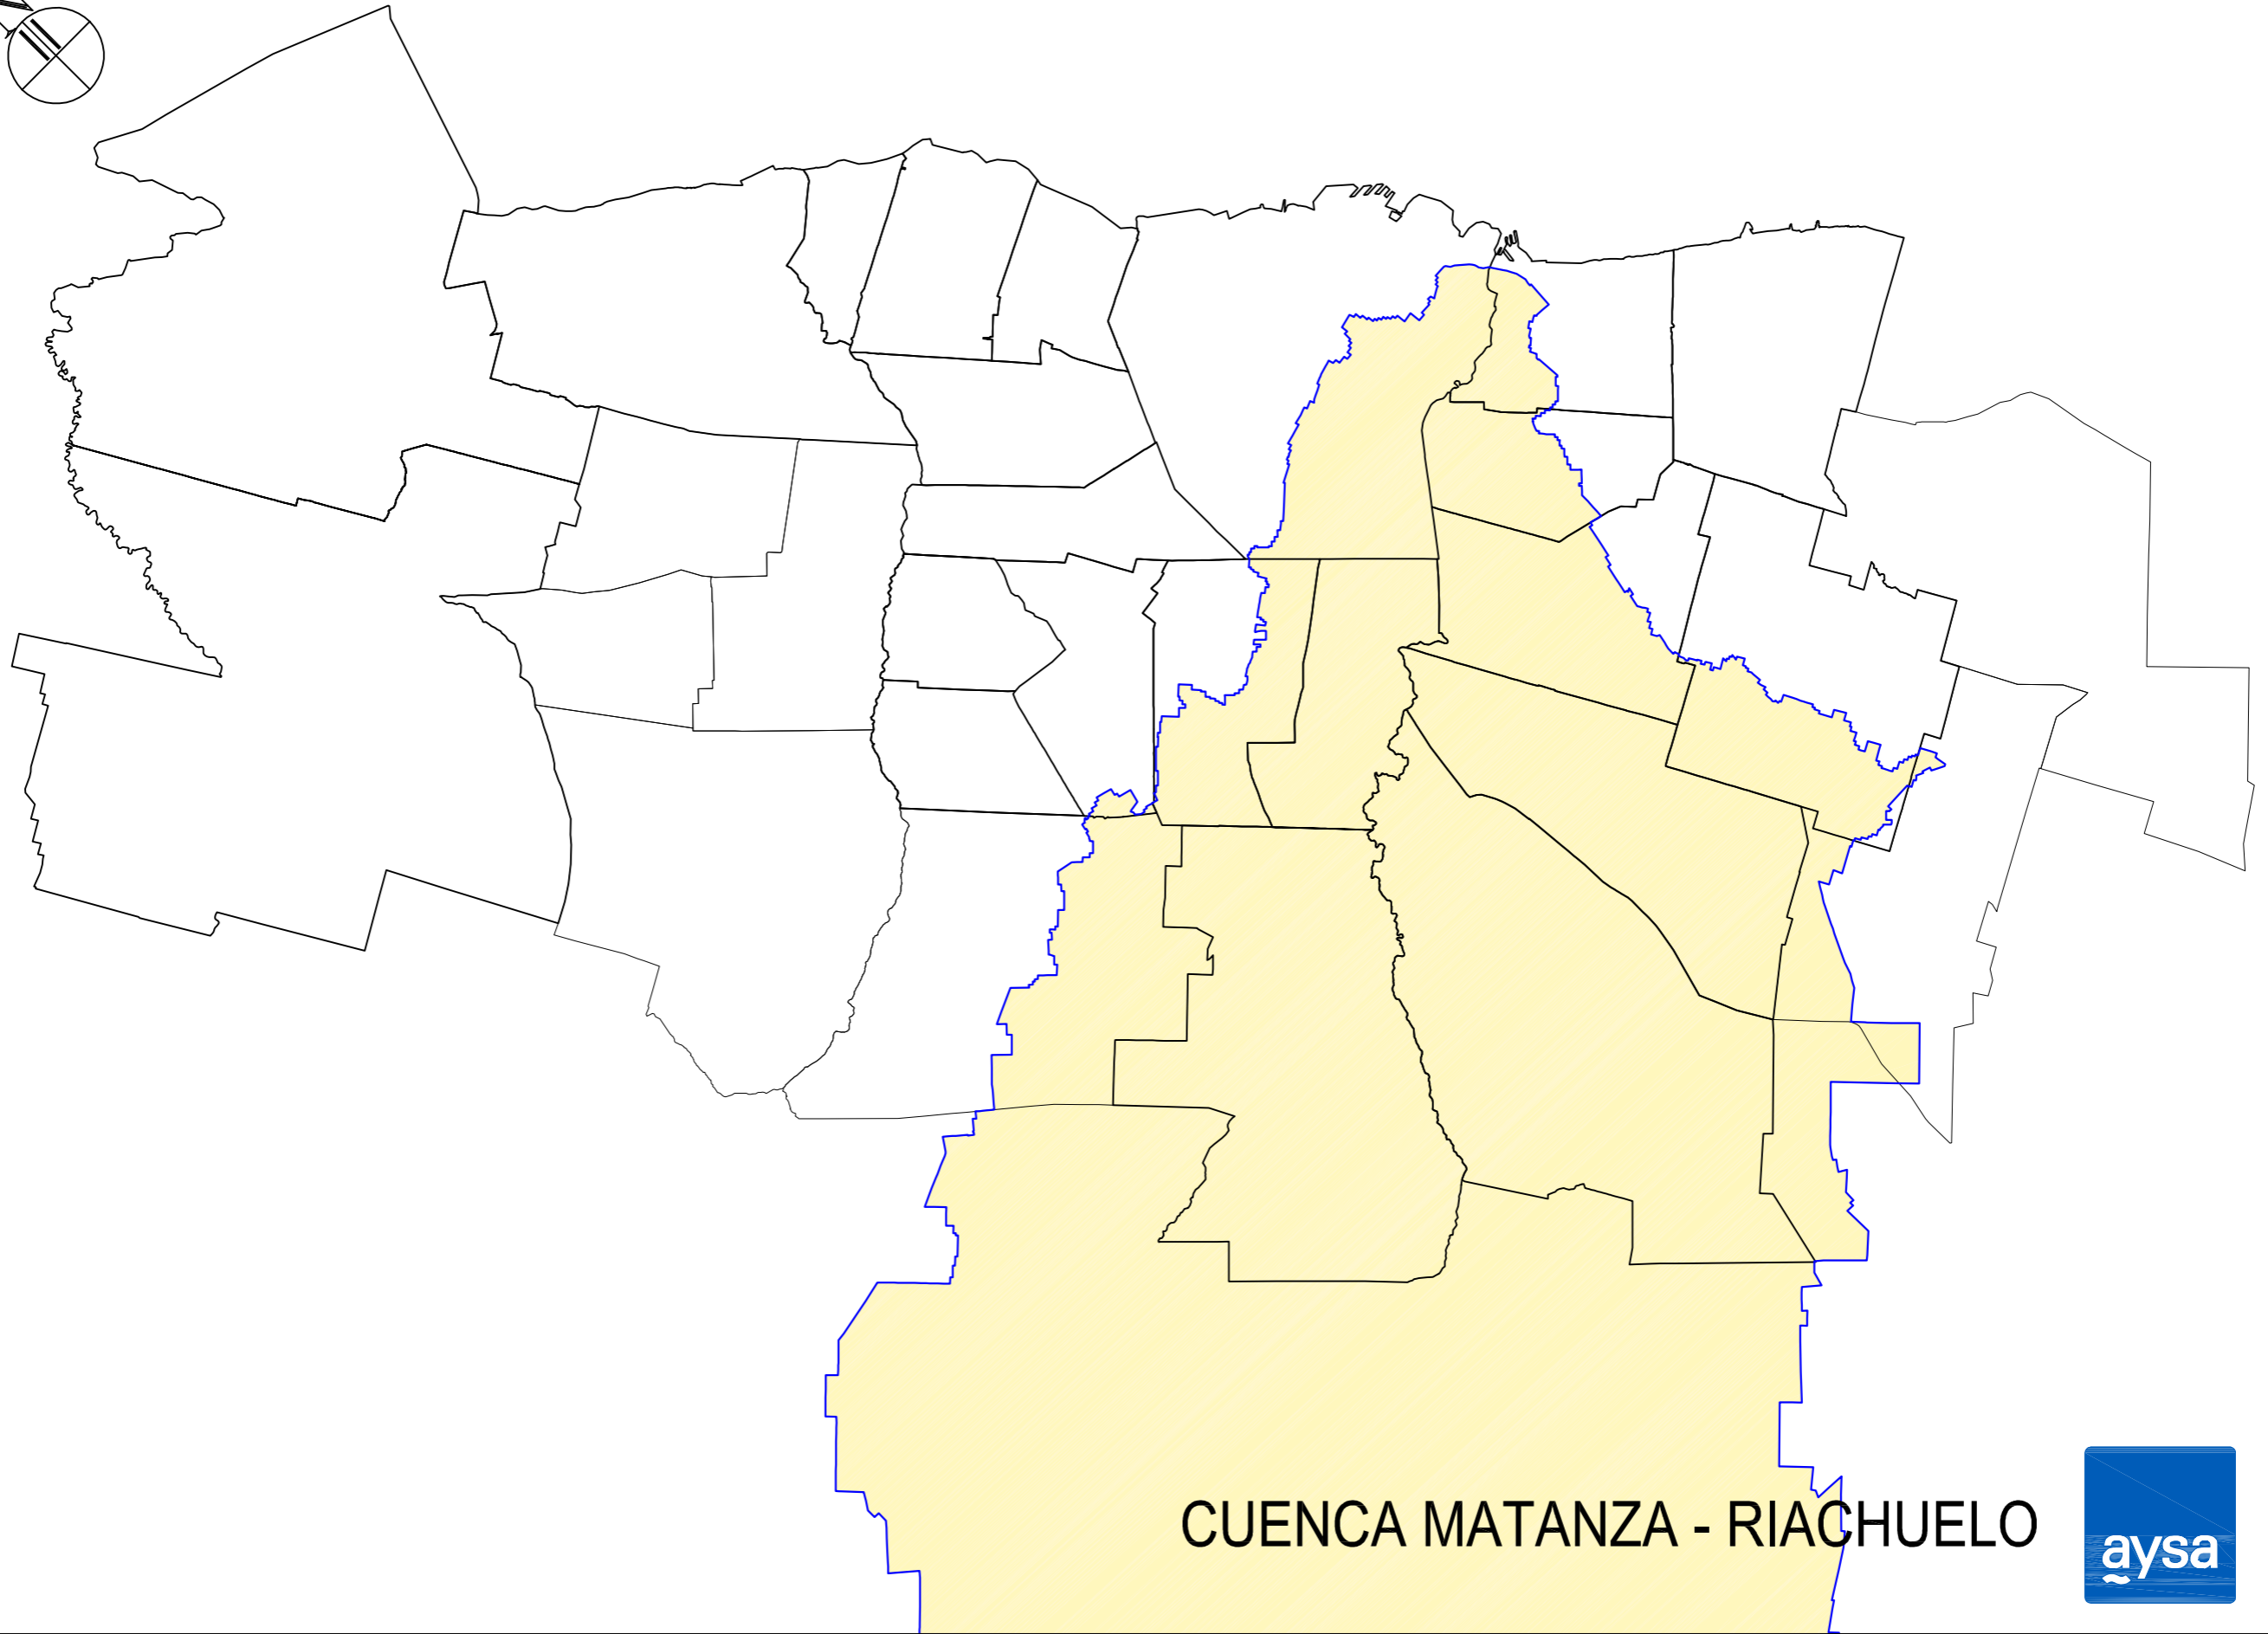







CUENCA MATANZA - RIACHUELO






PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

DESAGÜES CLOCALES




REFERENCIAS




-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR

-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS


PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018

CÓDIGO ARCHIVO: DG AB Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA

DESAGÜES CLOCALES

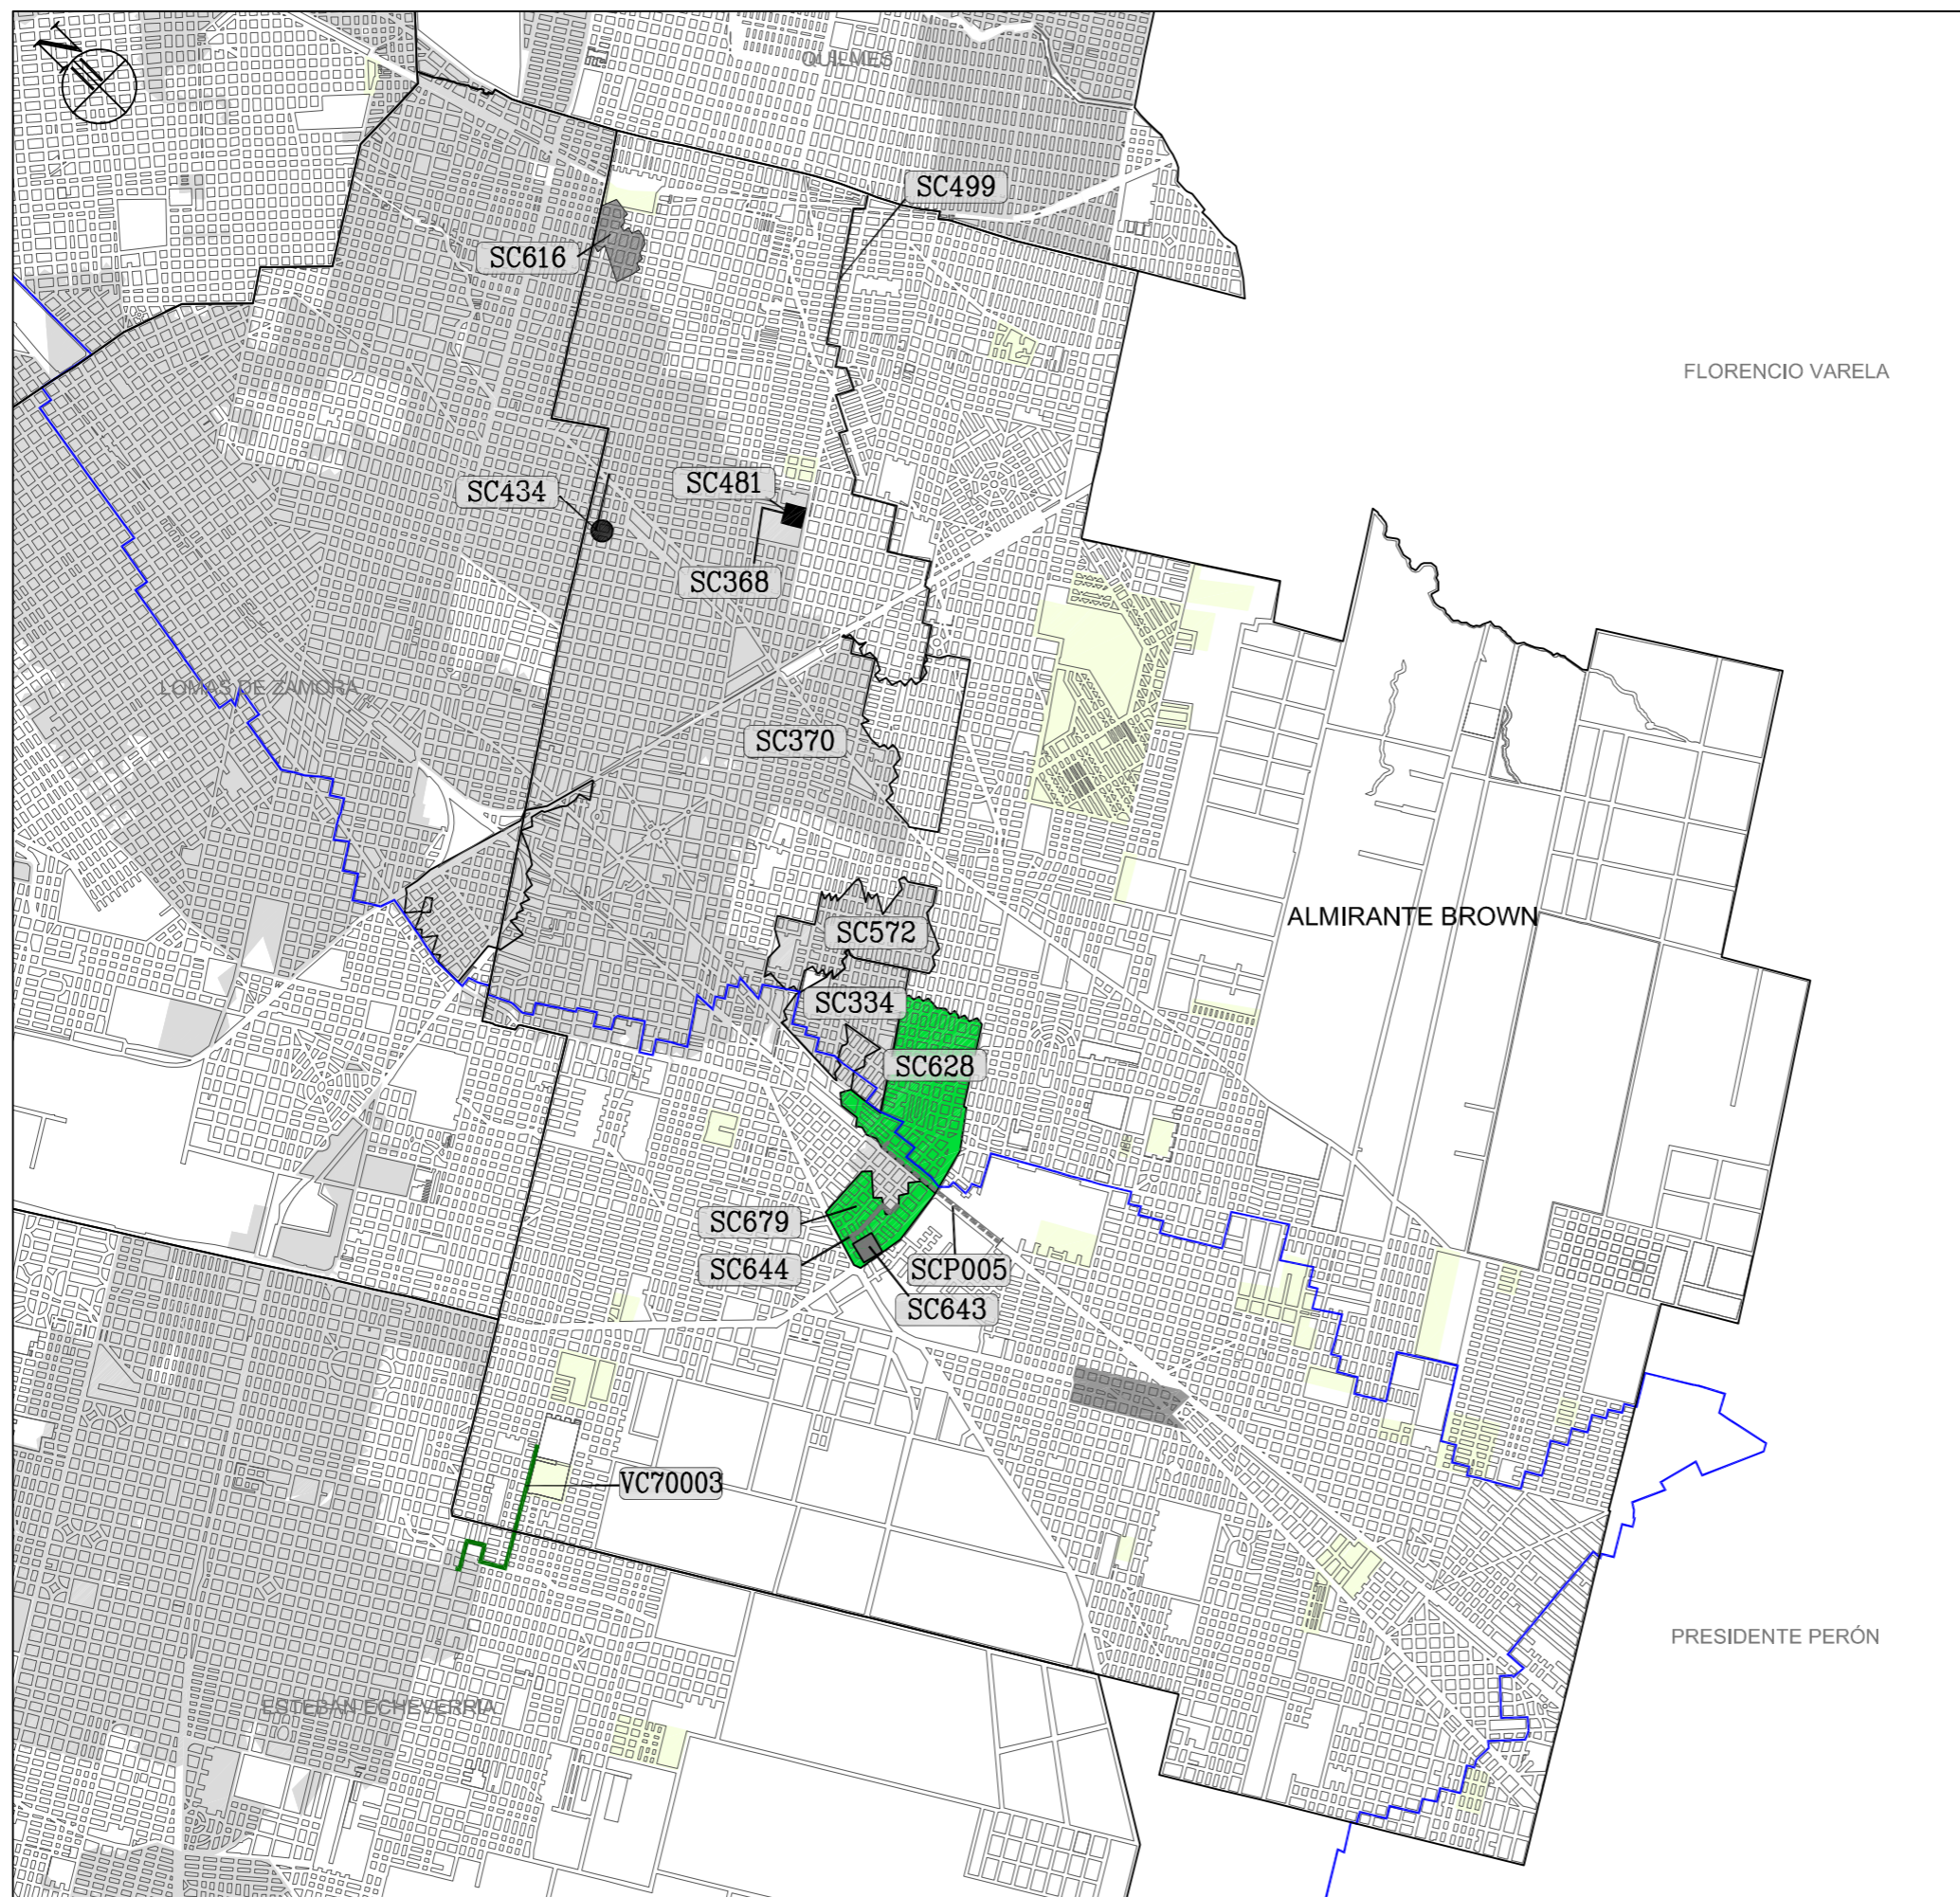







BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (CIVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL	
RADIO SERVIDO																		
RAFAEL CALZADA	EXPANSIÓN	SC481	C-1-1.2-OB-000-3.11	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SAN JAVIER ESTE	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	GTMH ARGENTINA S.A.	2.901.204	300	100%	ago-12	oct-12	ene-14	
BURZACO	EXPANSIÓN	SC572	C-1-1.2-RS-AB-3.11.5.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUE NORTE - CUENCA A	AYSA	AYSA	5.950	FINALIZADA	EN SERVICIO	VIAL AGRO S.A.	37.515.276	270	100%	mar-13	may-13	ago-14	
RAFAEL CALZADA JOSÉ MARMOL	EXPANSIÓN	SC368	C-1-1.2-RS-AB-3.11.3	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JAVIER ESTE	AYSA	AYSA	7.982	FINALIZADA	EN SERVICIO	LIHUÉ INGENIERÍA S.A. - ILUBAIRES S.A. - U.T.E.	29.610.182	300	100%	mar-13	may-13	dic-14	
BURZACO	EXPANSIÓN	SC334	C-1-1.2-RS-AB-3.11.5.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ CENTRO	AYSA	AYSA	5.725	FINALIZADA	EN SERVICIO	C.P.C. S.A. - TECMA S.A. - U.T.E.	30.721.472	300	100%	abr-13	jul-13	sep-14	
VARIOS	EXPANSIÓN	SC370	C-1-1.2-RS-AB-3.11.3	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA MARMOL II	AYSA	AYSA	15.297	FINALIZADA	EN SERVICIO	PROBA S.A.C.I.F.I.A. - BRICONS S.A.I.C. - U.T.E.	56.586.574	360	100%	mar-11	may-11	mar-15	
JOSÉ MARMOL	EXPANSIÓN	SC434	C-1-1.2-OB-000-3.9	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO RAFAEL CALZADA 2	AYSA	AYSA	15.900	FINALIZADA	EN SERVICIO	HICLOS S.R.L.	6.331.656	1.081	100%	dic-13	ene-14	oct-17	
RAFAEL CALZADA CLAYPOLE	EXPANSIÓN	SC499	C-1-1.2-OB-000-3.3	SIN AFECTACIÓN A CMR	COLECTOR CLOACAL ESTE RAMAL SUR TRAMO CLAYPOLE - ETAPA 1	AYSA	AYSA	252.864	FINALIZADA	EN SERVICIO	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ELEPRINT S.A. - U.T.E.	284.490.225	1.127	100%	ago-13	mar-14	abr-17	
TOTAL												448.156.590						
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
SAN JOSÉ	EXPANSIÓN	SC616	C-1-1.2-RS-AB-3.9.5	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL COMPLEMENTO SAN JAVIER NORTE	AYSA	AYSA	2.038	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	VNP SANITARIOS S.A.	11.995.749	210	100%	dic-12	mar-13	ene-14	
BURZACO	EXPANSIÓN	SCP005	C-1-1.2-OB-AB-3.12	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	COLECTOR LONGCHAMPS - ETAPA 1	PLAN MÁS CERCA	MUNICIPIO	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MUNICIPALIDAD DE ALTE. BROWN	12.381.675	180	100%	dic-14	sep-15	-	
BURZACO	EXPANSIÓN	SC643	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ADROGUÉ SUR 2	AYSA	AYSA	3.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	PRATES Y CÍA S.A.	10.984.430	480	100%	sep-16	nov-16	feb-18	
BURZACO	EXPANSIÓN	SC644	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN ADROGUÉ SUR 2	AYSA	AYSA	1.741	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	PRATES Y CÍA S.A.	2.495.976	180	100%	sep-16	nov-16	abr-17	
TOTAL												37.857.829						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
BURZACO	EXPANSIÓN	SC628	C-1-1.2-RS-AB-3.11.6	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO NORTE	AYSA	AYSA	6.294	EN EJECUCIÓN		ILUBAIRES S.A.	85.936.059	480	58%	ene-17	feb-17		
BURZACO	EXPANSIÓN	SC679	C-1-1.2-RS-AB-3.11.5.3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 2	AYSA	AYSA	2.929	EN EJECUCIÓN		CARBE S.A.	29.691.931	240	66%	ene-17	mar-17		
VARIOS	EXPANSIÓN	VC70003	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BARRIO LINDO	PFV	AYSA	9.322	EN EJECUCIÓN		INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L.	21.383.441	270	0%	dic-17	mar-18		
TOTAL												137.011.431						




PARTIDO DE AVELLANEDA

DESAGÜES CLOCALES




REFERENCIAS




-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR

-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS


PARTIDO DE AVELLANEDA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018

CÓDIGO ARCHIVO: DG AVE Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA



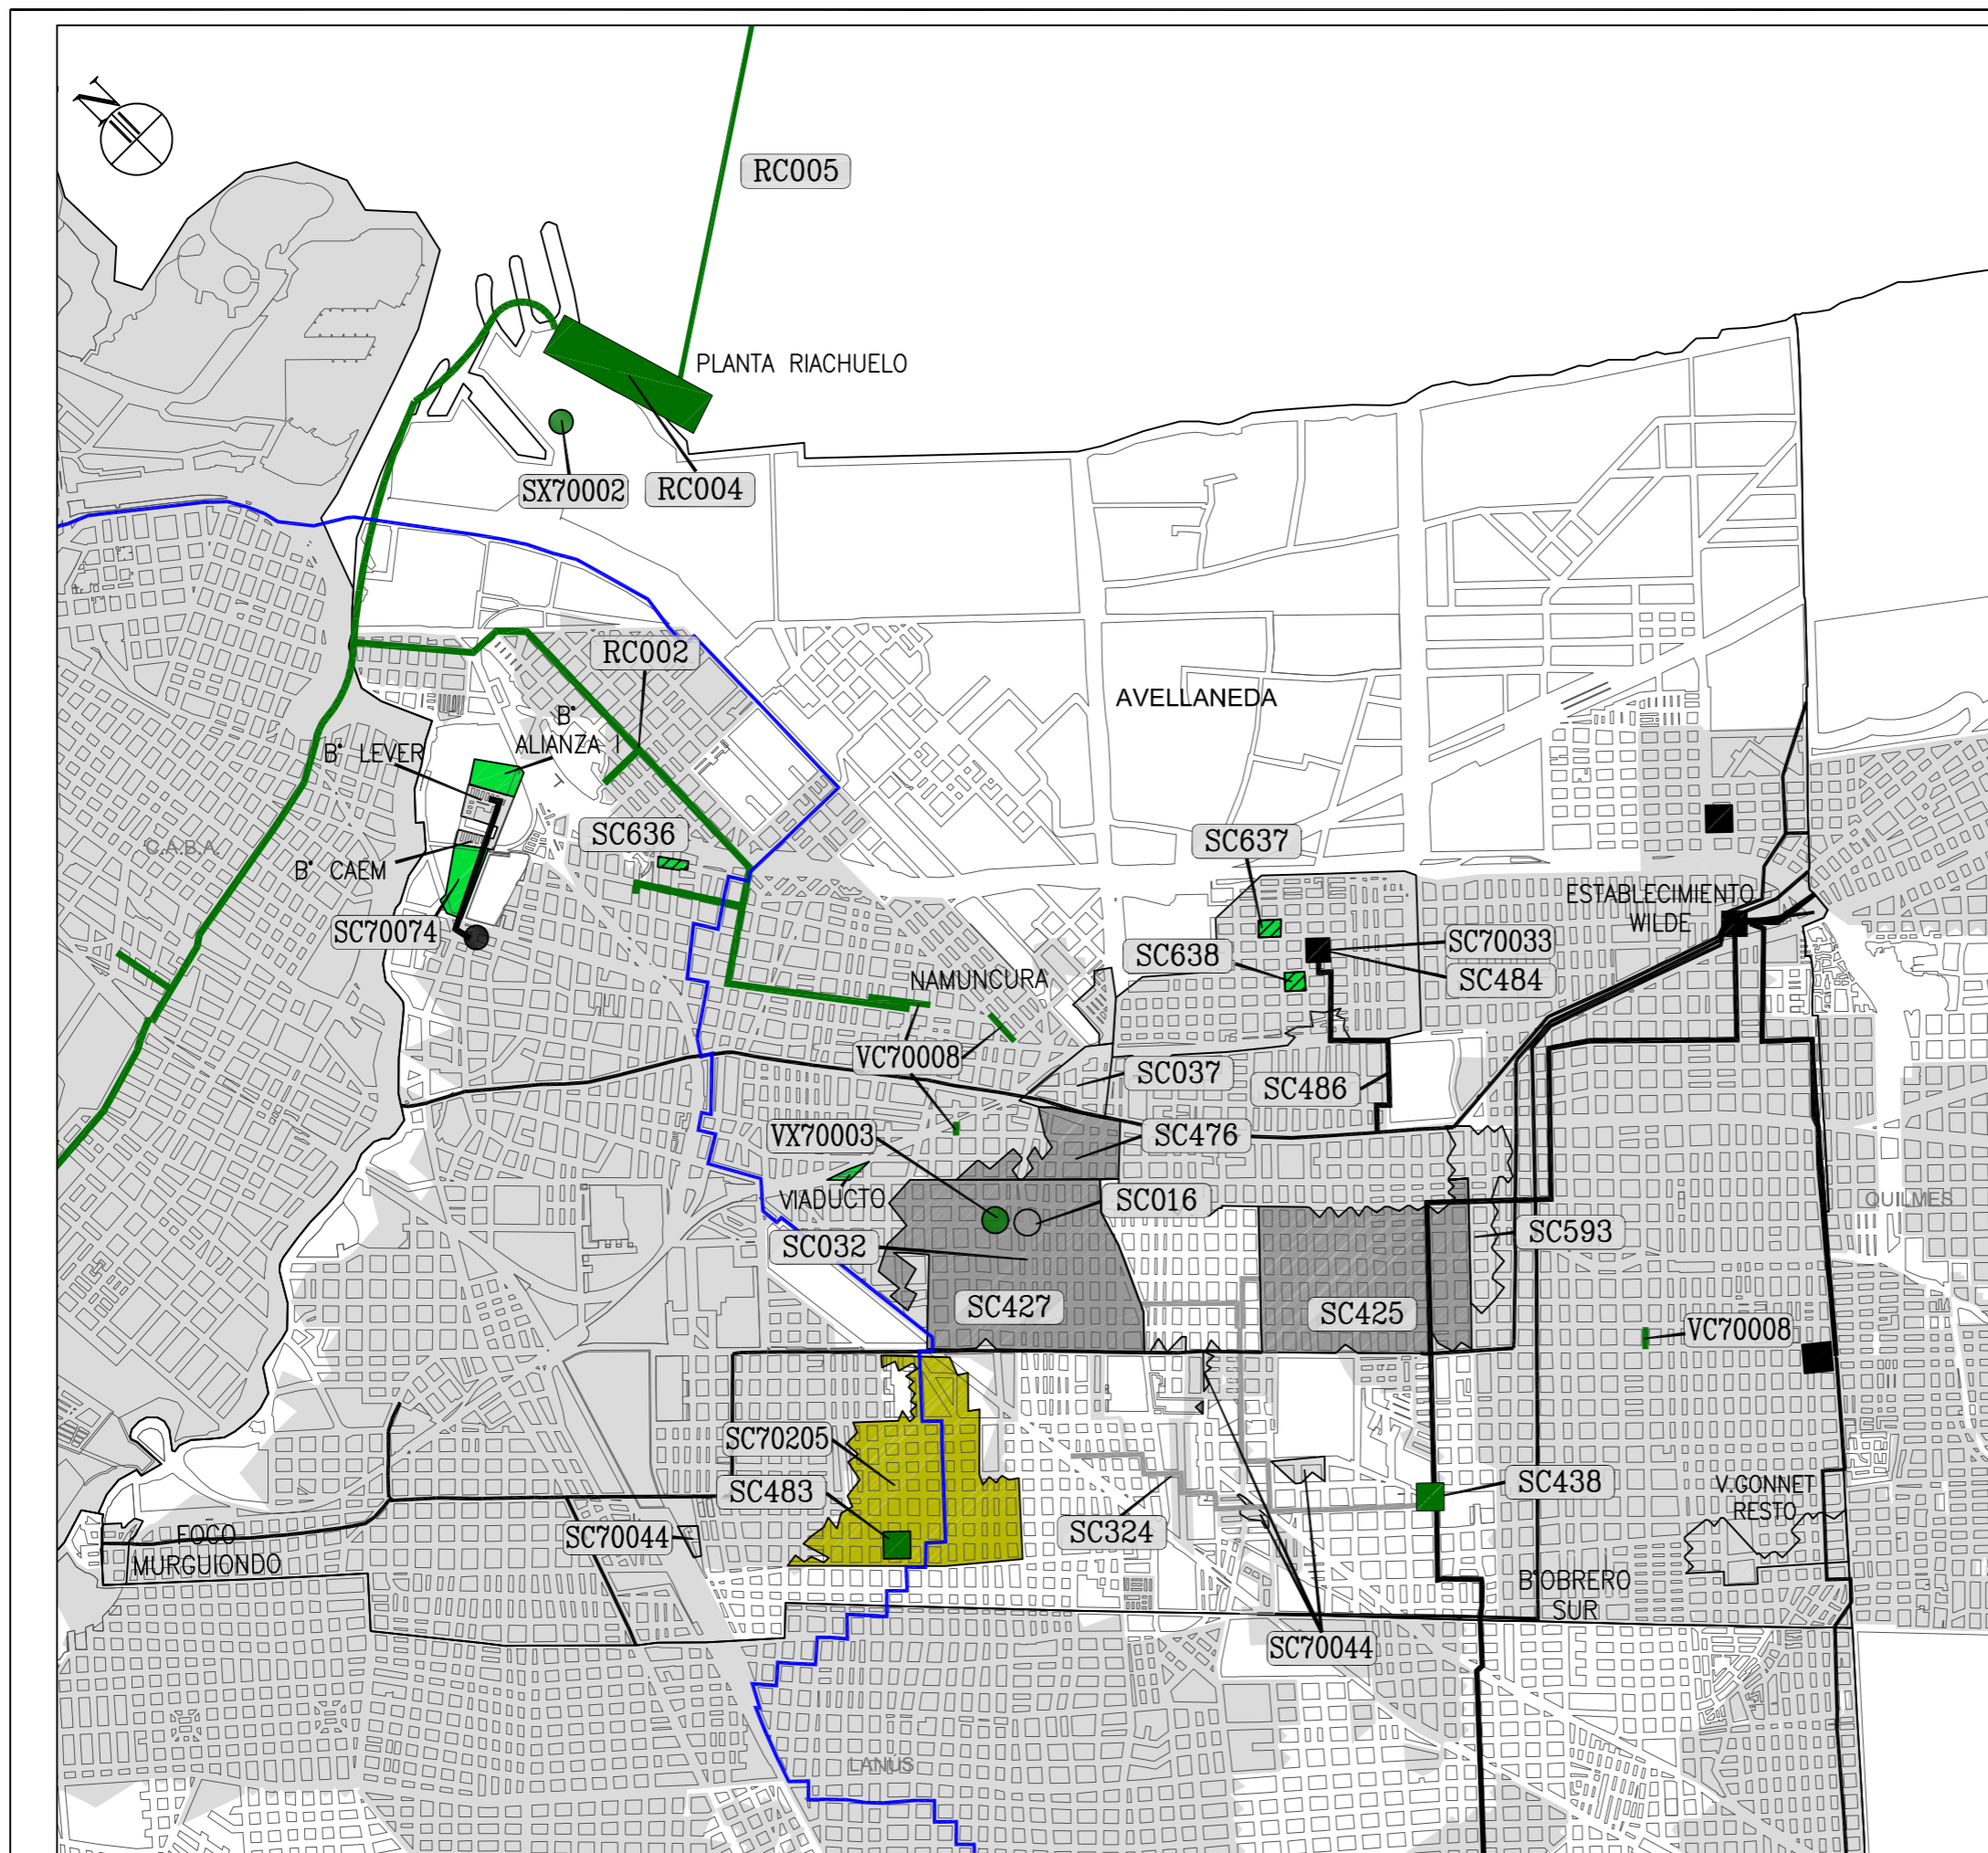



DESAGÜES CLOCALES






BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL		
RADIO SERVIDO																			
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC593	C-1-1.2-RS-AV-5.1.1.6.7	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL CRISTÓBAL COLÓN A 2° CM	AYSA	AYSA	1.650	FINALIZADA	EN SERVICIO	EDISUD S.A.	7.773.887	180	100%	ago-12	sep-12	may-14		
SARANDÍ	EXPANSIÓN	SC037	C-1-1.3-RS-AV-1.4.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL AVELLANEDA NORTE - B	AYSA	AYSA	680	FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	4.735.571	180	100%	jun-13	ago-13	dic-14		
VARIOS	EXPANSIÓN	SC70044	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	COLECTORES FALTANTES AVELLANEDA ETAPA 1	AYSA	C+T	970	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA	6.008.236	240	100%	oct-14	nov-14	mar-16		
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC486	C-1-1.2-OB-000-5.1.1.7	SIN AFECTACIÓN A CMR	IMPULSIÓN BARRIO DOMÍNICO	AYSA	AYSA	10.831	FINALIZADA	EN SERVICIO	MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A.	7.501.119	150	100%	ago-12	sep-12	oct-14		
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC484	C-1-1.2-OB-000-5.1.1.7	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DOMÍNICO	AYSA	AYSA	10.830	FINALIZADA	EN SERVICIO	BERNAOLA CONSTRUCCIONES S.H.	3.401.250	300	100%	jul-11	ago-11	-		
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC70033	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DOMÍNICO OBRA ELECTROMECÁNICA - TERMINACIÓN	AYSA	AYSA	10.830	FINALIZADA	EN SERVICIO	AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L.	13.052.091	592	100%	abr-15	may-15	feb-17		
TOTAL												42.472.153							
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																			
SARANDÍ	EXPANSIÓN	SC016	C-1-1.2-OB-000-5.1.1.6	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO AVELLANEDA OESTE	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	BERNAOLA CONSTRUCCIONES S.H.	5.031.778	270	26%	jun-11	ago-11	-		
GERLI	EXPANSIÓN	SC324	C-1-1.2-OB-000-5.1.1.3	SIN AFECTACIÓN A CMR	IMPULSIÓN GENERAL PINTO	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ROWING S.A.	5.202.587	270	100%	may-11	jun-11	may-14		
SARANDÍ	EXPANSIÓN	SC032	C-1-1.2-OB-000-5.1.1.6	SIN AFECTACIÓN A CMR	IMPULSIÓN AVELLANEDA OESTE	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A.	7.057.228	150	100%	dic-11	mar-12	ago-14		
SARANDÍ	EXPANSIÓN	SC476	C-1-1.2-RS-AV-5.1.1.6.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE - A	AYSA	AYSA	2.212	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ACRI CONSTRUCCIONES S.A.	21.760.538	691	100%	feb-14	abr-14	feb-16		
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC425	C-1-1.2-RS-AV-5.1.1.6.7	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN	AYSA	AYSA	10.854	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	PROBA S.A. - GADES S.A. - UTE	176.526.483	660	100%	jun-14	dic-14	mar-17		
SARANDÍ	EXPANSIÓN	SC427	C-1-1.2-RS-AV-5.1.1.6.5	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA AVELLANEDA OESTE	AYSA	AYSA	9.427	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	LIHUE INGENIERÍA S.A. - ILUBAIRES S.A. - APCO S.A. - UTE	187.710.064	905	100%	mar-14	may-14	feb-17		
TOTAL												403.288.678							
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																			
DOCK SUD	EXPANSIÓN	SC636	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL AUTOPISTA Y 12 DE OCTUBRE (Etapa II)	PFV	MUNICIPIO	400	EN EJECUCIÓN		AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.	-	-	95%	-				
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC637	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL 62 VIVIENDAS BARRIO NUEVA ANA	PFV	MUNICIPIO	310	EN EJECUCIÓN		SENTRA S.A.	-	365	78%	dic-07	may-09			
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC638	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL 112 VIVIENDAS BARRIO EL RELAMPAGO	PFV	MUNICIPIO	560	EN EJECUCIÓN		EDUARDO COLOMBI	-	365	93%	ene-10	oct-10			
VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SC438	C-1-1.2-OB-000-5.1.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RAMAL AVELLANEDA	AYSA	AYSA	400.000	EN EJECUCIÓN		ELEPRINT S.A.	215.569.841	1.045	89%	dic-12	may-14			
CONSTITUCIÓN DOCK SUD	EXPANSIÓN	RC002	C-1-1.1-OB-000-3.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	SISTEMA RIACHUELO - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA Y DESVÍO COLECTOR BAJA COSTANERA	BIRF	AYSA	4.300.000	EN EJECUCIÓN		CONSORCIO CMI GHELLA SPA SUCURSAL ARGENTINA GHELLA SOGENE CA SUCURSAL ARGENTINA UNIÓN TRANSITORIA	11.138.080.192	2.171	38%	abr-14	ene-15			
DOCK SUD	EXPANSIÓN	RC004	C-1-1.1-OB-000-2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	SISTEMA RIACHUELO - PLANTA DE PRETRATAMIENTO, EE Y EB	AYSA	AYSA	4.300.000	EN EJECUCIÓN		ESUCO S.A. - JCR S.A. - CPC S.A. - CYE CONSTRUCCIONES S.A. UTE	3.765.816.361	1.460	10%	oct-14	jun-15			
DOCK SUD	EXPANSIÓN	RC005	C-1-1.1-OB-000-1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	SISTEMA RIACHUELO - EMISARIO Y DIFUSORES	BIRF	AYSA	4.300.000	EN EJECUCIÓN		IMPREGILO S.P.A. - S.A. HEALY COMPANY - UTE	12.985.988.948	2.267	29%	abr-14	ene-15			
VARIOS	EXPANSIÓN	VX70003	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL Y VÁLVULAS REGULADORAS	AYSA	AYSA	-	EN EJECUCIÓN		APCO S.A.	52.892.328	270	87%	sep-16	nov-16			
AVELLANEDA	EXPANSIÓN	SC70074	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA TRANQUILA	AYSA	C+T	2.239	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA	4.524.660	360	8%	nov-16	abr-17			
GERLI	EXPANSIÓN	SC483	C-1-1.2-OB-000-5.1.1.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GENERAL SARMIENTO	AYSA	AYSA	7.700	EN EJECUCIÓN		EMICO S.A.	18.632.790	390	2%	dic-17	mar-18			
VARIOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	VC70008	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL - CLOACAS FALTANTES REGION SUDESTE	AYSA	AYSA	2.352	EN EJECUCIÓN		BERNARDI CONSTRUCCIONES S.R.L.	15.906.855	300	0%	nov-17	may-18			
DOCK SUD	EXPANSIÓN	SX70002	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTRUCTURA ENTERRADA PARA LA FUTURA ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA A LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO	AYSA	AYSA	-	CONTRATADA		CONSORCIO CMI GHELLA SPA SUCURSAL ARGENTINA GHELLA SOGENE CA SUCURSAL	515.632.799	270	0%	may-18				
TOTAL												28.713.044.774							
OBRAS EN LICITACIÓN / PRÓXIMAS A LICITAR																			
GERLI	EXPANSIÓN	SC70205	C-1-1.2-RS-AV-5.1.1.6.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA	AYSA	AYSA	7.637	EN LICITACIÓN	PARA PREADJUDICACIÓN		127.562.372,64	510						
TOTAL												127.562.373							

CAPITAL FEDERAL DESAGÜES CLOCALES







REFERENCIAS

-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS


-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR
-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

CAPITAL FEDERAL

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG CABA Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA

DESAGÜES CLOCALES

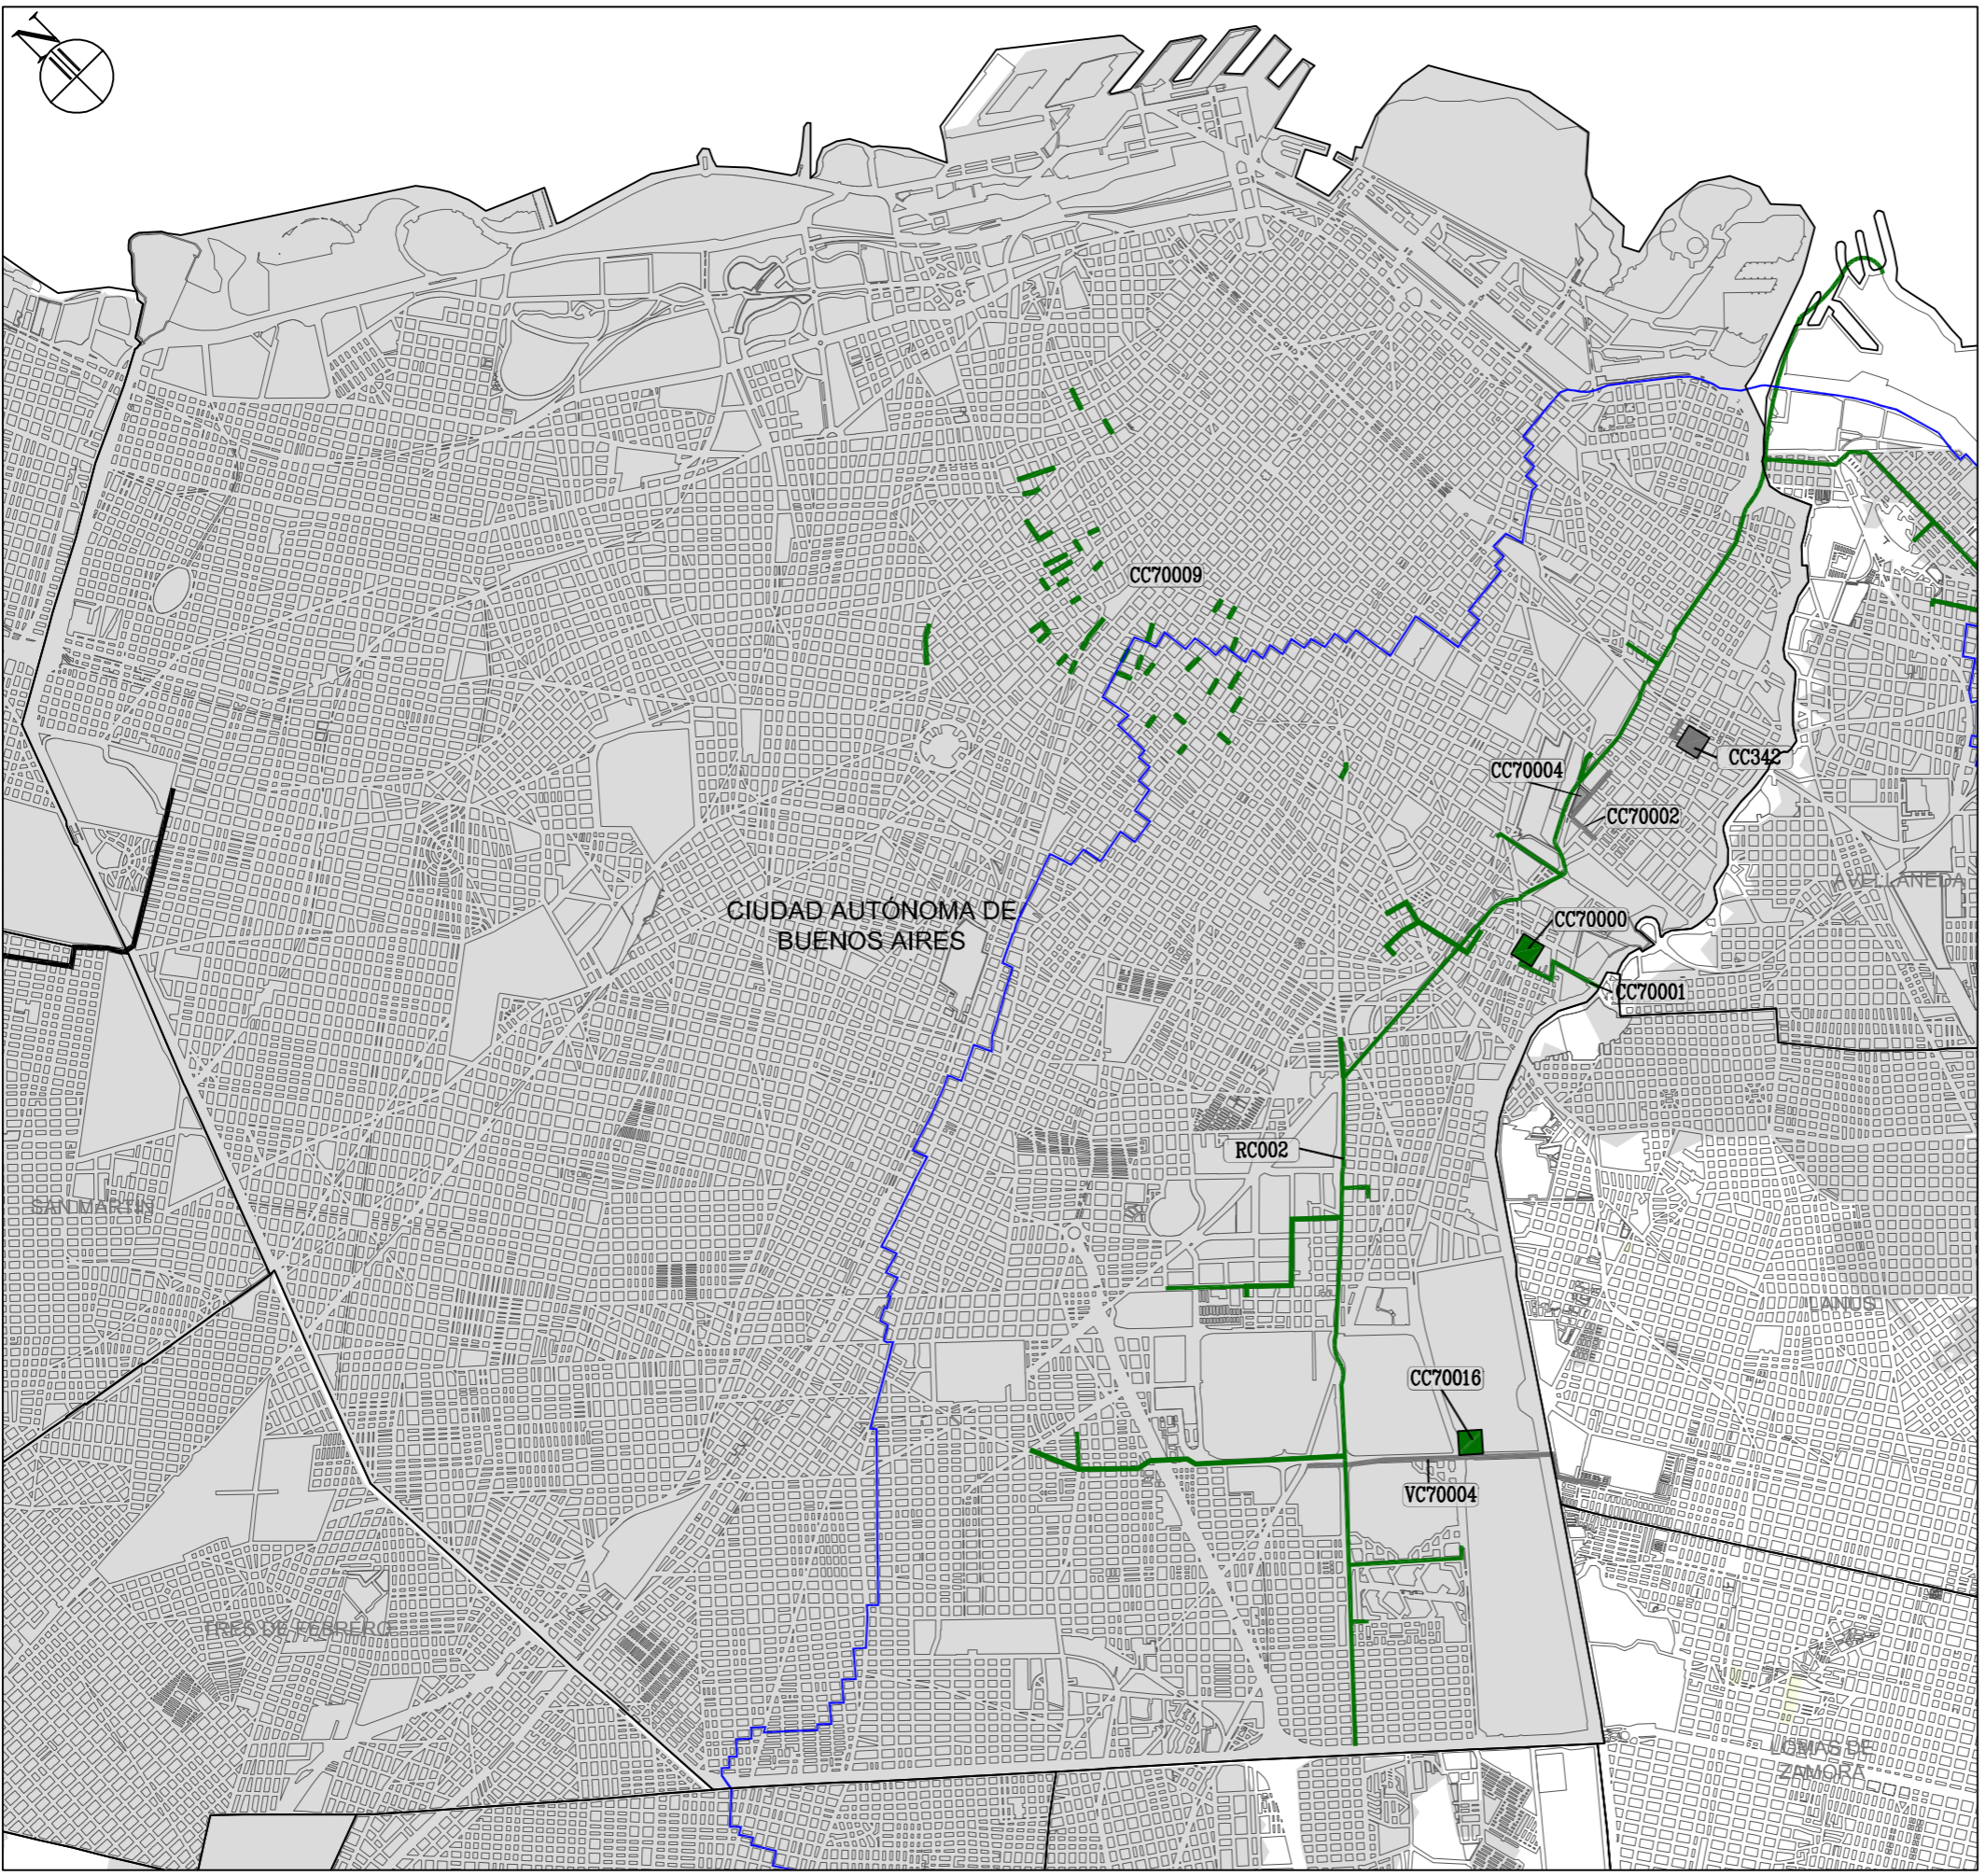



PROYECTO Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18







C.A.B.A.
CLOACA

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL	
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
BARRACAS	EXPANSIÓN	CC70002	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL VILLA 21 - 24	AYSA	C+T	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA	1.357.202	120	100%	nov-13	mar-14	may-14	
BARRACAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CC342	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED COLECTORA - IMPULSION - EBC A INTERMEDIA 1-2	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	2.153.800	120	100%	ago-09	oct-09	jul-15	
BARRACAS	EXPANSIÓN	CC70004	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA VILLA 21-24 TIERRA AMARILLA - MANZANA 8	AYSA	C+T	1.790	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA	4.283.538	240	100%	ene-15	feb-15	oct-15	
VARIOS	EXPANSIÓN	VC70004	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REDES PRIMARIAS CLOACALES VILLA OLÍMPICA	AYSA	AYSA	23.500	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	UCSA S.A.	58.958.613	420	100%	nov-16	nov-16	mar-18	
TOTAL												66.753.153						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
CONSTITUCIÓN DOCK SUD	EXPANSIÓN	RC002	C-1-1.1-OB-000-3.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	SISTEMA RIACHUELO - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA Y DESVIO COLECTOR BAJA COSTANERA	BIRF	AYSA	4.300.000	EN EJECUCIÓN		CONSORCIO CMT GHELLA SPA SUCURSAL ARGENTINA GHELLA SOGENE CA SUCURSAL ARGENTINA UNIÓN TRANSITORIA	11.138.080.192	2.171	38%	abr-14	ene-15		
BARRACAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CC70000	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA COLA - FEMSA	AYSA	AYSA	14.452	EN EJECUCIÓN		AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L.	20.564.266	200	95%	abr-15	may-15		
C.A.B.A.	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CC70009	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CONDUCTOS EN C.A.B.A.	AYSA	AYSA	-	EN EJECUCIÓN		PRFV LINIERS S.A.	130.427.059	720	99%	jun-15	oct-15		
BARRACAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CC70001	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	IMPULSIÓN CLOACAL COCA COLA - FEMSA	AYSA	AYSA	14.452	EN EJECUCIÓN		AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L.	11.386.665	366	75%	abr-15	feb-16		
VILLA SOLDATI	EXPANSIÓN	CC70016	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA OLÍMPICA	AYSA	AYSA	23.500	EN EJECUCIÓN		UCSA S.A.	90.135.170	463	99%	nov-16	ene-17		
TOTAL												11.390.593.352						




PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

DESAGÜES CLOCALES







REFERENCIAS

-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR


DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR
-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
 CÓDIGO ARCHIVO: DG EE Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
 DESAGÜES CLOCALES

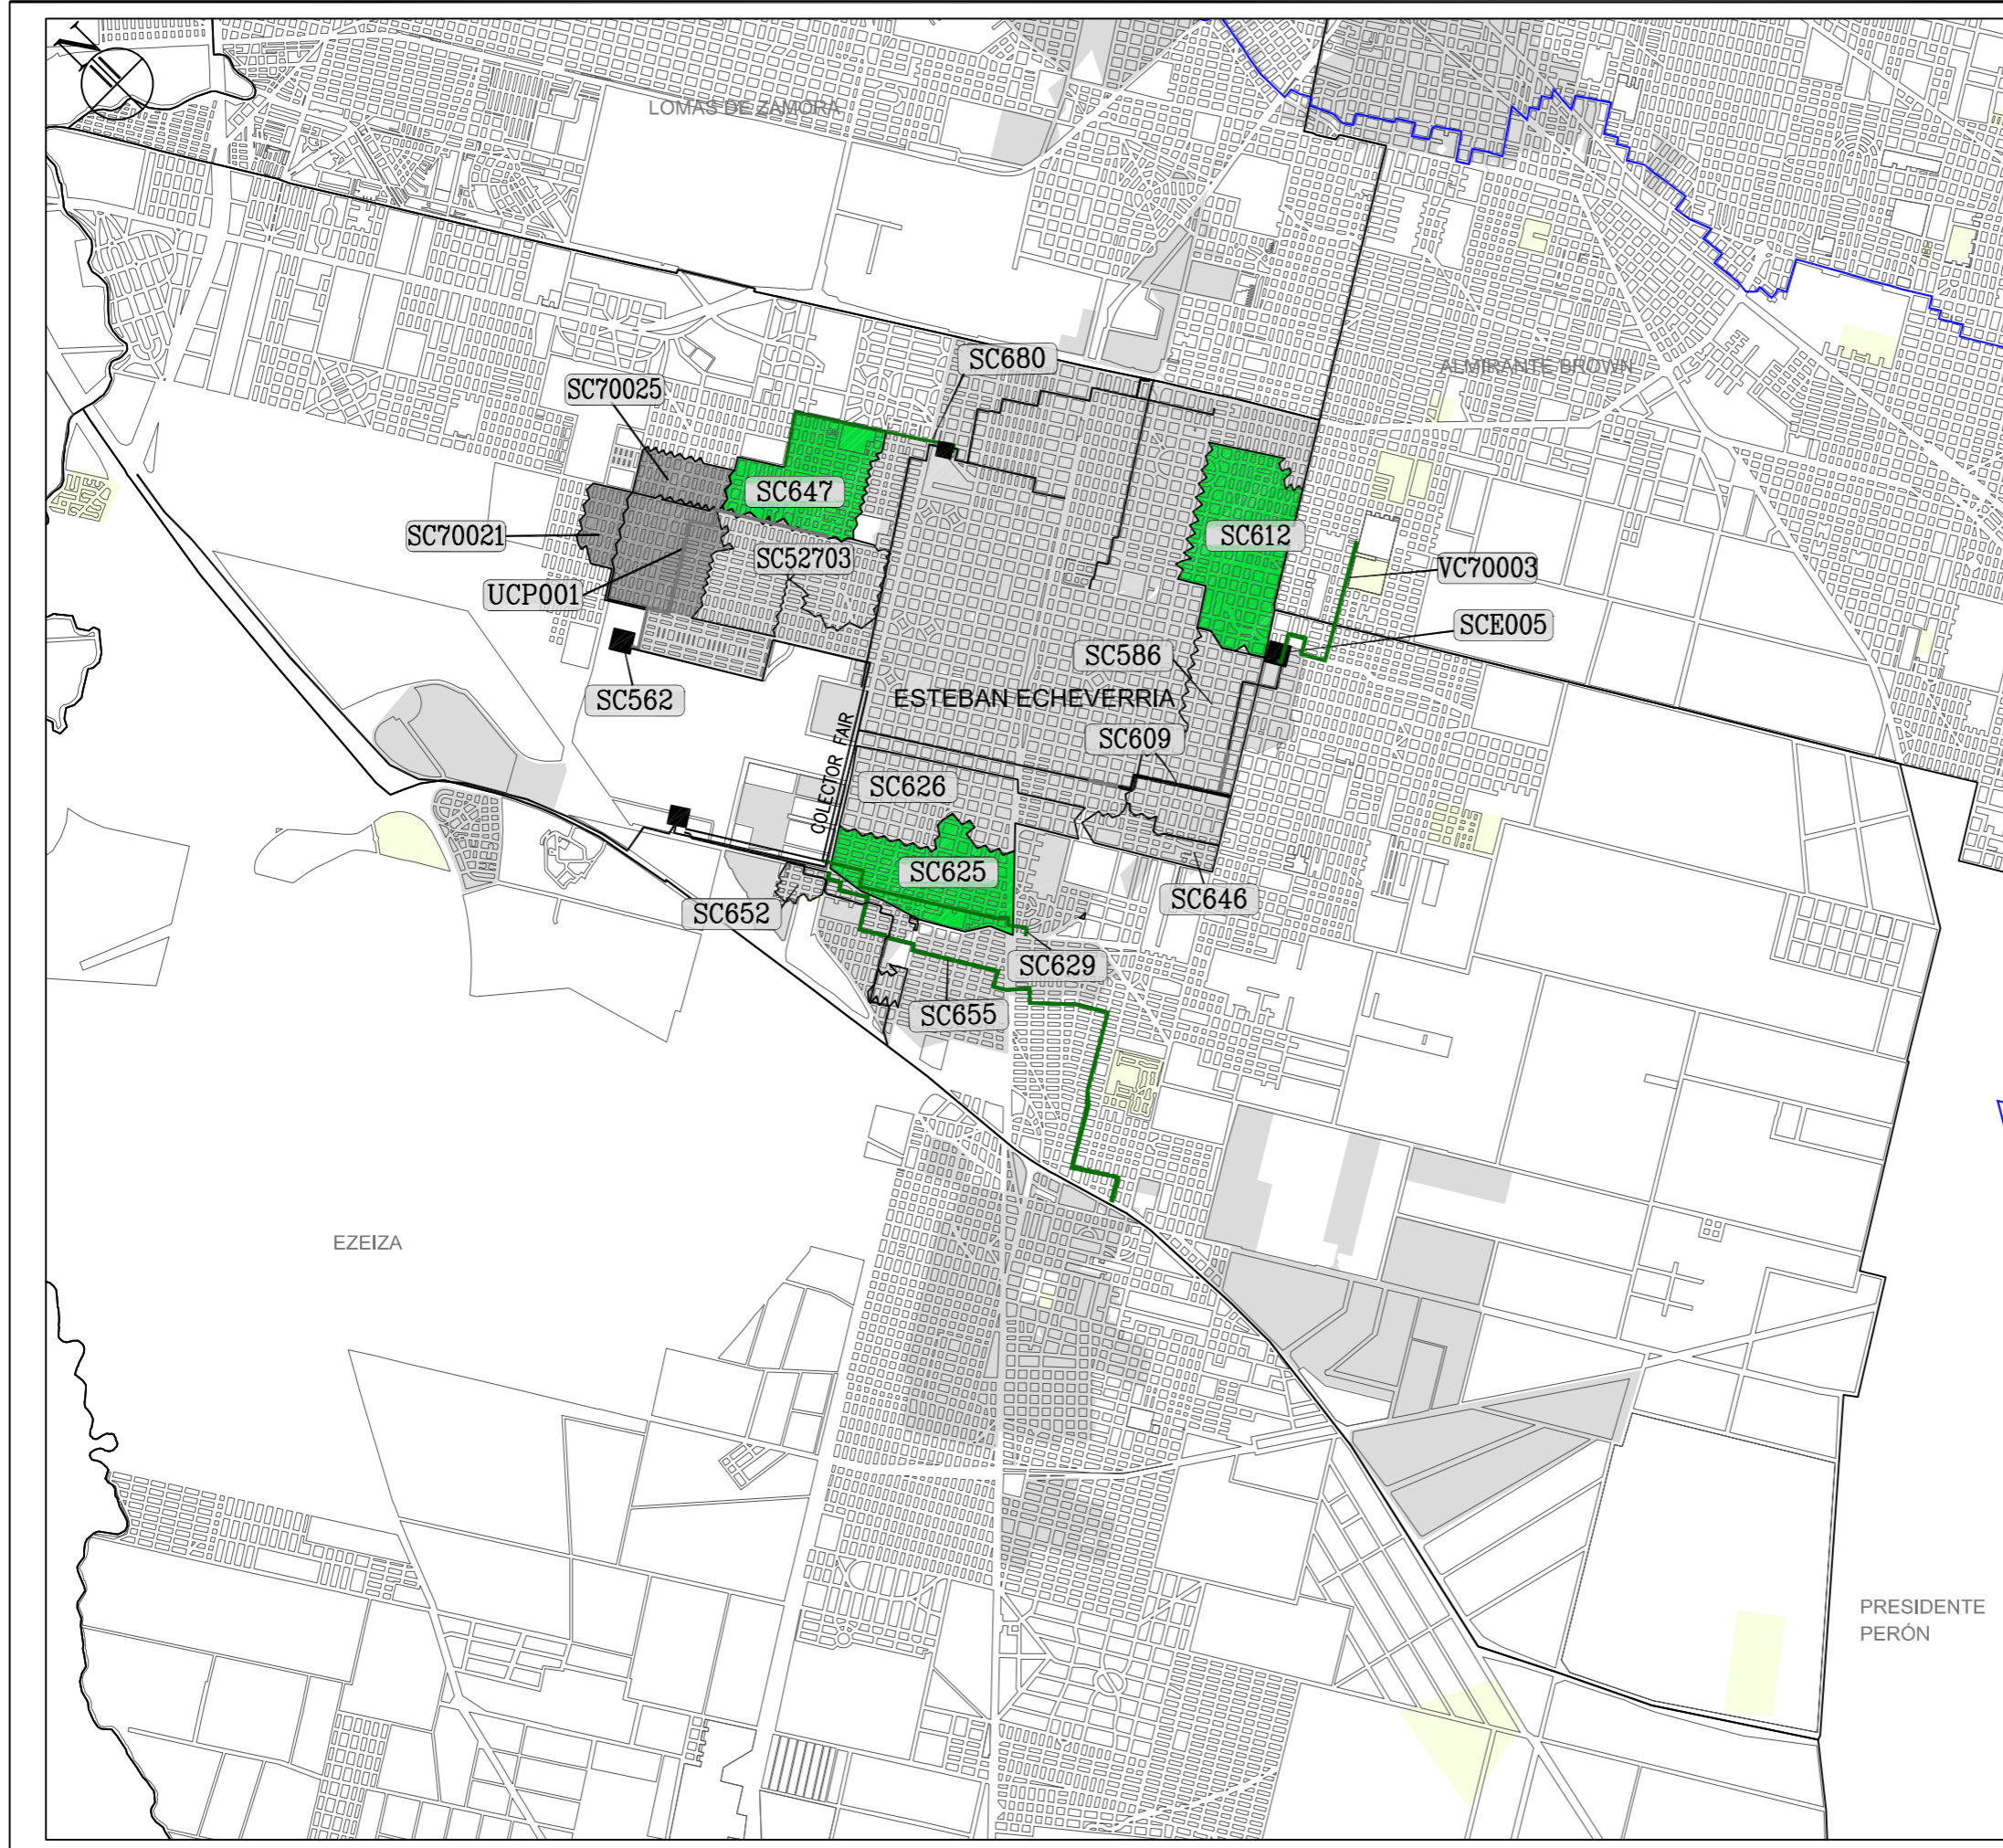



PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18







E. ECHEVERRÍA CLOACA

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL	
RADIO SERVIDO																		
MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC609	C-3-3.3-RP-EE-1.6	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR ALTOS 2 - 2DA ETAPA	AYSA	AYSA	58.666	FINALIZADA	EN SERVICIO	CETACO S.A.	14.011.594	180	100%	jul-13	sep-13	jul-14	
MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SCE005	C-3-3.3-RP-EE-1.6	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO ALTOS 2	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	LIHUÉ INGENIERÍA S.A.	11.245.927	360	100%	ene-13	feb-13	dic-14	
MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC52703	C-3-3.3-RS-EE-1.6.7	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MALVINAS ETAPA 2 - CUENCA B	AYSA	AYSA	13.037	FINALIZADA	EN SERVICIO	MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. - DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - U.T.E.	42.922.502	360	100%	abr-13	jun-13	mar-15	
MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC586	C-3-3.3-RS-EE-1.6.14	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ALTOS 2 - 2ª ETAPA	AYSA	AYSA	6.978	FINALIZADA	EN SERVICIO	MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. - MAKO S.A. - DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - U.T.E.	37.569.290	300	100%	may-13	jun-13	ene-15	
MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC646	C-3-3.3-RS-EE-1.6.15	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ALTOS 3	AYSA	AYSA	2.800	FINALIZADA	EN SERVICIO	IACSA S.A.	18.804.949	240	100%	mar-14	abr-14	abr-15	
EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SC652	C-3-3.3-RS-EE-1.6.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 6 - ETAPA 1	AYSA	AYSA	1.148	FINALIZADA	EN SERVICIO	PRATES Y CIA. S.C.A.	10.337.785	180	100%	oct-14	nov-14	jul-15	
9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	SC562	C-3-3.3-RP-000-1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACION DE BOMBEO CLOACAL CONSTANZO	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	XAPOR S.A.	12.311.103	360	100%	ago-13	oct-13	may-15	
MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC626	C-3-3.3-RS-EE-1.6.8	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 1	AYSA	AYSA	12.300	FINALIZADA	EN SERVICIO	ILUBAIRES S.A.	105.749.039	507	100%	abr-15	may-15	oct-16	
TOTAL												252.952.189						
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	UCP001	C-3-3.3-RS-EE-1.6.7	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	COLECTOR CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS	AYSA	AYSA	18.070	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	GADES S.A.	27.336.328	360	100%	feb-13	may-13	sep-14	
9 DE ABRIL MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC70021	C-3-3.3-RS-EE-3.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - 2ª ETAPA - FASE A	AYSA	AYSA	3.415	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MOR S.A.	21.653.850	270	100%	ene-17	feb-17	dic-17	
9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	SC70025	C-3-3.3-RS-EE-3.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - 1ª ETAPA - FASE A	AYSA	AYSA	2.840	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CIVILCON S.A.	27.231.958	300	100%	ene-17	feb-17	ene-18	
TOTAL												76.222.136						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
LUIS GUILLÓN MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC612	C-3-3.3-RS-EE-1.6.19	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL GUILLÓN 2 - ETAPA 2	AYSA	AYSA	10.189	EN EJECUCIÓN		GADES S.A.	179.738.572	690	82%	feb-17	mar-17		
EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SC629	C-3-3.3-RS-EE-1.6.8	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MONTE GRANDE 3	AYSA	AYSA	40.327	EN EJECUCIÓN		TECMA S.A.	43.812.667	330	11%	sep-17	ene-18		
LUIS GUILLÓN MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SC647	C-3-3.3-RS-EE-1.6.22	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2	AYSA	AYSA	8.500	EN EJECUCIÓN		ILUBAIRES S.A.	61.298.769	360	54%	jun-17	ago-17		
EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SC655	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS EZEIZA TRAMO ESTEBAN ECHEVERRÍA	AYSA	AYSA	251.000	EN EJECUCIÓN		COARCO S.A.	313.135.541	960	35%	ene-17	jun-17		
VILLA DE MAYO 9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	SC680	C-3-3.3-RP-000-3.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR VILLA DE MAYO 2	AYSA	AYSA	8.500	EN EJECUCIÓN		GADES S.A.	25.513.154	270	60%	mar-17	jun-17		
VARIOS	EXPANSIÓN	VC70003	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BARRIO LINDO	PFV	AYSA	9.322	EN EJECUCIÓN		INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L.	21.383.441	270	0%	dic-17	mar-18		
EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SC625	C-3-3.3-RS-EE-1.6.3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3	AYSA	AYSA	12.800	CONTRATADA		BAUER S.A.	59.810.886	390	0%	ene-18			
TOTAL												704.693.029						




PARTIDO DE EZEIZA

DESAGÜES CLOCALES




REFERENCIAS




-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR


-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE EZEIZA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
 CÓDIGO ARCHIVO: DG EZE Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA

DESAGÜES CLOCALES

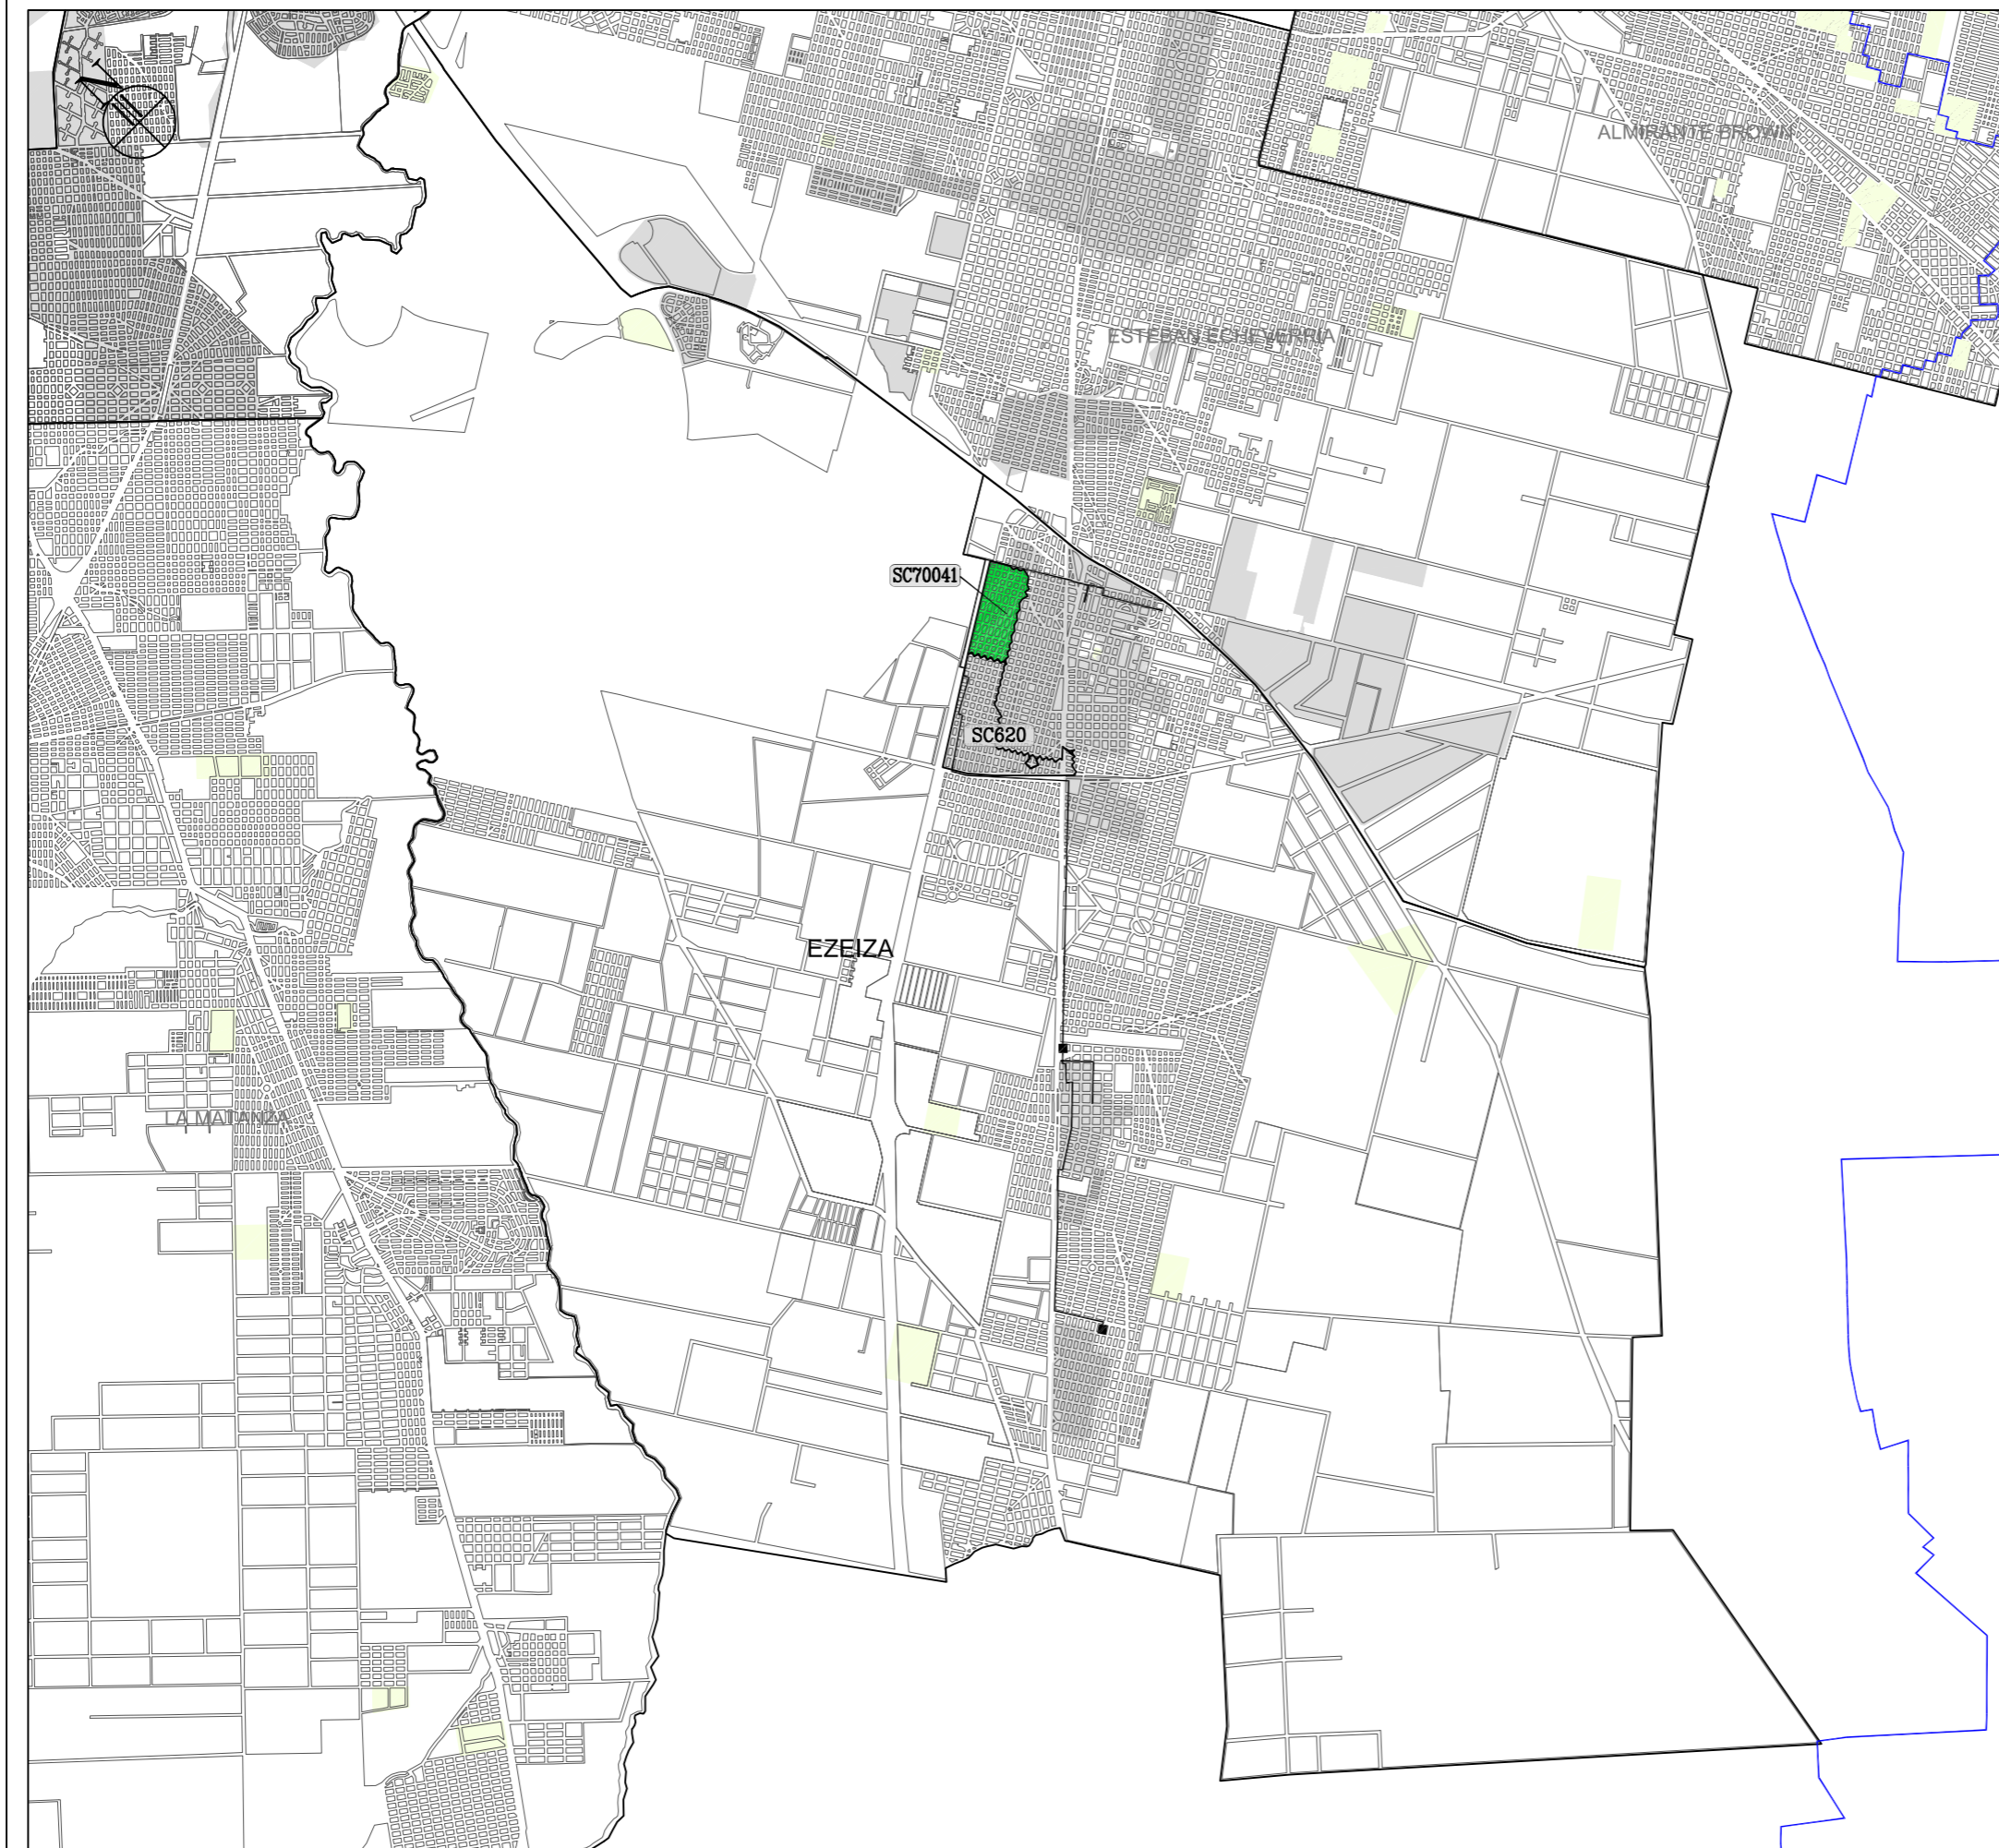




PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18

EZEIZA
CLOACA

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL		
RADIO SERVIDO																			
EZEIZA	EXPANSIÓN	SC620	C-3-3.2-RS-EZ-1.1.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE	AYSA	AYSA	13.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	TECMA S.A.	48.617.227	270	100%	nov-13	nov-13	nov-14		
												TOTAL	48.617.227						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																			
EZEIZA	EXPANSIÓN	SC70041	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE RESTO 1	AYSA	AYSA	7.936	EN EJECUCIÓN		ERNESTO TARNOUSKY S.A. - OSHI S.A. UNIÓN TRANSITORIA	76.672.366	390	0%	ago-17	ago-17			
												TOTAL	76.672.366						

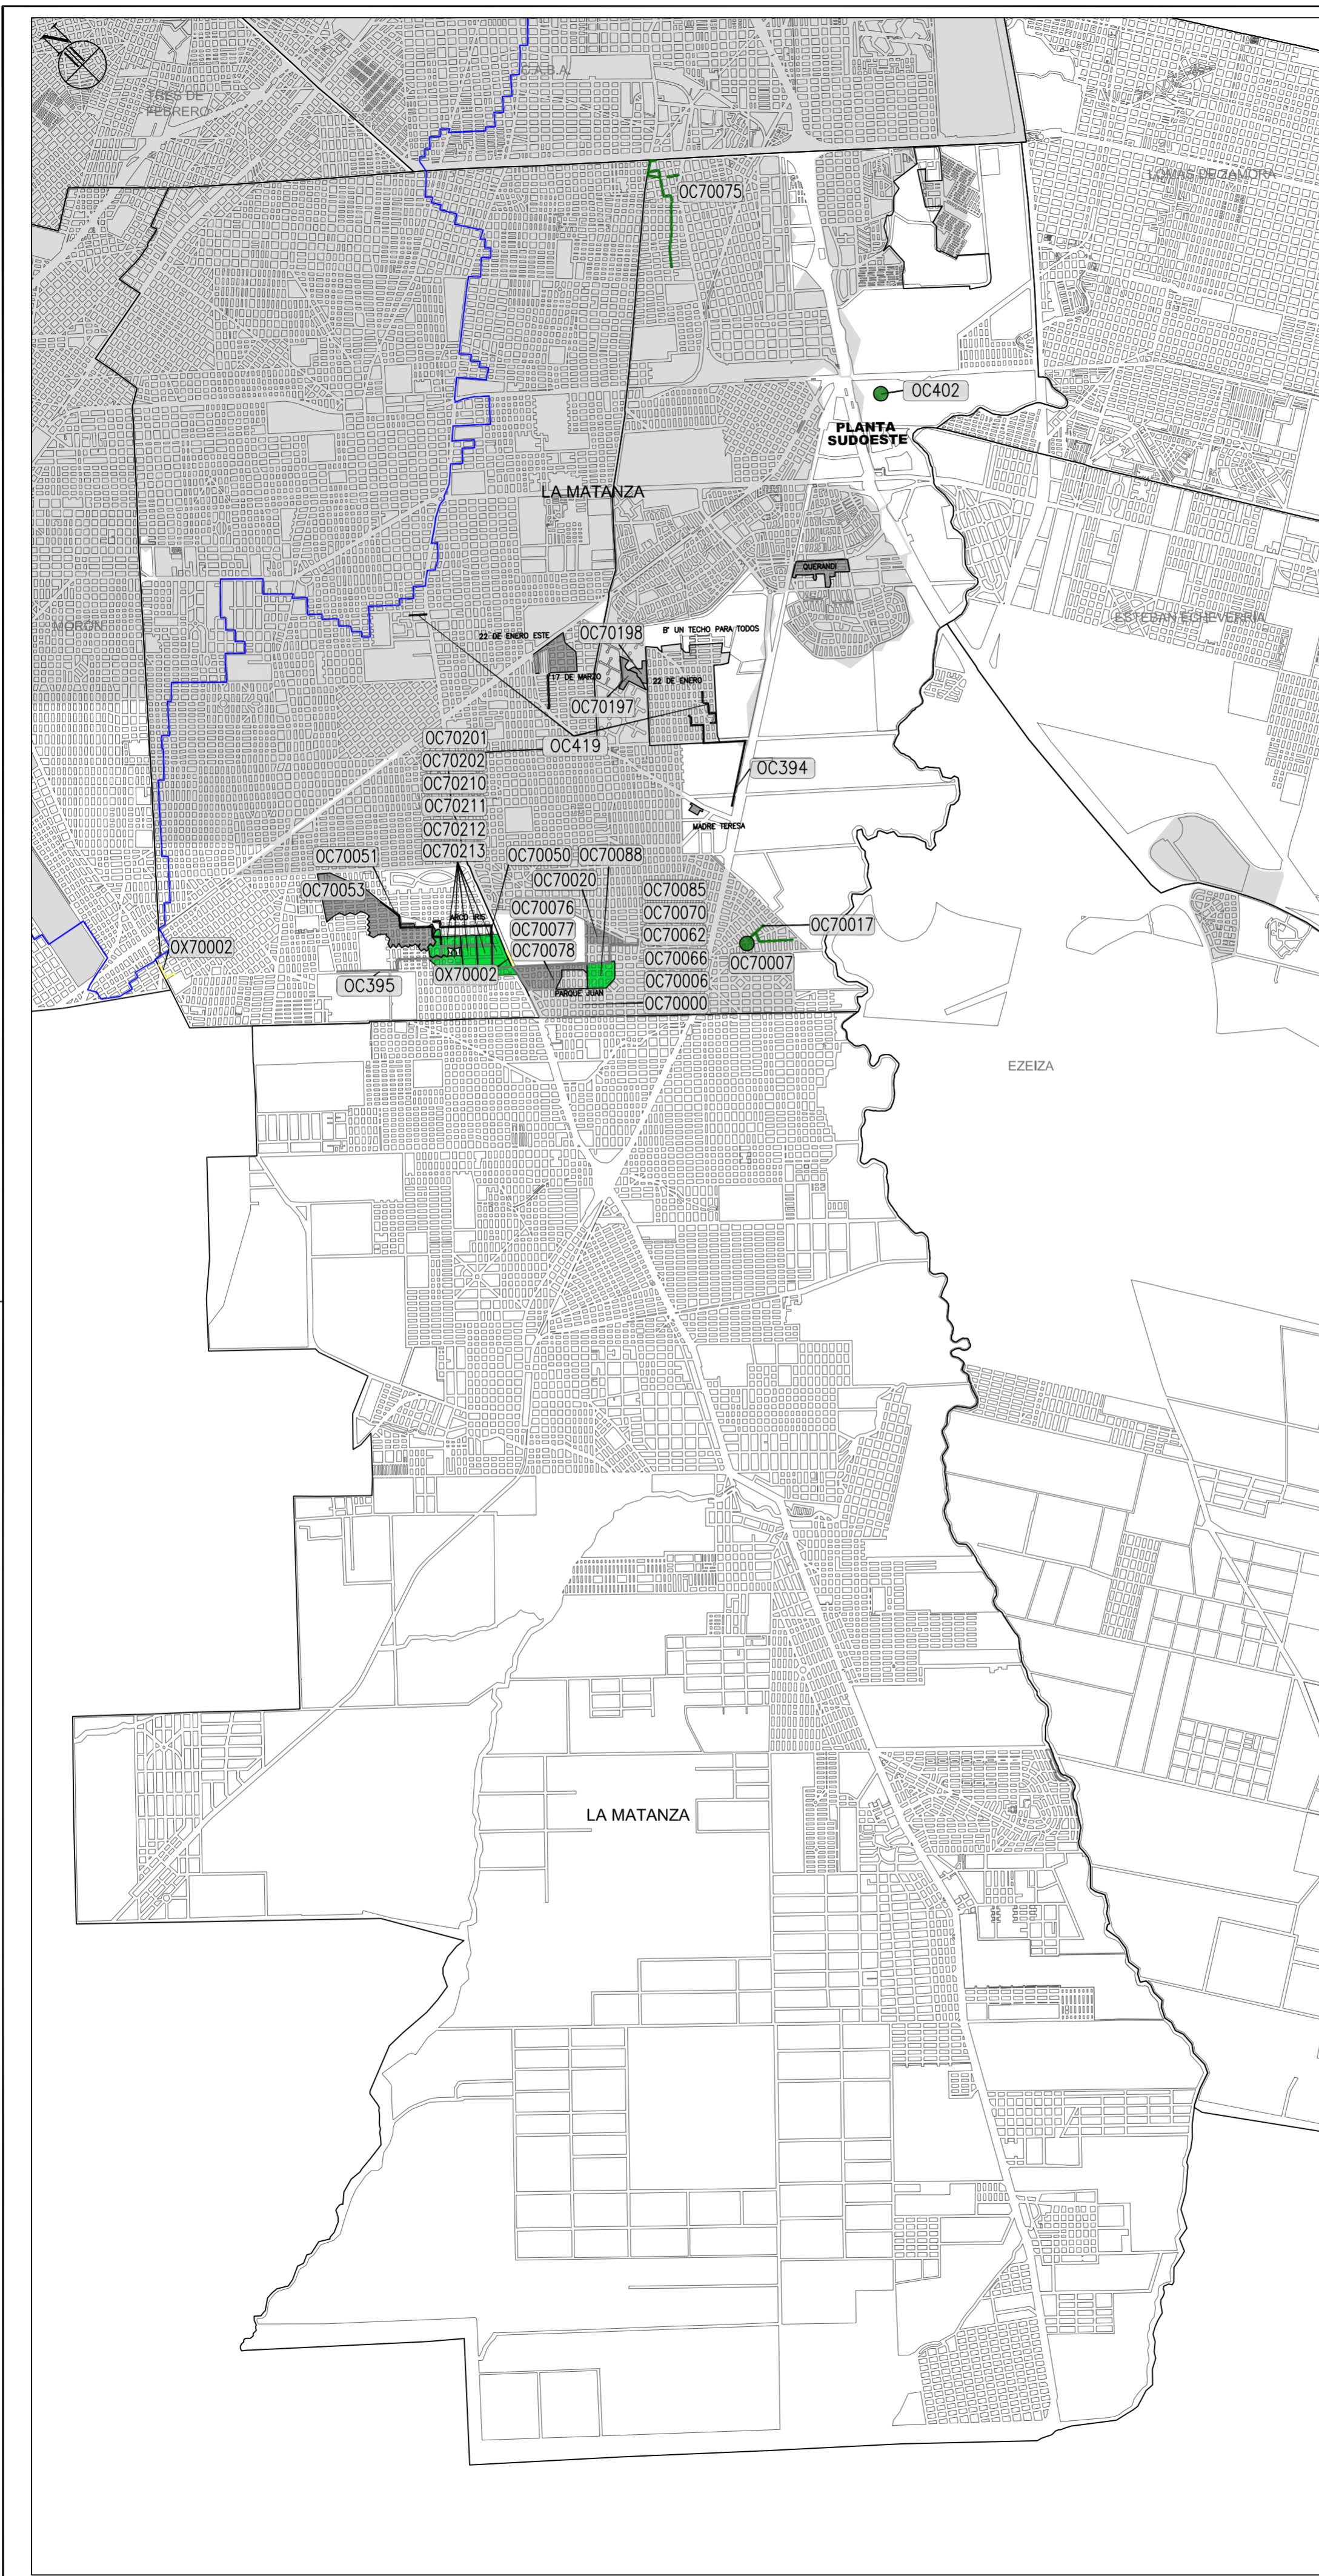

PARTIDO DE LA MATANZA
DESAGÜES CLOCALES

- REFERENCIAS**
- RADIO SERVIDO
 - NNOOO NÚMERO DE "P3"
 - RED EXISTENTE
 - CUENCA MATANZA RIACHUELO
 - OBRA BÁSICA
 - RED SECUNDARIA

- OBRAS:**
- FINALIZADAS SIN SERVICIO
 - CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
 - EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

- DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS**
- PROYECTO REALIZADO
 - DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
 - DB A ELABORAR

- DESVINCULADOS
- RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
- OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE LA MATANZA
 FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
 CÓDIGO ARCHIVO: DG LM Cloaca 06.18
 PROYECTOS Y OBRAS AYSA
 DESAGÜES CLOCALES









BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA)	PLAZO	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL		
RADIO SERVIDO																			
ISIDRO CASANOVA	EXPANSIÓN	OC394	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	COLECTOR B° 22 DE ENERO ESTE	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	APCO S.A.	10.115.156	210	100%	may-12	mar-13	sep-14		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70000	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PARQUE JUAN SUEDESTE M2	AYSA	C+T	1.391	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA UNIÓN Y FUERZA LTDA	2.863.279	240	100%	abr-13	may-13	mar-14		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70006	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 2 SUEDESTE M3	AYSA	C+T	1.044	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA COMUNIDAD EN ACCIÓN LTDA	2.422.285	240	100%	jun-13	ago-13	ago-15		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70050	C-4-4.1-RP-000-2.2.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BARRIO ARCO IRIS NORTE	AYSA	AYSA	10.390	FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	10.054.463	240	100%	oct-16	nov-16	jul-17		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70051	C-4-4.1-RP-000-2.2.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO ARCO IRIS SUR	AYSA	AYSA	27.331	FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	10.509.999	275	100%	oct-16	nov-16	sep-17		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70066	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 2 SUEDESTE M4	AYSA	C+T	855	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA 7 DE MAYO LTDA	2.917.362	210	100%	nov-15	ene-16	jun-16		
LAFERRERE VILLA CELINA	EXPANSIÓN	OC70070	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 2 SE M5	AYSA	C+T	1.080	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA VIVERO LDA	4.608.025	300	100%	abr-16	jun-16	nov-17		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70062	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 2 SUEDESTE M6	AYSA	C+T	630	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA	2.835.362	240	100%	ago-15	oct-15	may-16		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70085	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 2SE M11	AYSA	C+T	1.155	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA 7 DE MAYO LTDA	6.895.268	360	100%	jul-16	jul-16	feb-17		
SAN JUSTO CIUDAD EVITA	EXPANSIÓN	OC419	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 22 DE ENERO ESTE (PARA MÓDULOS 1, 2, 3 Y 4)	AYSA	C+T	637	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA.	706.551	150	100%	ago-12	sep-12	jun-15		
TOTAL												53.927.750							
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																			
LAFERRERE RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OC395	C-4-4.1-RP-000-2.2.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	COLECTOR CLOACAL ESTANISLAO DEL CAMPO TRAMO 1 Y 2	AYSA	AYSA	114.907	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A. - CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. - U.T.E.	510.134.267	660	100%	jun-15	jul-15	oct-17		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70020	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 2 SUEDESTE M1	AYSA	C+T	1.472	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LASALLE II LTDA	11.684.776	240	100%	may-14	jun-14	abr-15		
RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OC70053	C-4-4.1-RS-LM-2.2.1.3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NORTE	AYSA	AYSA	11.200	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ALESTE S.A.	57.866.573	390	100%	dic-16	feb-17	mar-18		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70076	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 2 SUEDESTE M12	AYSA	C+T	940	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA UNIÓN Y FUERZA LTDA	2.835.362	330	100%	abr-16	jun-16	abr-17		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70077	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 2 SE M9	AYSA	C+T	620	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LASALLE II LTDA	3.658.390	300	100%	may-16	jul-16	mar-17		
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70078	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 2 SUEDESTE M10	AYSA	C+T	1.094	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA	5.020.360	450	100%	may-16	jun-16	ago-17		
CIUDAD EVITA	EXPANSIÓN	OC70197	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 21 DE MARZO M1	AYSA	C+T	935	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LA UNIÓN POPULAR LTDA	4.566.125	360	100%	abr-17	may-17	feb-18		
CIUDAD EVITA	EXPANSIÓN	OC70198	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 21 DE MARZO M2	AYSA	C+T	910	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LASALLE II LTDA	4.041.524	360	100%	abr-17	may-17	feb-18		
TOTAL												599.807.380							
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																			
ALDO BONZI	EXPANSIÓN	OC402	C-4-4.1-OB-000-1.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA DEPURADORA SUDOESTE - TRATAMIENTO DE BARROS	BIRF	AYSA	946.667	EN EJECUCIÓN		COARCO S.A. - ELEPRINT S.A. - MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A. - U.T.E.	1.609.702.049	1.341	36%	sep-14	may-15			
LAFERRERE	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OC70007	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LAFERRERE CENTRO	AYSA	AYSA	17.850	EN EJECUCIÓN		CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. - GTMH ARGENTINA S.A.	36.462.858	507	97%	ene-17	mar-17			
LAFERRERE	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OC70017	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	READECUACIÓN COLECTOR E IMPULSIÓN DE ESTACIÓN LAFERRERE CENTRO	AYSA	AYSA	29.600	EN EJECUCIÓN		CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. - GTMH ARGENTINA S.A.	29.927.327	440	84%	ene-17	may-17			
LA TABLADA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OC70075	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR DEAN FUNES	AYSA	AYSA	22.326	EN EJECUCIÓN		ALESTE S.A.	26.509.627	390	60%	dic-16	feb-17			
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70088	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 2 SUEDESTE M13	AYSA	C+T	879	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA EN ACCIÓN LTDA	3.882.129	360	97%	nov-16	ene-17			
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70201	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M1	AYSA	C+T	1.375	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA UNIÓN Y FUERZA LTDA	5.029.904	300	93%	jul-17	ago-17			
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70202	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M2	AYSA	C+T	1.270	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA VIVERO LTDA	5.452.439	300	45%	ago-17	nov-17			
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70210	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M4	AYSA	C+T	850	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA	5.766.173	300	68%	sep-17	nov-17			
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70211	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M6	AYSA	C+T	885	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA	6.037.687	360	46%	sep-17	nov-17			
LAFERRERE	EXPANSIÓN	OC70212	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M5	AYSA	C+T	1.170	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA PRIMAVERA LTDA	8.672.600	450	18%	nov-17	ene-18			
LAFERRERE ISIDRO CASANOVA	EXPANSIÓN	OC70213	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M3	AYSA	C+T	935	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA	6.015.451	360	8%	oct-17	ene-18			
TOTAL												1.743.458.244							
OBRAS EN LICITACIÓN / PRÓXIMAS A LICITAR																			
RAFAEL CASTILLO LAFERRERE	EXPANSIÓN	OX70002	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REDES SECUNDARIAS A HOSPITALES LAFERRERE Y RAFAEL CASTILLO	AYSA	AYSA		EN LICITACIÓN	PARA APERTURA DE SOBRES 12-07-2018		4.564.151	180						
TOTAL												4.564.151							




PARTIDO DE LANÚS

DESAGÜES CLOCALES







REFERENCIAS


-  RADIO SERVIDO
-  **NN000** NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR
-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

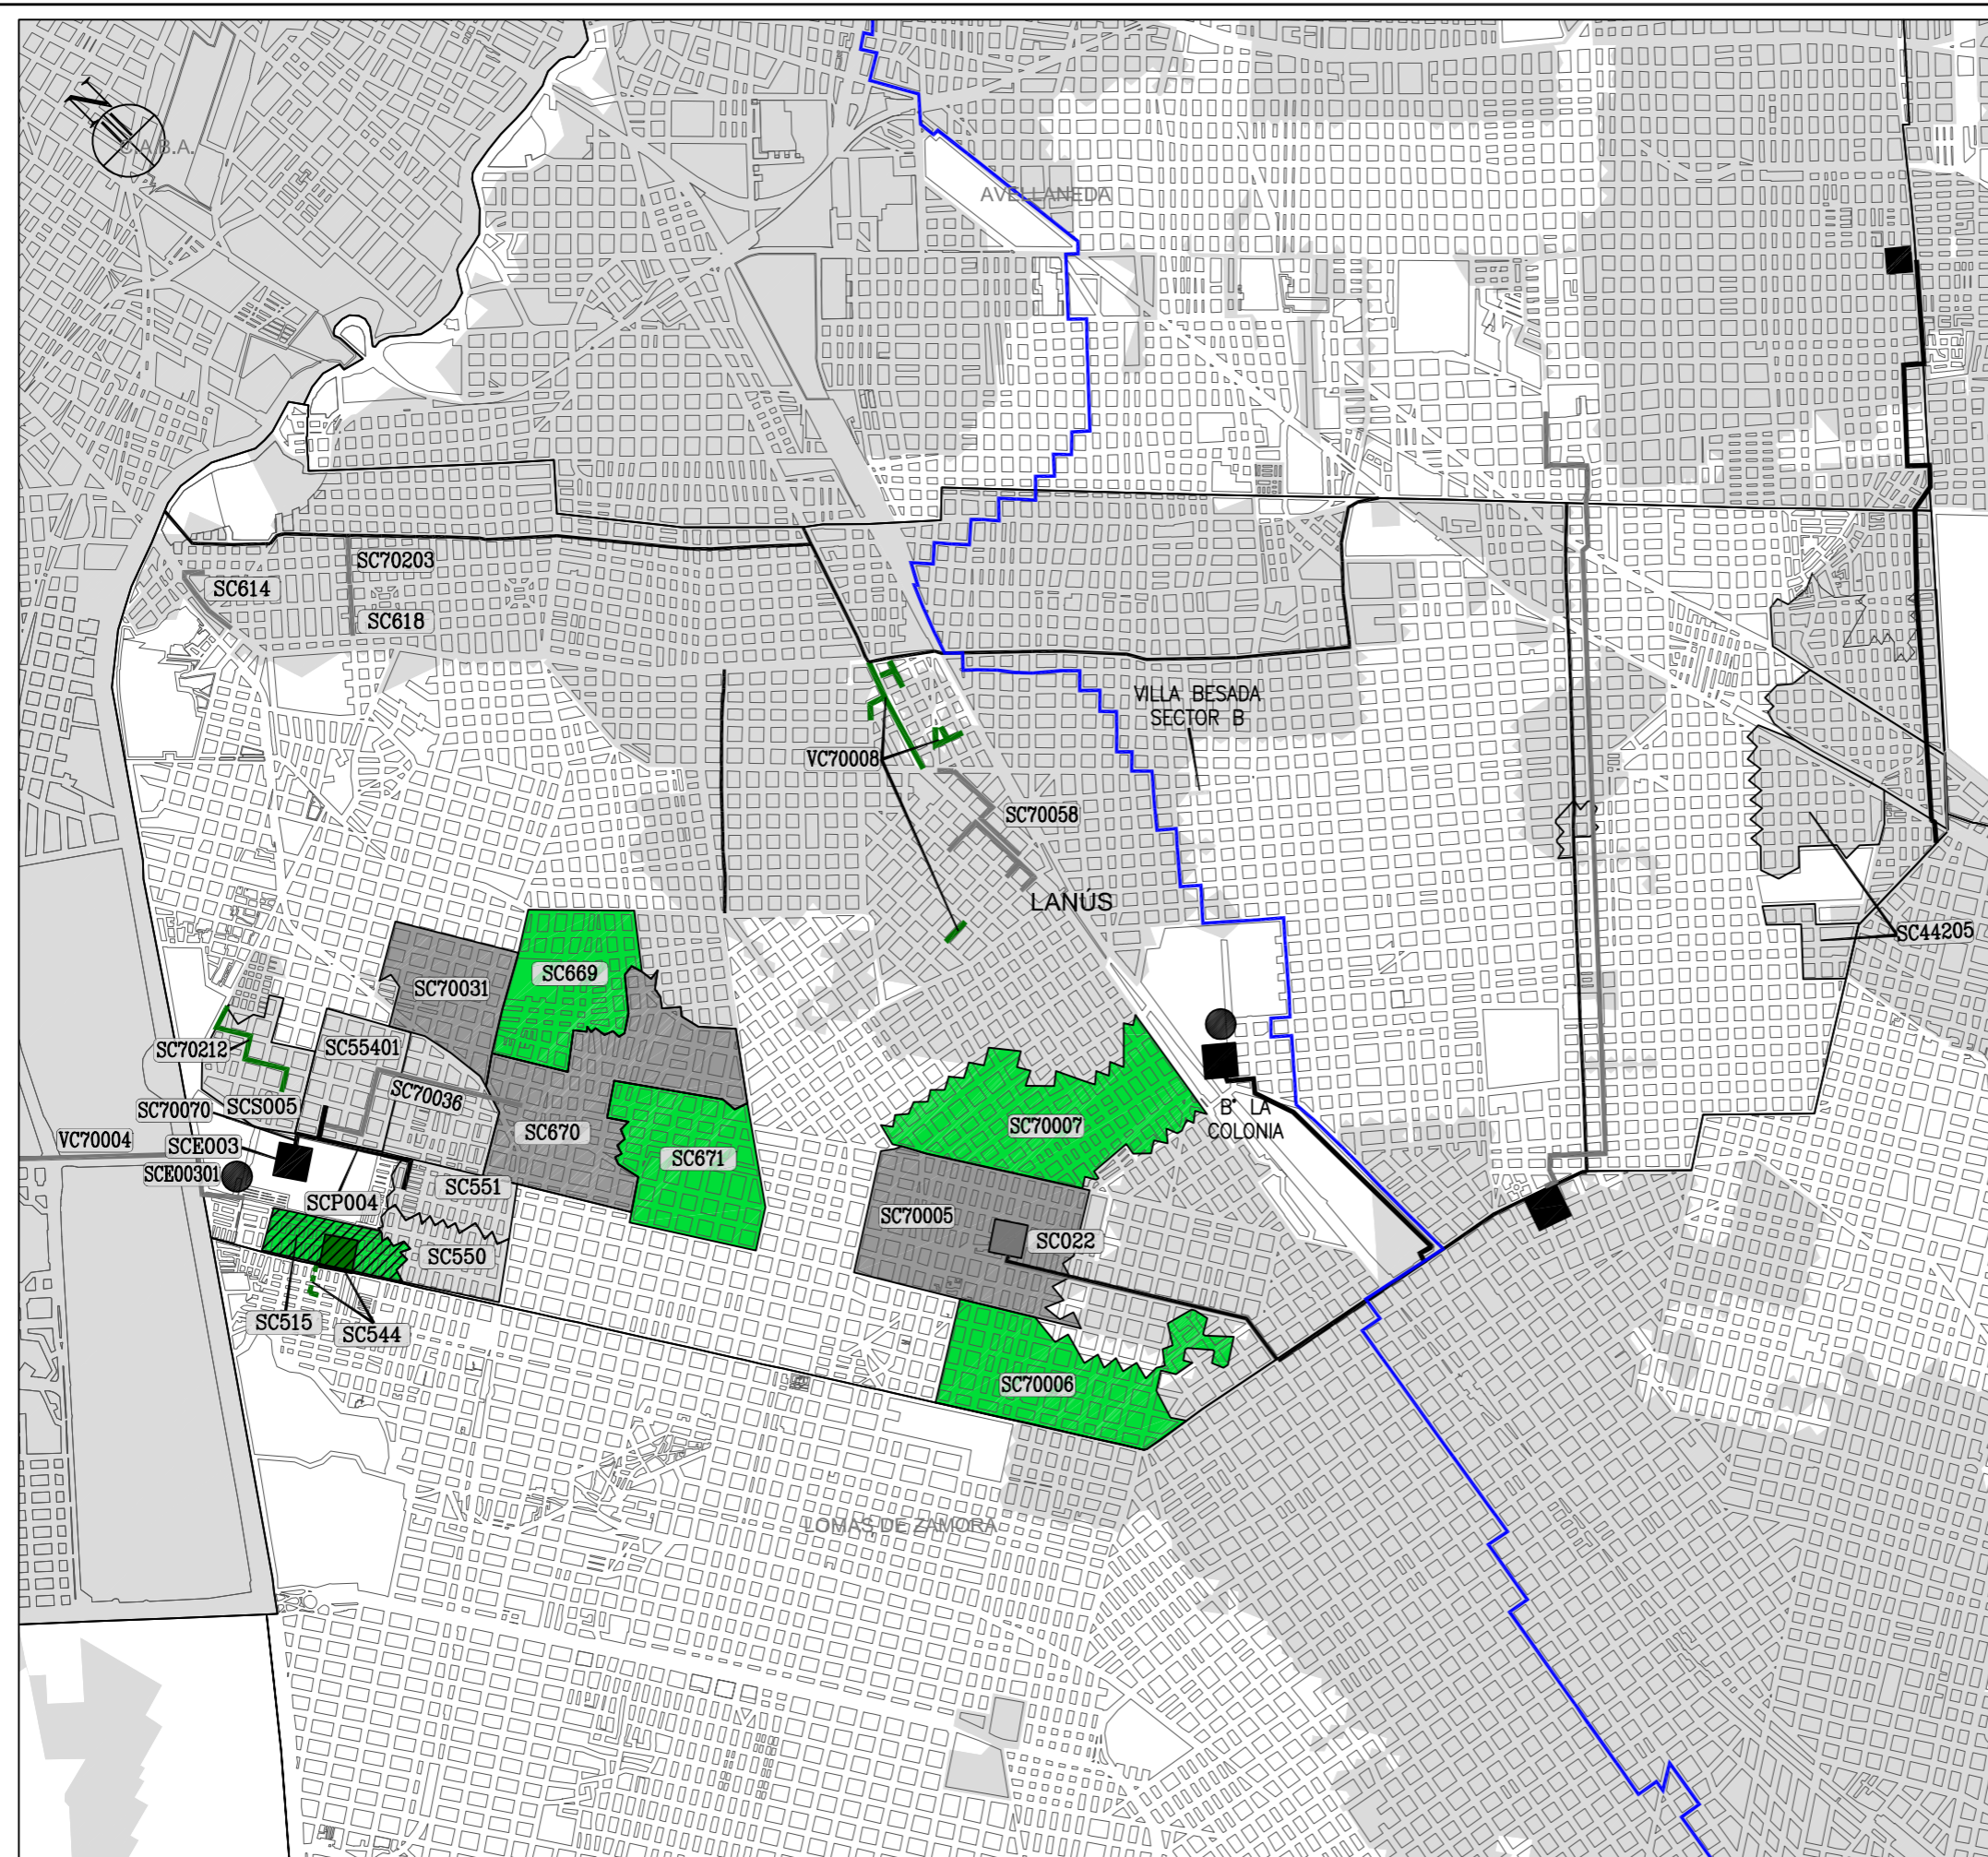

PARTIDO DE LANÚS

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018

CÓDIGO ARCHIVO: DG LAN Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA

DESAGÜES CLOCALES



BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL
--------------------	------------------------	----	-------------------------	-------------------------	-------------------	----------	---------	------------	--------	------------	-------------	------------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------	----------

RADIO SERVIDO

LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SCE003	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LANÚS	ACUMAR	AYSA	60.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M. - COARCO S.A. - U.T.E.	425.131.020	1.771	100%	dic-11	ene-12	oct-16	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SCE00301	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LANÚS (AMPLIACIÓN DE PLANTA POR ADDENDA)	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M. - COARCO S.A. - U.T.E.	98.965.510	731	100%	dic-14	nov-14	oct-16	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC70070	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	VINCULACIÓN COLECTOR TRONCAL ACUBA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M. - COARCO S.A. - U.T.E.	45.743.821	230	100%	dic-15	ene-16	dic-16	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SCP004	C-1-1.3-RP-000-3.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	COLECTORES ACUBA	AYSA	AYSA	21.198	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	6.403.139	210	100%	may-11	jun-11	dic-16	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC55401	C-1-1.3-RS-LA-3.1.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DEL VALLE - SUBCUENCA ACUBA	AYSA	AYSA	4.624	FINALIZADA	EN SERVICIO	APCO S.A.	12.751.820	270	100%	abr-11	jun-11	jun-17	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SCS005	C-1-1.3-RS-LA-3.1.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DIAMANTE OESTE	AYSA	AYSA	2.668	FINALIZADA	EN SERVICIO	CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L.	36.090.716	200	100%	jul-14	oct-14	dic-15	
MONTE CHINGOLO	EXPANSIÓN	SC44205	C-1-1.2-RS-LA-3.5.1.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA D1 Y CUENCA D2	AYSA	AYSA	5.928	FINALIZADA	EN SERVICIO	EDISUD S.A.	32.069.114	240	100%	oct-13	nov-13	mar-15	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC551	C-1-1.3-RP-000-3.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 2 - SUBCUENCA ACUBA	AYSA	AYSA	4.274	FINALIZADA	EN SERVICIO	CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L.	40.376.359	300	100%	jul-14	oct-14	feb-16	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC550	C-1-1.3-RS-LA-3.1.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1 - SUBCUENCA ACUBA	AYSA	AYSA	4.235	FINALIZADA	EN SERVICIO	CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L.	46.746.052	333	100%	jul-14	oct-14	sep-16	
TOTAL												744.277.551						

OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO

VALENTÍN ALSINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SC614	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED CLOACAL EL PUEBLITO	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	CHAMBEO S.A.	2.960.212	150	11%	nov-13	dic-13	-	
VALENTÍN ALSINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SC618	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN RED CLOACAL ARMENIA ENTRE TUYUTI Y REPÚBLICA ARGENTINA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CHAMBEO S.A.	4.173.241	110	100%	nov-13	dic-13	-	
REMEDIOS DE ESCALADA	EXPANSIÓN	SC70005	C-1-1.2-RS-LA-5.1.3.10.3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED CLOACAL ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 1	AYSA	AYSA	10.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MARALBA S.A. - LEYMER S.A. - PERALES AGUIAR S.A. - U.T.E.	124.422.933	597	100%	may-14	jun-14	abr-16	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC70036	C-1-1.3-RS-LA-3.1.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	COLECTOR CLOACAL VILLA DEL VALLE	AYSA	AYSA	25.034	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	136.054.141	749	100%	dic-15	abr-16	feb-18	
LANÚS	EXPANSIÓN	SC70058	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ALIVIADOR CLOACAL - AV. HIPOLITO YRIGOYEN	AYSA	AYSA	5.200	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	24.788.216	537	100%	ago-16	sep-16	mar-18	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC670	C-1-1.3-RS-LA-3.1.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL SUR	AYSA	AYSA	9.785	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	LIHUÉ INGENIERÍA S.A.	227.776.898	390	100%	abr-15	oct-15	dic-17	
REMEDIOS DE ESCALADA	EXPANSIÓN	SC022	C-1-1.2-OB-000-5.1.3.10.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BALCARCE SUR	AYSA	AYSA	32.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ILUBAIRES S.A.	26.348.780	960	100%	abr-14	jun-14	abr-17	
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC70031	C-1-1.7-RS-LA-1.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL UCRAVIA	AYSA	AYSA	3.841	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	C&E CONSTRUCCIONES S.A.	144.488.705	561	100%	jul-16	ago-16	may-18	
VALENTÍN ALSINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SC70203	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED CLOACAL ARMENIA - TERMINACIÓN	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	C & E CONSTRUCCIONES S.A.	20.445.168	427	100%	dic-16	dic-16	abr-18	
VARIOS	EXPANSIÓN	VC70004	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REDES PRIMARIAS CLOACALES VILLA OLIMPICA	AYSA	AYSA	23.500	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	UCSA S.A.	58.958.613	420	100%	nov-16	nov-16	mar-18	
TOTAL												770.416.908						







OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN

LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC515	C-1-1.3-RS-LA-4.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA B° EVA PERÓN	PROMEBA	PROMEBA	2.936	EN EJECUCIÓN		NOREP S.R.L.	-	-	81%	-			
VALENTÍN ALSINA	EXPANSIÓN	SC544	C-1-1.3-RS-LA-4.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN BARRIO EVA PERÓN	PROMEBA	PROMEBA	-	EN EJECUCIÓN		NOREP S.R.L.	-	-	81%	-			
REMEDIOS DE ESCALADA	EXPANSIÓN	SC70006	C-1-1.3-RS-LA-5.1.3.10.3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 2	AYSA	AYSA	10.000	EN EJECUCIÓN		MAKO SACIFIA y C	146.748.792	390	79%	may-16	jul-16		
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC671	C-1-1.3-RS-LA-3.1.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN ESTE	AYSA	AYSA	6.603	EN EJECUCIÓN		CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.	69.674.830	585	91%	oct-16	dic-16		
REMEDIOS DE ESCALADA	EXPANSIÓN	SC70007	C-1-1.2-RS-LA-5.1.3.10.3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 3	AYSA	AYSA	12.000	EN EJECUCIÓN		XAPOR S.A.	102.354.220	570	23%	ene-17	mar-17		
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC669	C-1-1.3-RS-LA-3.1.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE	AYSA	AYSA	5.960	EN EJECUCIÓN		PRATES Y CIA. S.A. - EBCON S.A. UTE	65.089.143	420	6%	ene-17	mar-17		
VARIOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	VC70008	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL - CLOACAS FALTANTES REGION SUDESTE	AYSA	AYSA	2.352	EN EJECUCIÓN		BERNARDI CONSTRUCCIONES S.R.L.	15.906.855	300	0%	nov-17	may-18		
LANÚS OESTE	EXPANSIÓN	SC70212	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	COLECTOR VILLA JARDIN ETAPA 2	PFV	AYSA	3.000	CONTRATADA		INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L.	11.297.142	210	0%	jun-18			
TOTAL												411.070.982						




PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA

DESAGÜES CLOCALES




REFERENCIAS




-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA


OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR

-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

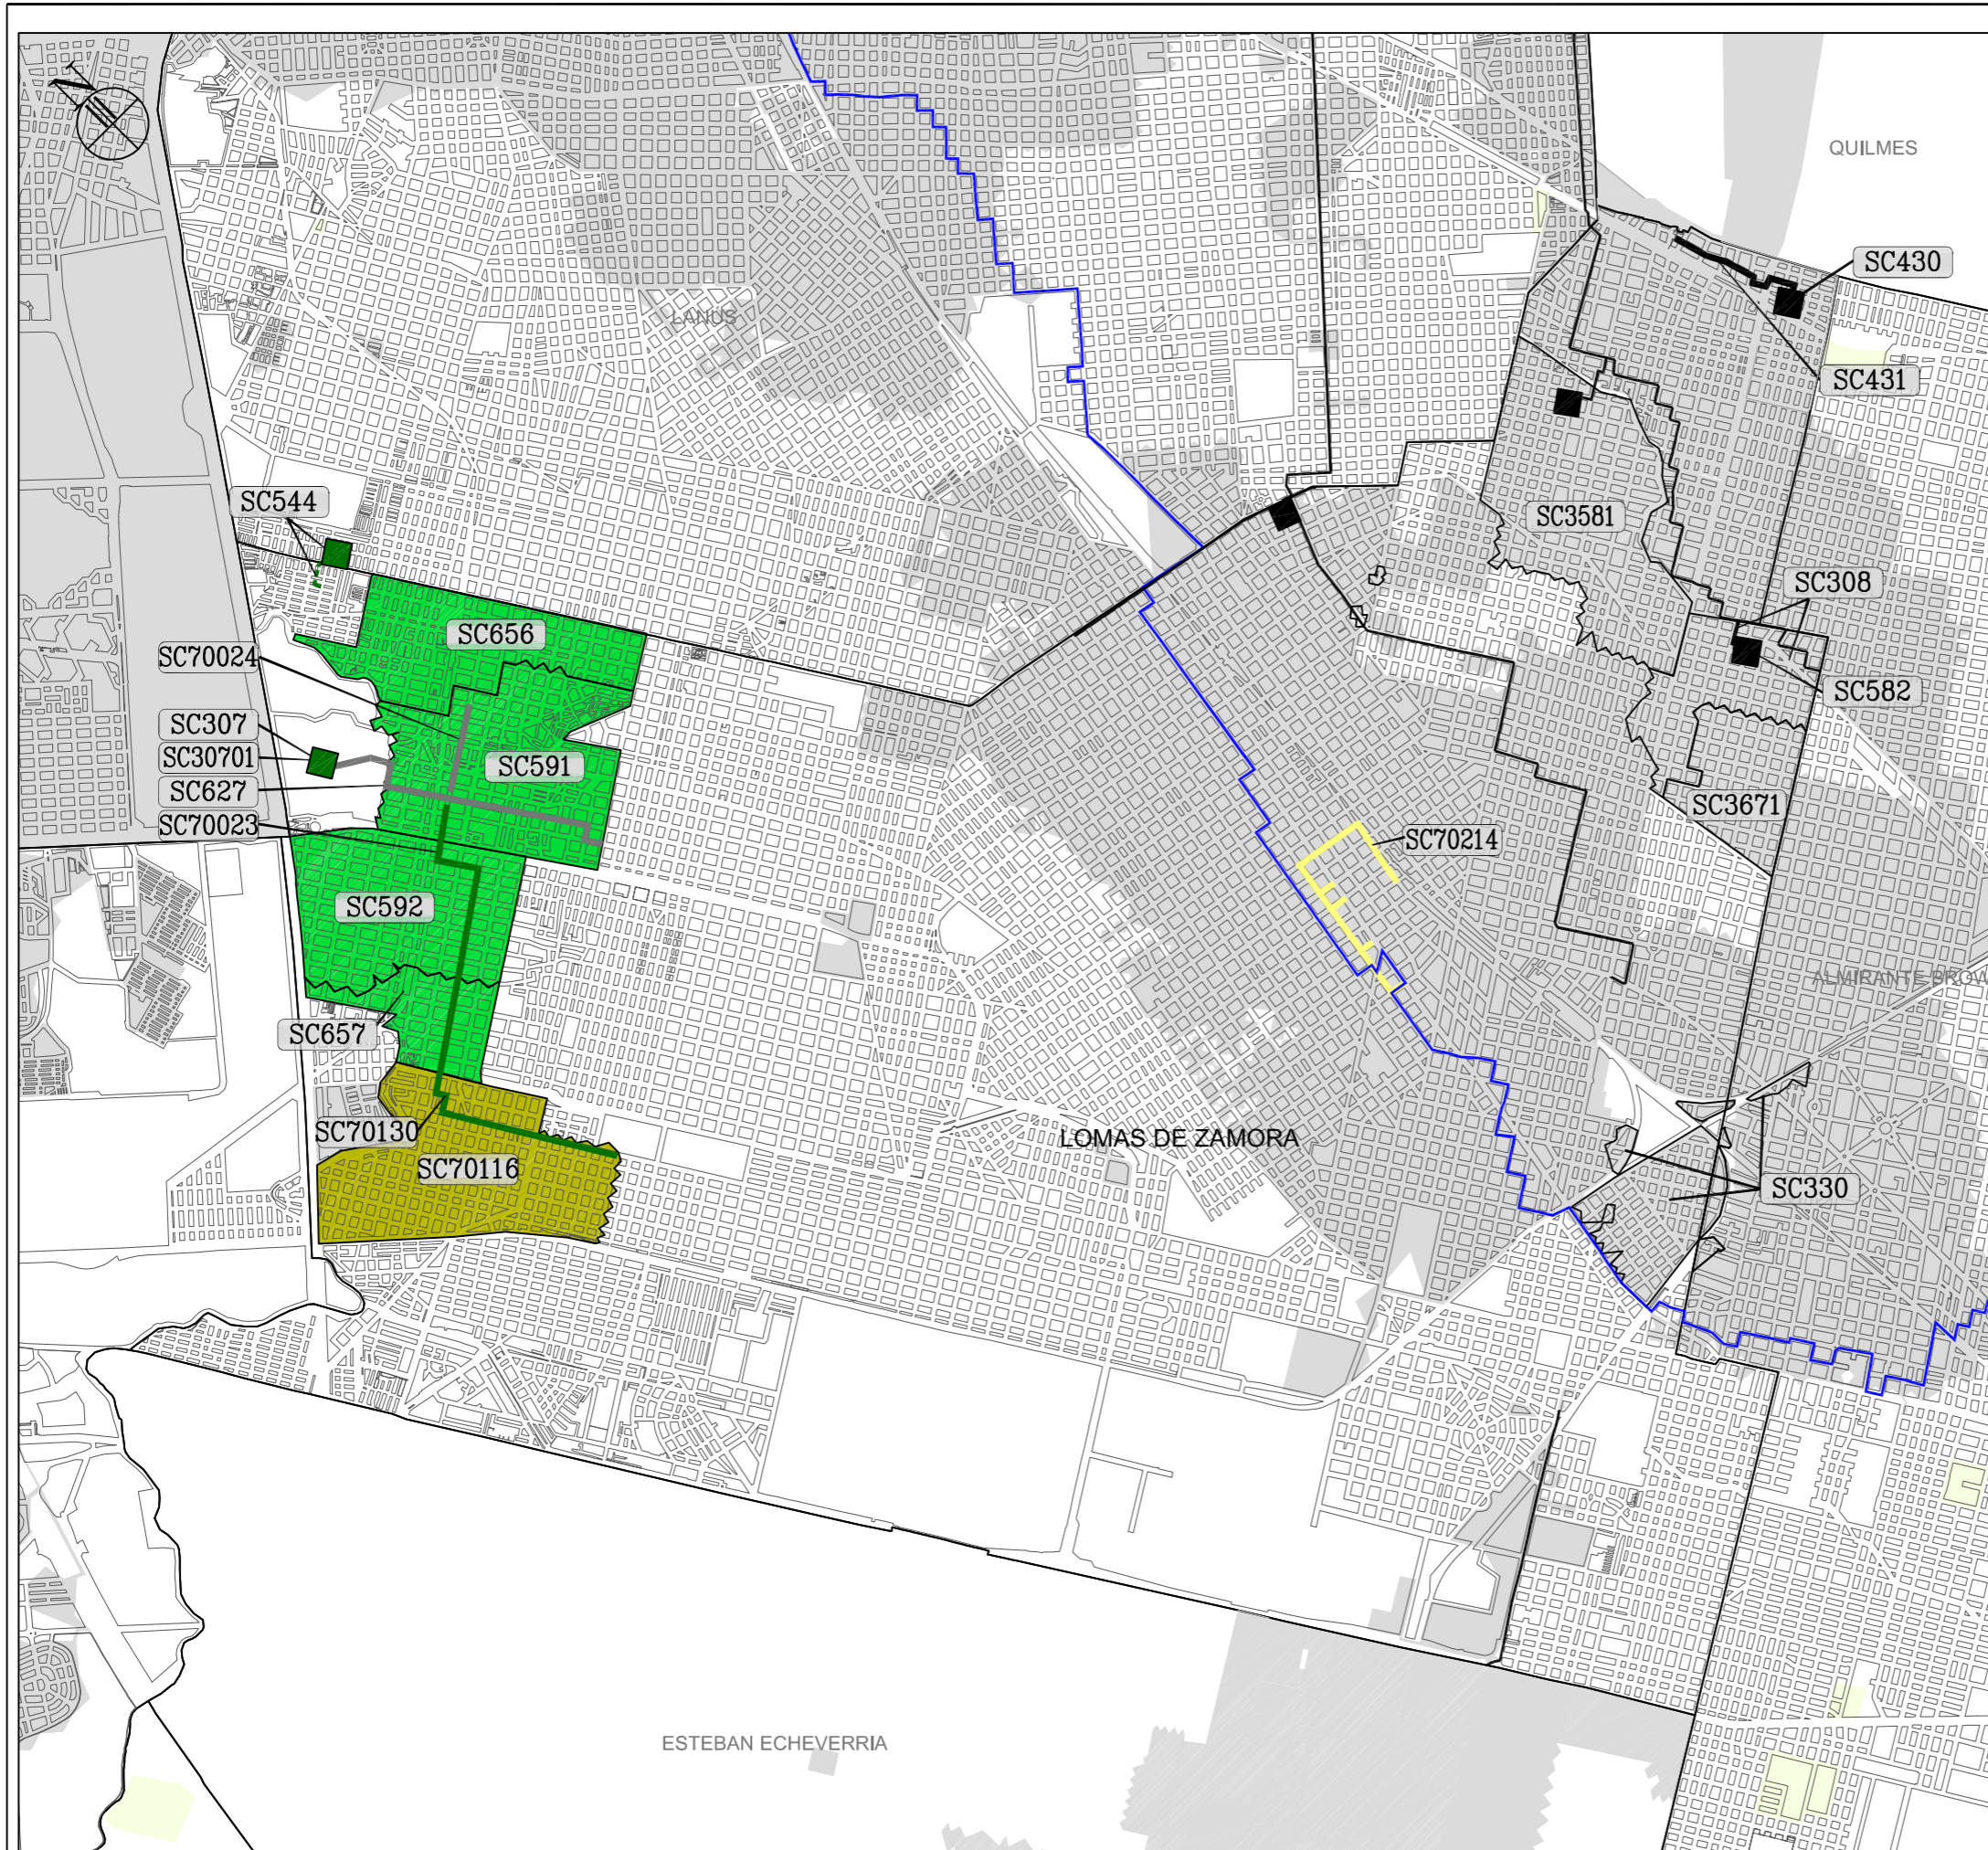

PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
 CÓDIGO ARCHIVO: DG LZ Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
 DESAGÜES CLOCALES









BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL		
RADIO SERVIDO																			
ALMAFUERTE	EXPANSIÓN	SC308	C-1-1.2-RS-LZ-3.9.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL E IMPULSIÓN ALMAFUERTE	AYSA	AYSA	9.548	FINALIZADA	EN SERVICIO	TECMA S.A. - GADES S.A. - PROBA S.A. - U.T.E.	44.869.705	240	100%	jun-12	sep-12	feb-14		
PASCO	EXPANSIÓN	SC431	C-1-1.2-OB-000-3.7.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	IMPULSIÓN PASCO ESTE	AYSA	AYSA	10.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	SAN MARINO CONSTRUCCIONES SA	3.429.745	180	100%	jul-12	nov-12	mar-14		
BANFIELD - L. DE ZAMORA - TEMPERLEY	EXPANSIÓN	SC3581	C-1-1.2-RS-LZ-3.9.3.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS 1	AYSA	AYSA	24.330	FINALIZADA	EN SERVICIO	CONORVIAL S.A. - ILUBAIRES S.A. - U.T.E.	63.913.532	380	100%	abr-11	jun-11	may-14		
ALMAFUERTE	EXPANSIÓN	SC582	C-1-1.2-RS-LZ-3.9.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ALMAFUERTE	AYSA	AYSA	11.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	ILUBAIRES S.A.	3.300.275	300	100%	sep-12	nov-12	dic-14		
PASCO	EXPANSIÓN	SC430	C-1-1.2-OB-000-3.7	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL PASCO ESTE	AYSA	AYSA	13.200	FINALIZADA	EN SERVICIO	BERNAOLA CONSTRUCCIONES S.H.	2.249.942	300	100%	may-11	jun-11	ene-17		
TEMPERLEY	EXPANSIÓN	SC3671	C-1-1.2-RS-LZ-3.9.2	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL LA PERLA 1 CUENCA A	AYSA	AYSA	6.652	FINALIZADA	EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	31.185.354	330	100%	ene-13	abr-13	ago-14		
TURDERA	EXPANSIÓN	SC330	C-1-1.2-RS-LZ-5.1.3.12.1.1 C-1-1.2-RS-LA-5.1.3.5	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL TURDERA 2 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALMIRANTE BROWN	AYSA	AYSA	5.549	FINALIZADA	EN SERVICIO	CETACO S.A. - APCO S.A. - U.T.E.	70.131.964	270	100%	sep-14	mar-15	dic-16		
TOTAL												219.080.517							
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																			
VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SC627	C-1-1.3-RP-000-4.2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR FIORITO Y ENTRADA A PLANTA FIORITO	AYSA	AYSA	188.065	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COARCO S.A.	431.594.820	1.201	100%	sep-14	dic-14	mar-18		
INGENIERO BUDGE	EXPANSIÓN	SC70024	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR CEMENTERIO	AYSA	AYSA	39.300	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	JOSÉ CHEDIACK S.A.I.C.A. - INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. - U.T.E.	75.166.342	481	100%	ago-16	sep-16	sep-17		
TOTAL												506.761.162							
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																			
VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SC307	C-1-1.3-OB-000-4.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES FIORITO	ACUMAR	AYSA	270.000	EN EJECUCIÓN		DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ESUCO S.A. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E.	1.303.304.906	2.000	95%	feb-12	may-12			
VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SC30701	C-1-1.3-OB-000-4.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES FIORITO (AMPLIACIÓN DE PLANTA POR ADDENDA)	AYSA	AYSA	-	EN EJECUCIÓN		DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ESUCO S.A. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E.	145.104.082	240	61%	ago-15	ago-15			
VALENTÍN ALSINA	EXPANSIÓN	SC544	C-1-1.3-RS-LA-4.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN BARRIO EVA PERÓN	PROMEBA	PROMEBA	-	EN EJECUCIÓN		NOREP S.R.L.	-	-	81%	-	-			
VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SC591	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1	AYSA	AYSA	23.183	EN EJECUCIÓN		PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M	250.101.395	930	68%	jul-16	ago-16			
INGENIERO BUDGE	EXPANSIÓN	SC70023	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BUDGE	AYSA	AYSA	35.833	EN EJECUCIÓN		JOSÉ CHEDIACK S.A.I.C.A. - INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. - U.T.E.	140.344.492	621	80%	ago-16	sep-16			
INGENIERO BUDGE	EXPANSIÓN	SC592	C-1-1.3-RS-LZ-4.2.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE	AYSA	AYSA	22.165	EN EJECUCIÓN		TECMA S.A. GADES S.A. - UNIÓN TRANSITORIA	173.844.769	730	0%	mar-17	jun-17			
VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SC656	C-1-1.3-RS-LZ-4.2.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2	AYSA	AYSA	21.370	EN EJECUCIÓN		CETACO S.A.	227.749.968	750	68%	jun-17	jun-17			
VILLA ALBERTINA	EXPANSIÓN	SC657	C-1-1.3-RS-LZ-4.2.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA NORTE	AYSA	AYSA	9.014	EN EJECUCIÓN		MARLE CONSTRUCCIONES S.A.	61.508.904	420	0%	dic-17	ene-18			
VILLA ALBERTINA	EXPANSIÓN	SC70130	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE A	AYSA	AYSA	95.600	EN EJECUCIÓN		CRZ CONSTRUCCIONES S.A.	177.179.860	510	0%	mar-18	abr-18			
TOTAL												2.479.138.376							
OBRAS EN LICITACIÓN / PRÓXIMAS A LICITAR																			
LOMAS DE ZAMORA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SC70214	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR SARMIENTO	AYSA	AYSA	18.000	EN LICITACIÓN	PARA APERTURA DE SOBRES 05-07-2018		44.369.125	330						
VILLA ALBERTINA	EXPANSIÓN	SC70116	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR	AYSA	AYSA	20.264	EN LICITACIÓN	PARA APERTURA DE SOBRES 01-08-2018		257.792.318	840						
TOTAL												302.161.442							




PARTIDO DE MORÓN

DESAGÜES CLOCALES




REFERENCIAS




-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR


DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR

-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE MORÓN
 FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
 CÓDIGO ARCHIVO: DG MOR Cloaca 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
 DESAGÜES CLOCALES

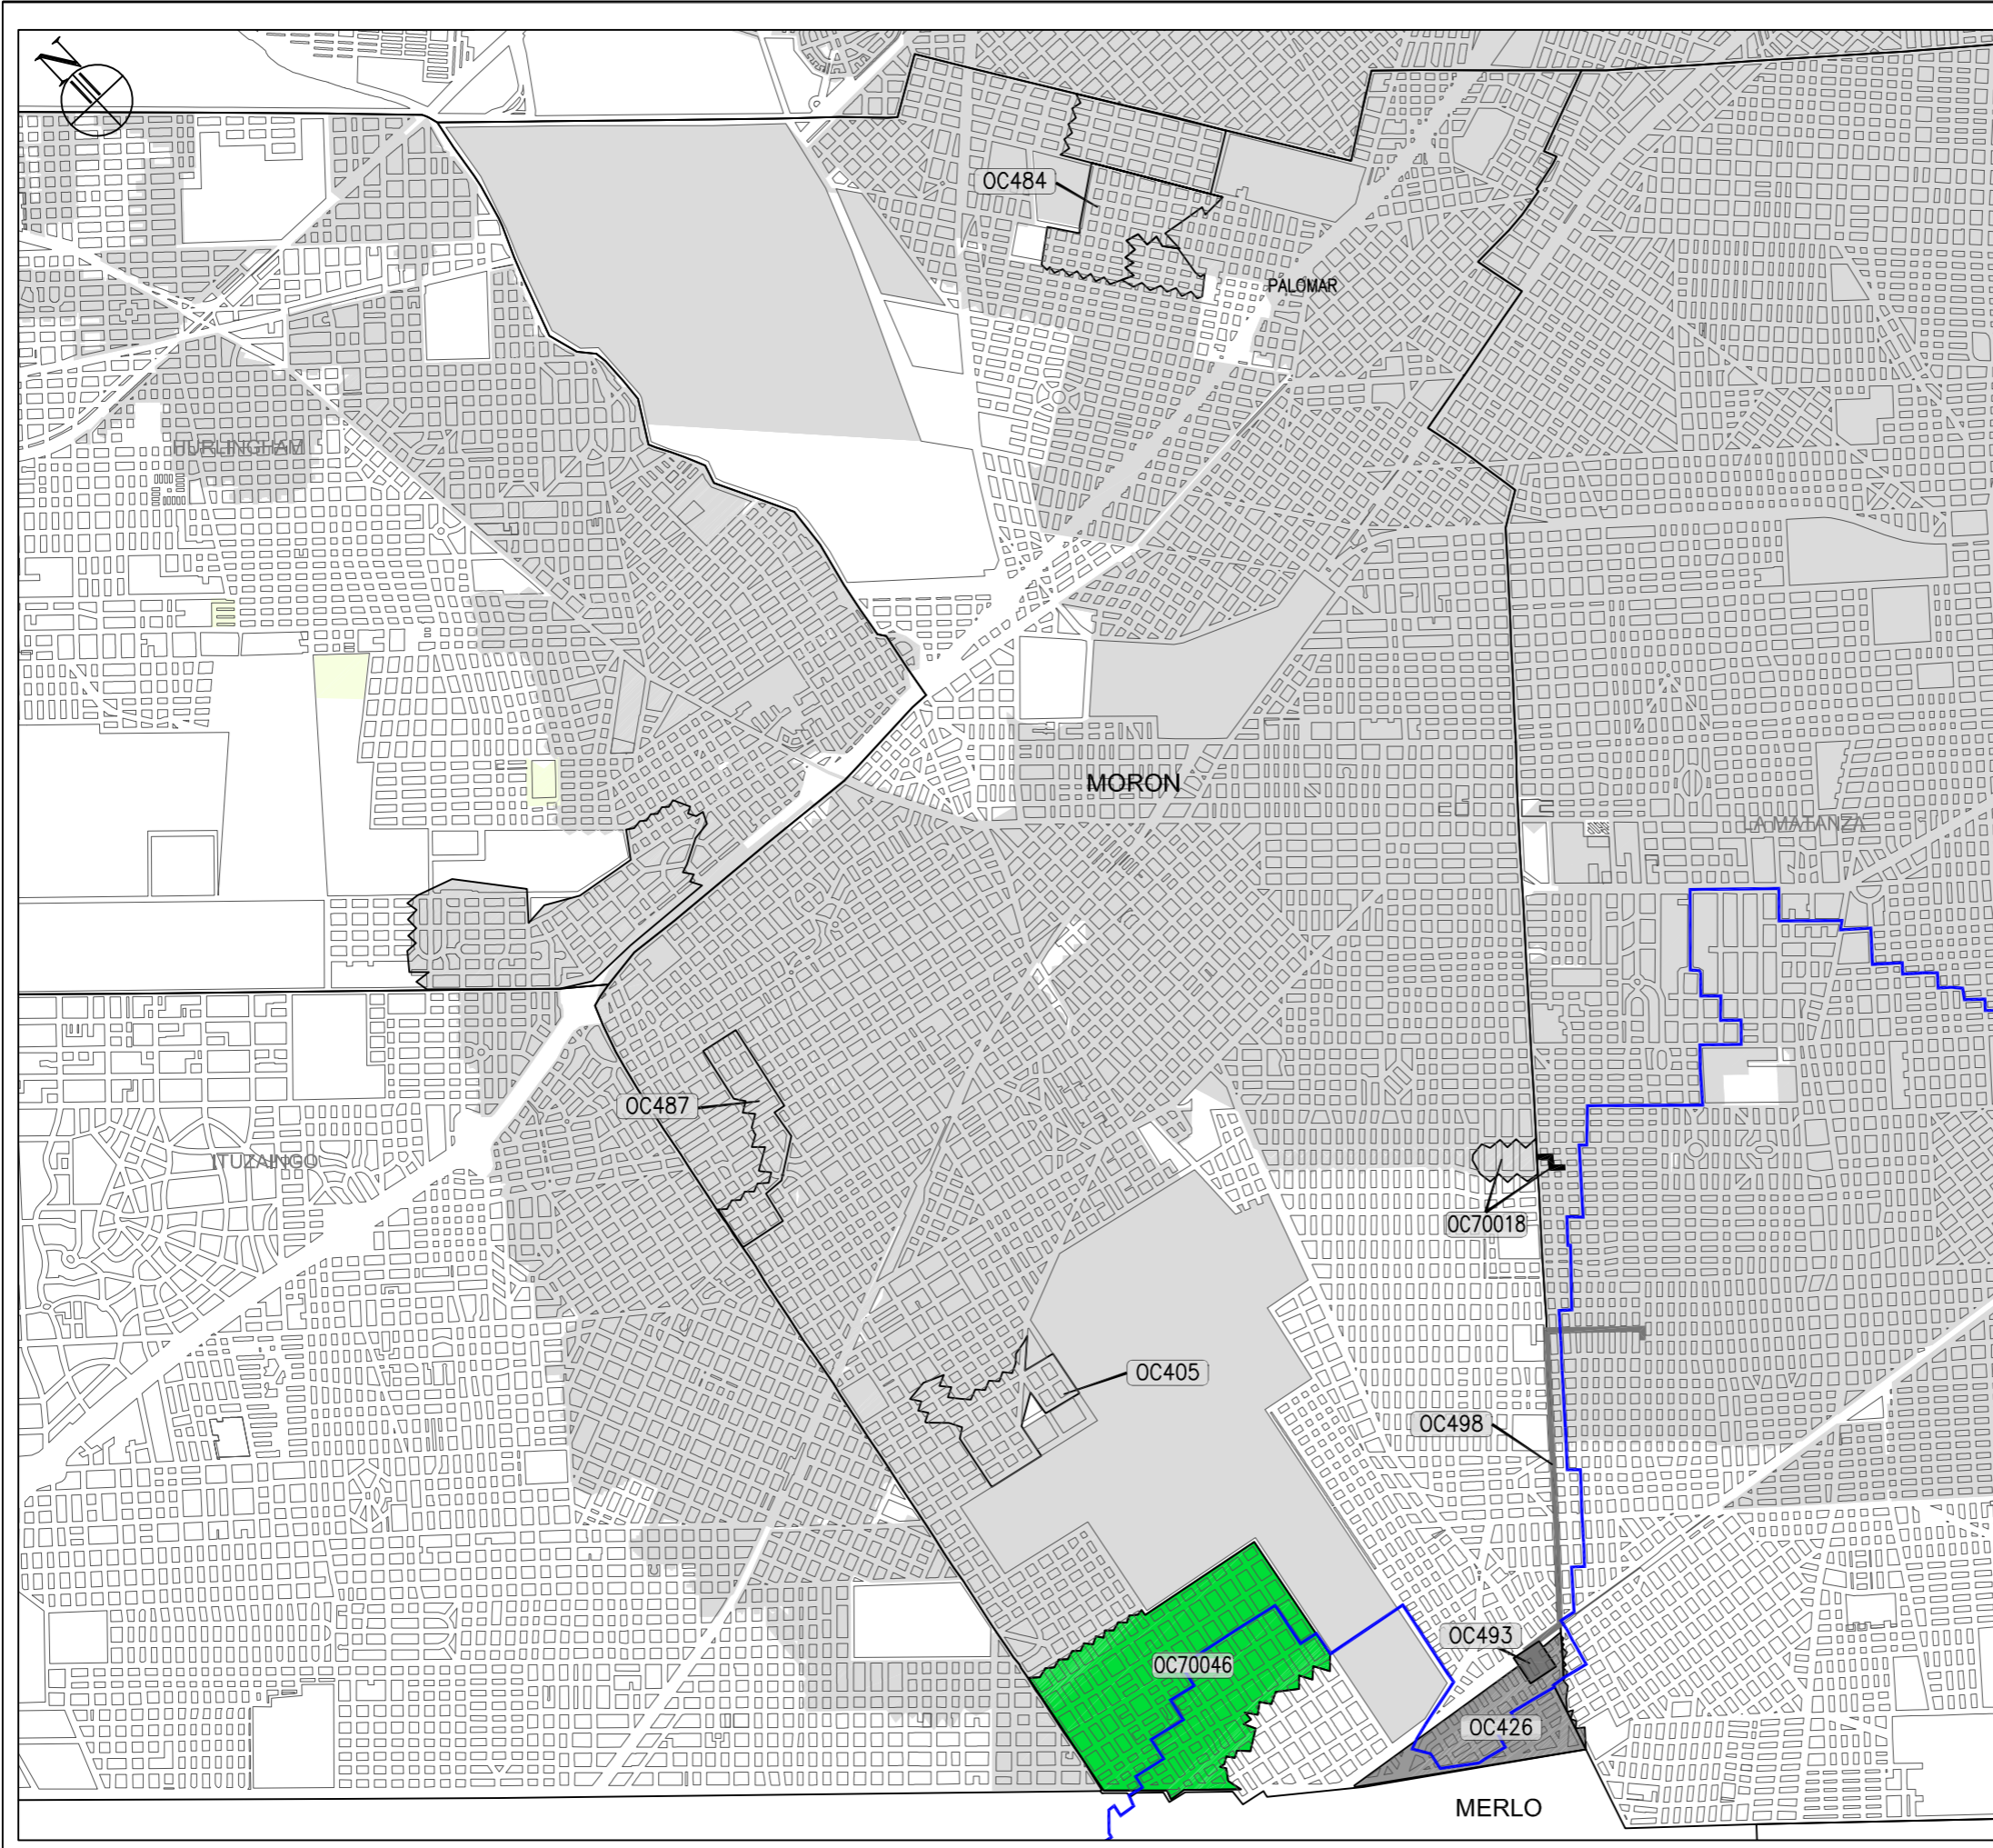

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA)	PLAZO	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL		
RADIO SERVIDO																			
CASTELAR	EXPANSIÓN	OC405	C-5-5-RS-MO-3.3	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL CASTELAR SUR ETAPA 2	AYSA	AYSA	2.240	FINALIZADA	EN SERVICIO	CONSTRUCCIONES RED VIAL S.A.	17.782.957	270	100%	jul-13	oct-13	ago-14		
EL PALOMAR	EXPANSIÓN	OC484	C-5-5-RS-MO-2.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR BERGAMINI - PRIMERA ETAPA	PLAN MÁS CERCA	MUNICIPIO	3.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	ARR-CA S.R.L.	14.097.979	270	100%	oct-13	dic-13	ene-15		
CASTELAR	EXPANSIÓN	OC487	C-5-5-RS-MO-3.2	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL CASTELAR NORTE ETAPA 2	PLAN MÁS CERCA	MUNICIPIO	3.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L.	9.709.337	270	100%	ene-14	feb-14	abr-15		
MORÓN	EXPANSIÓN	OC70018	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL CALLE ALESSANDRI	AYSA	AYSA	628	FINALIZADA	EN SERVICIO	EBCON S.A.	7.051.361	150	100%	may-14	nov-14	sep-16		
TOTAL												48.641.633							
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																			
CASTELAR	EXPANSIÓN	OC426	C-5-5.6-RP-000-5.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO	AYSA	AYSA	5.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	SADAMEC S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA - U.T.E.	55.255.129	390	100%	dic-14	feb-15	ene-17		
CASTELAR	EXPANSIÓN	OC493	-	SIN AFECTACIÓN A CMR CON INCIDENCIA DIRECTA	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO	AYSA	AYSA	4.950	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L.	13.437.485	709	100%	abr-15	jun-15	nov-17		
MORÓN	EXPANSIÓN	OC498	C-5-5.6-RP-000-3.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN MERLO	AYSA	AYSA	5.380	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	INSUTE S.A.	12.319.483	312	100%	ago-14	ene-15	nov-16		
TOTAL												81.012.096							
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																			
CASTELAR	EXPANSIÓN	OC70046	C-5-5.6-RP-000-3.1.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUR RESTO	BID 2 TRAMO 3	AYSA	13.278	EN EJECUCIÓN		APCO S.A.	107.383.799	480	0%	oct-17	mar-18			
TOTAL												107.383.799							
