



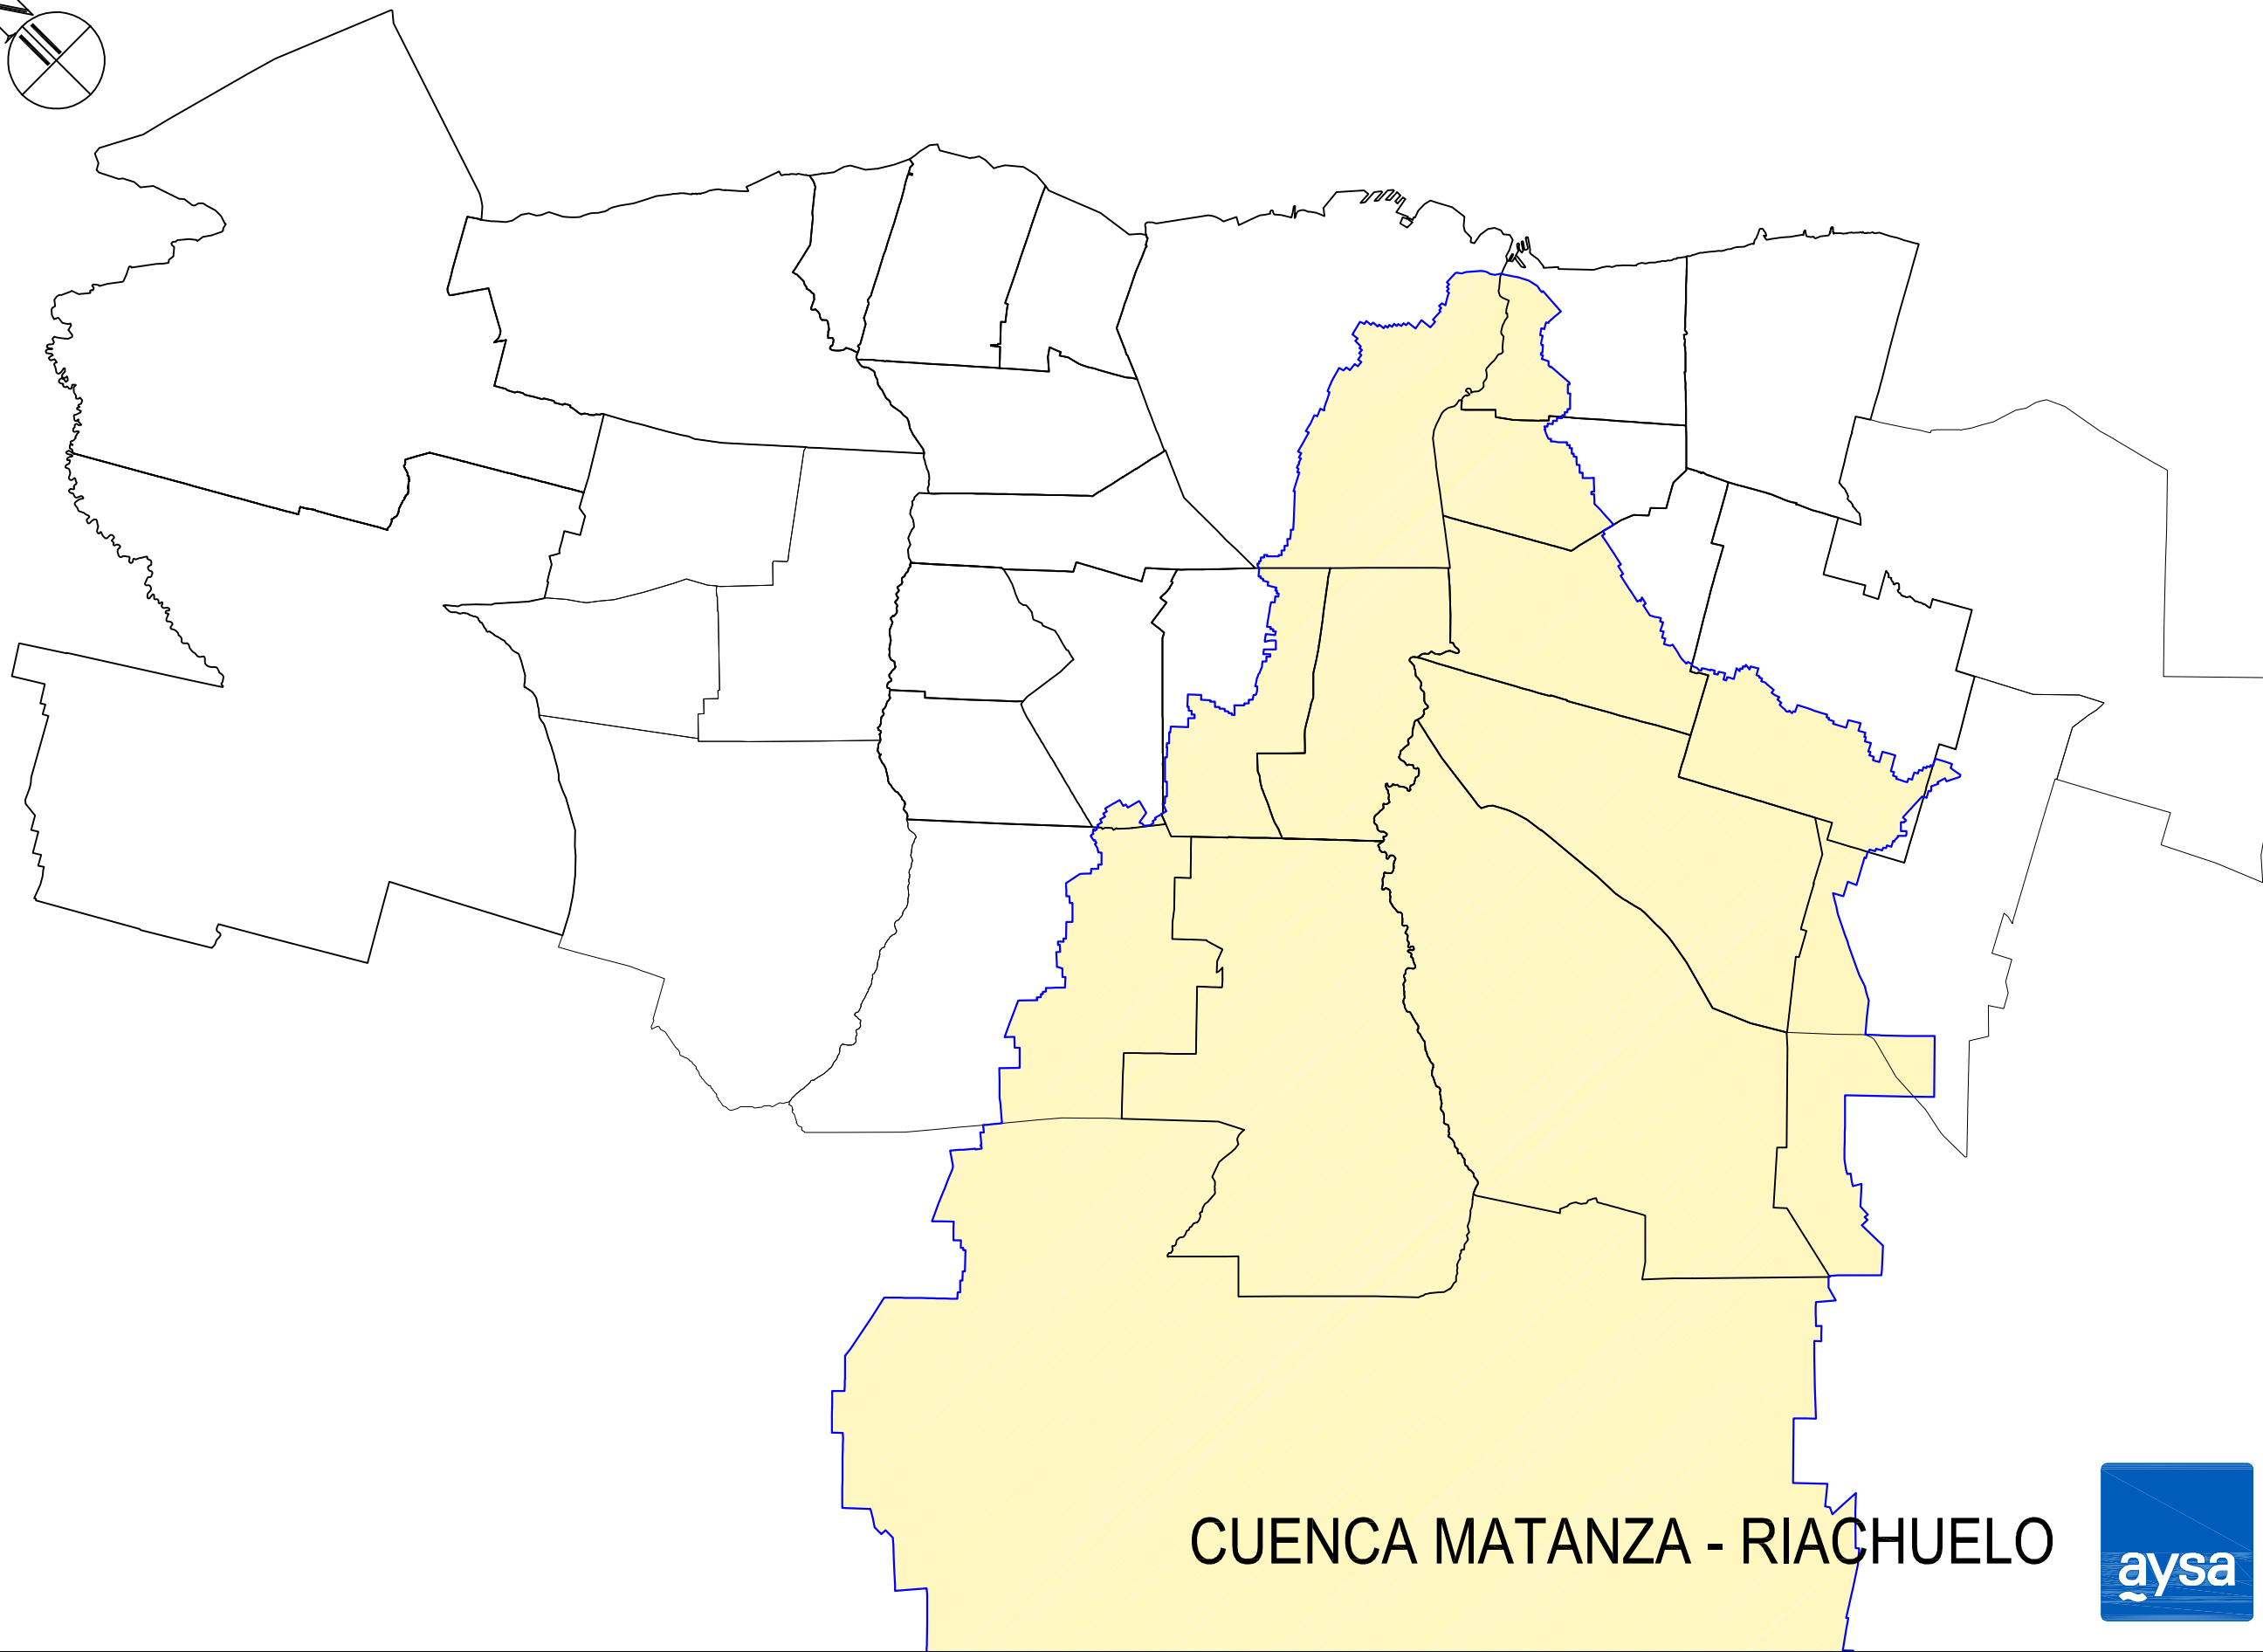

Almirante Brown
Avellaneda
Capital Federal
Esteban Echeverría
Ezeiza
La Matanza
Lanús
Lomas de Zamora
Morón

CUENCA MATANZA - RIACHELO
ESTADO de PROYECTOS y OBRAS
Al 30-06-2018



CUENCA MATANZA - RIACHUELO



PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

AGUA POTABLE

REFERENCIAS

- RADIO SERVIDO
- NN000 NÚMERO DE "P3"
- RED EXISTENTE
- CUENCA MATANZA RIACHUELO
- OBRA BÁSICA
- RED SECUNDARIA

OBRAS:

- FINALIZADAS SIN SERVICIO
- CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
- EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR


DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

- PROYECTO REALIZADO
- DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
- DB A ELABORAR
- DESVINCULADOS
- RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
- OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG AB Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE

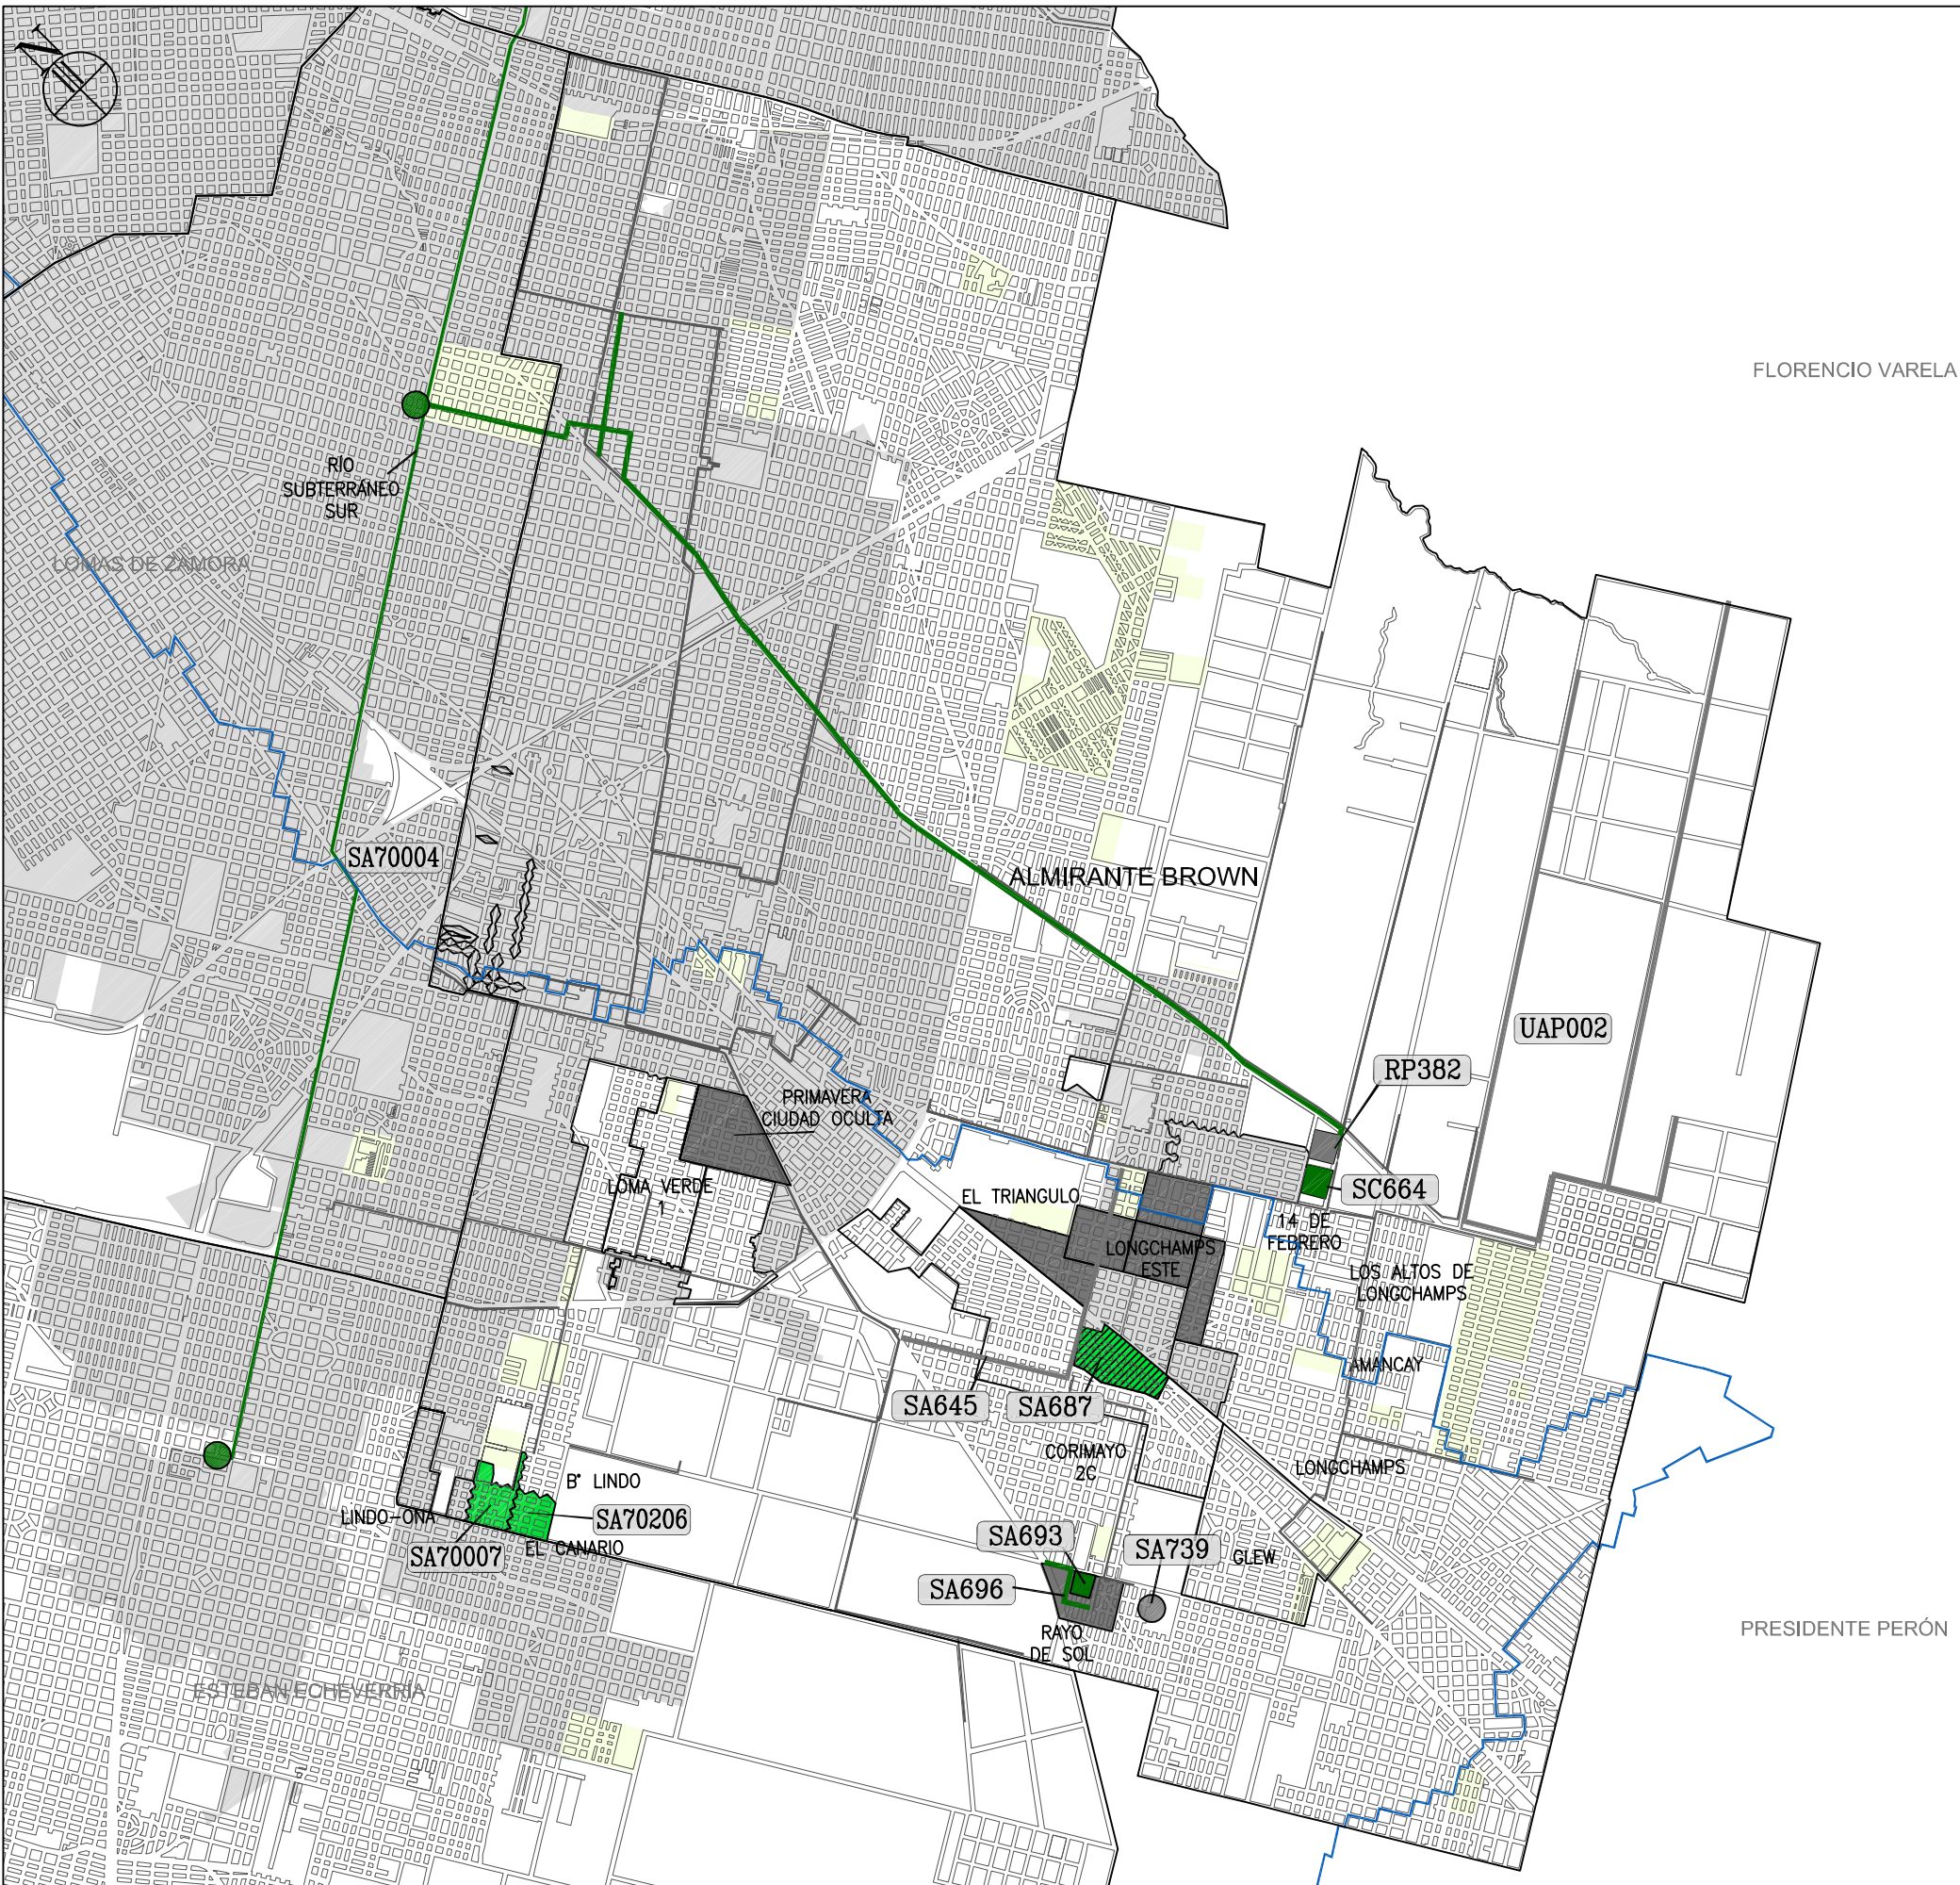



PROYECTOS Y OBRAS AySA


Estado al 30/06/18

ALTE. BROWN
AGUA

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL	
RADIO SERVIDO																		
	ADROGUÉ	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA70004	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - ADROGUÉ CENTRO	AYSA	AYSA	1.050	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	9.263.213	140	100%	jul-14	sep-14	mar-15
TOTAL												9.263.213						
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
	LONGCHAMPS	EXPANSIÓN	SA739	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 2 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. BARRIO RAYO DE SOL	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	ARTECO S.A.	373.854	40	80%	oct-12	mar-13	-
	MINISTRO RIVADAVIA	EXPANSIÓN	UAP002	A-2-2.3-OB-000-2.2	SIN AFECTACIÓN A CMR	IMPULSIÓN DE POZOS BATERÍA GLEW ETAPA 3	AYSA	AYSA	50.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	FONTANA NICASTRO S.A.C.	23.382.222	200	100%	jun-12	ago-12	ene-14
	MINISTRO RIVADAVIA	EXPANSIÓN	RP382	A-2-2.3-OB-000-2.2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA GLEW - ETAPA 1	CAF TRAMO 1	AYSA	30.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	VODATEC S.A.	13.445.408	269	100%	nov-10	dic-10	mar-15
	LONGCHAMPS	EXPANSIÓN	SA645	A-2-2.3-RP-AB-2.3.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS GLEW 3° ETAPA	AYSA	AYSA	25.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	GADES S.A.	48.964.344	430	100%	jul-14	sep-14	dic-16
TOTAL												86.165.828						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
	LONGCHAMPS	EXPANSIÓN	SA687	A-2-2.3-RS-AB-2.4.1.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REDES DE AGUA POTABLE - LONGCHAMPS CENTRO 3	ENOHSA	MUNICIPIO	2.600	EN EJECUCIÓN		PALECO S.A.	-	-	79%	-		
	MINISTRO RIVADAVIA	EXPANSIÓN	SA664	A-2-2.3-OB-000-2.2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA GLEW 2DA ETAPA	CAF TRAMO 2	AYSA	70.000	EN EJECUCIÓN		ELEPRINT S.A.	185.547.319	1.303	94%	dic-13	mar-14	
	LONGCHAMPS	EXPANSIÓN	SA693	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL	AYSA	AYSA	10.000	EN EJECUCIÓN		BRIDGE HYDROGEN S.A.	40.692.472	310	33%	mar-17	jun-17	
	LONGCHAMPS	EXPANSIÓN	SA696	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO RAYO DE SOL	AYSA	AYSA	10.000	EN EJECUCIÓN		BRIDGE HYDROGEN S.A.	12.389.240	255	80%	mar-17	sep-17	
	BURZACO	EXPANSIÓN	SA70007	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA EL CANARIO M1	AYSA	A+T	1.424	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA	5.704.300	450	8%	nov-17	feb-18	
	BURZACO	EXPANSIÓN	SA70206	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO EL CANARIO M2	AYSA	A+T	1.172	CONTRATADA		-	3.643.824	300	0%	mar-18		
TOTAL												247.977.155						

PARTIDO DE AVELLANEDA
AGUA POTABLE

REFERENCIAS



-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS


-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR

-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE AVELLANEDA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG AVE Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE

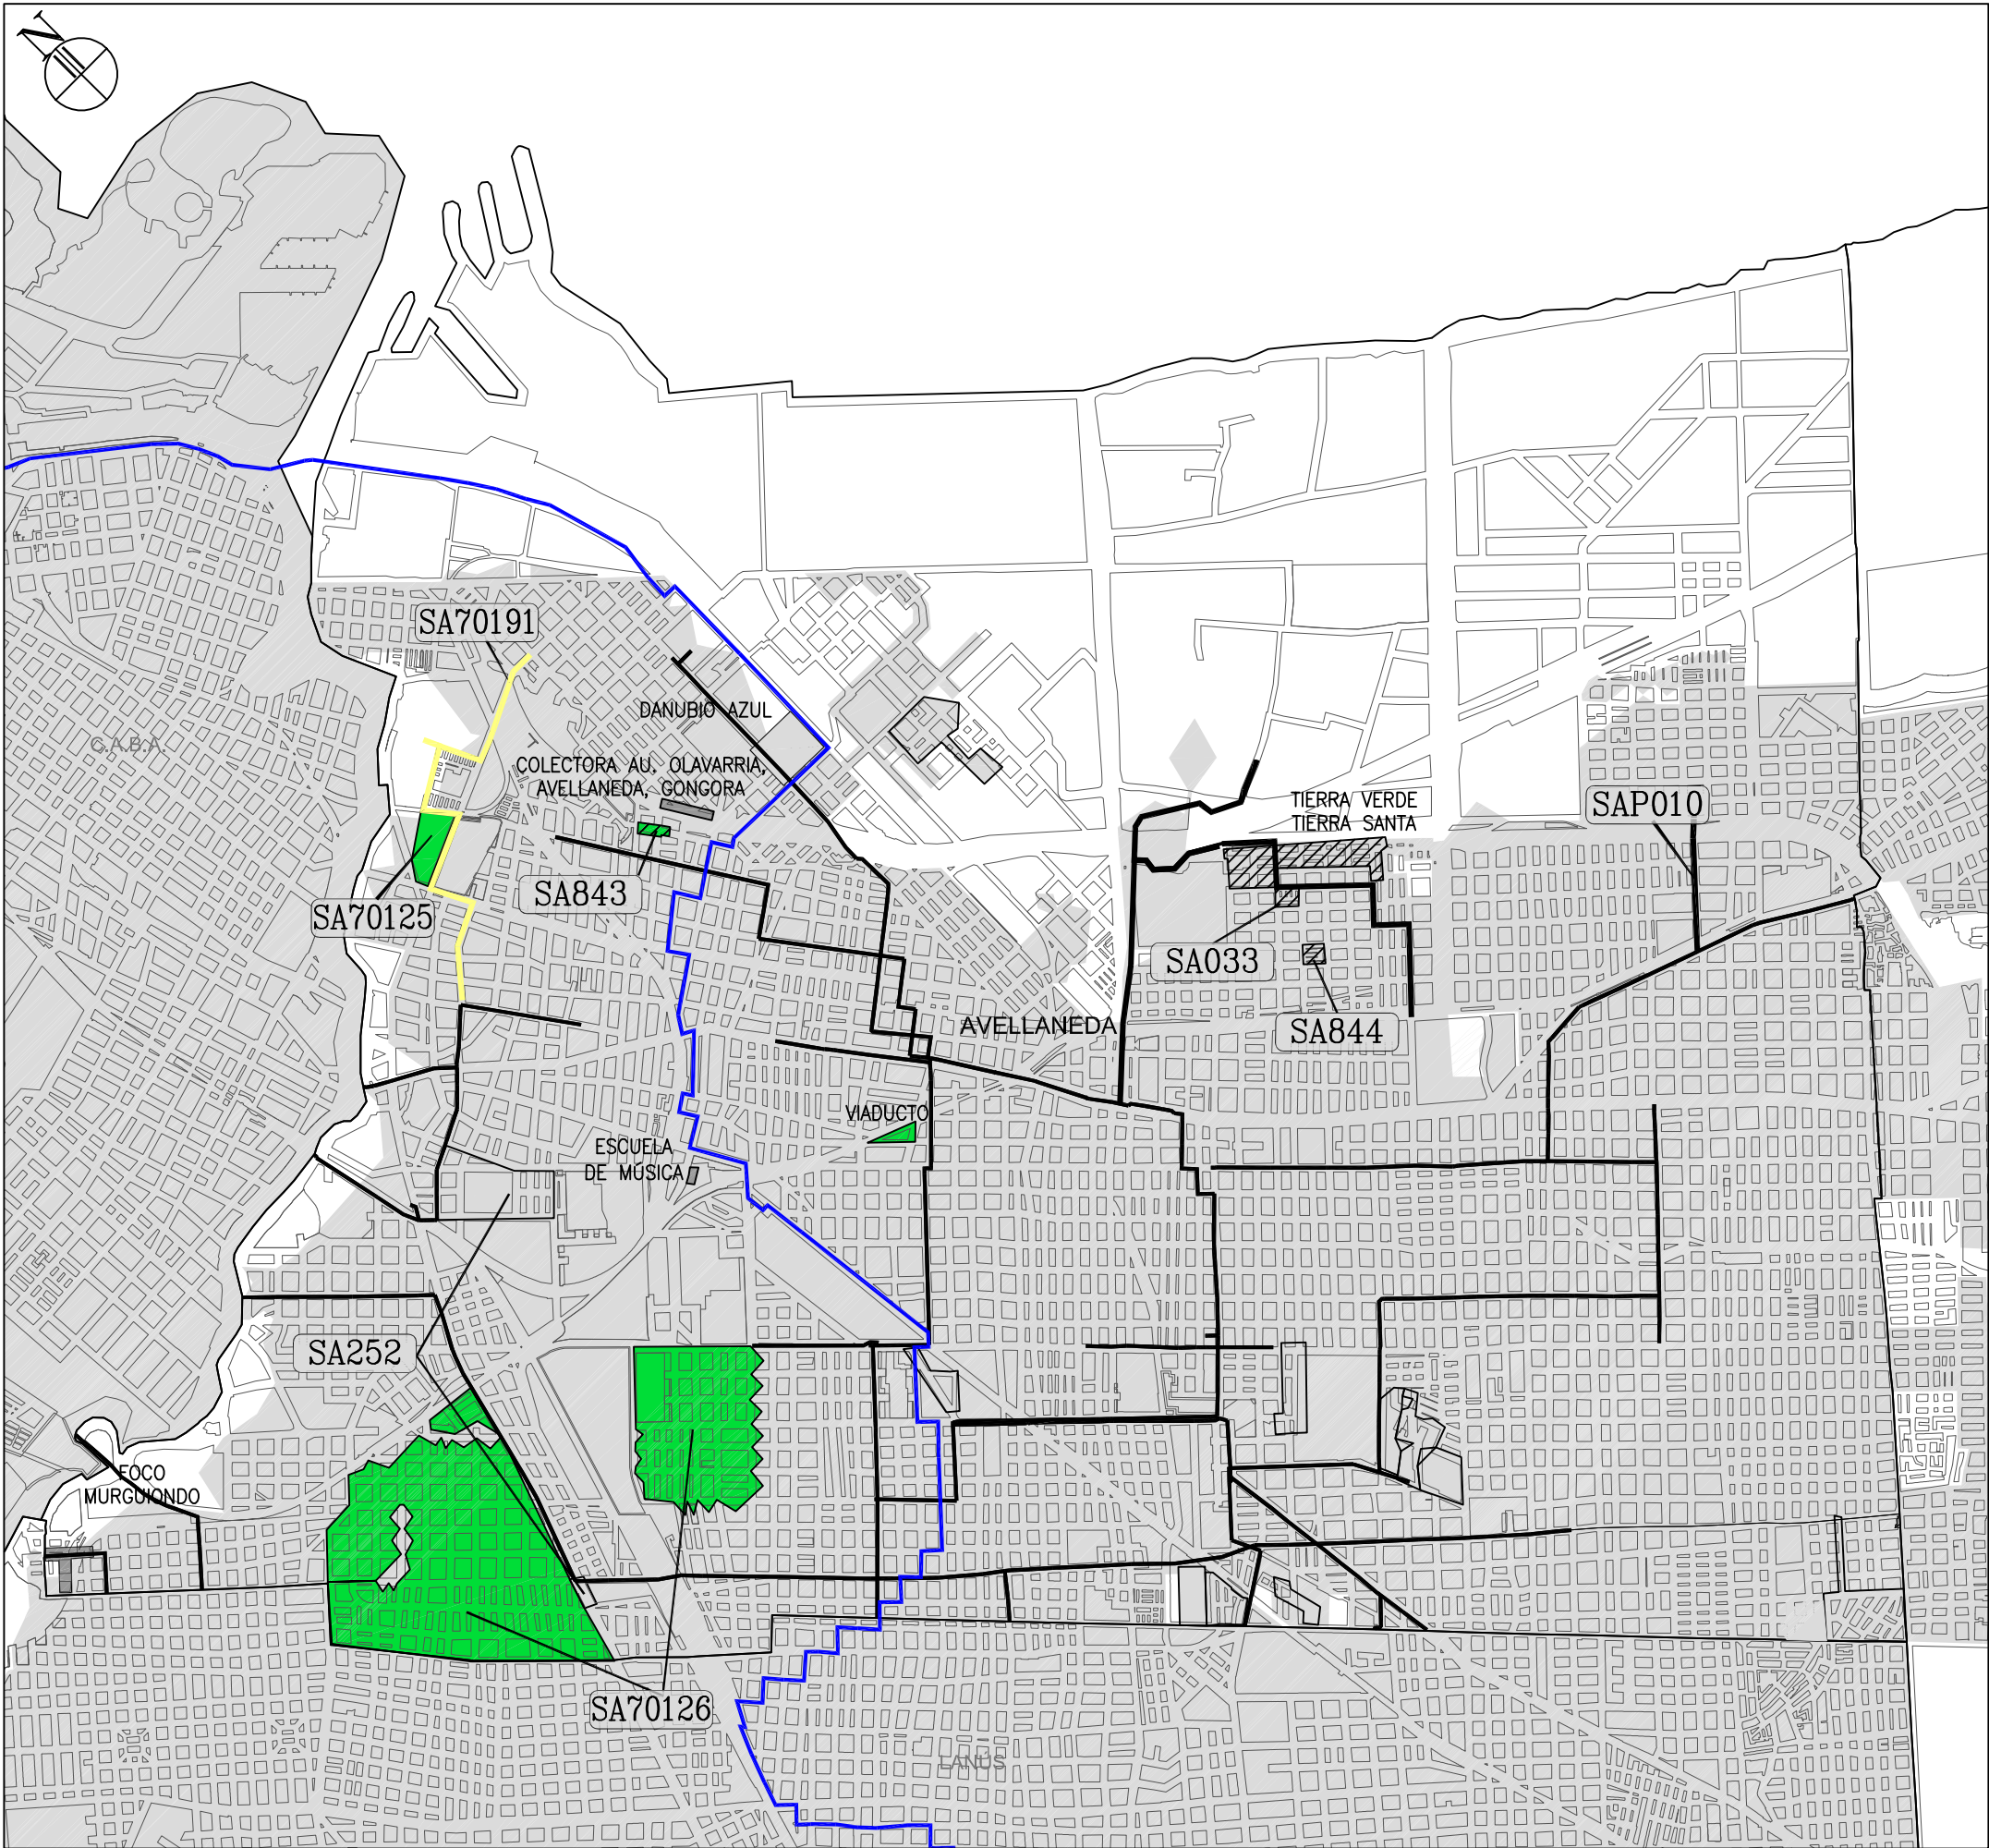




PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA)	PLAZO	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL	
RADIO SERVIDO																			
	WILDE	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SAP010	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	REFUERZO BAHÍA BLANCA ENTRE RAMÓN FRANCO Y ORTEGA - WILDE	OBRA PRIMARIA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	2.108.728	90	100%	jul-13	ago-13	dic-14
	VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SA033	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA 62 VIVIENDAS BARRIO NUEVA ANA	OBRA SECUNDARIA	PFV	MUNICIPIO	310	FINALIZADA	EN SERVICIO	SENTRA S.A.	-	365	100%	dic-07	may-09	ene-14
	VILLA DOMÍNICO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA252	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN REDES DE AGUA MALLAS AVE022 - AVE 042 - PLAN VERANO DRSUR	OBRA SECUNDARIA	BID 2 TRAMO 1	AYSA	572	FINALIZADA	EN SERVICIO	P.C.C. S.R.L.	1.577.562	150	100%	may-10	jul-10	oct-16
	VILLA DOMÍNICO	EXPANSIÓN	SA844	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA 112 VIVIENDAS BARRIO EL RELÁMPAGO	OBRA SECUNDARIA	PFV	MUNICIPIO	560	FINALIZADA	EN SERVICIO	EDUARDO COLOMBI	-	365	100%	ene-10	oct-10	ene-14
TOTAL													3.686.289						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																			
	DOCK SUD	EXPANSIÓN	SA843	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA AUTOPISTA Y 12 DE OCTUBRE (Etapa II)	OBRA SECUNDARIA	PFV	MUNICIPIO	-	EN EJECUCIÓN		-	-	-	95%		mar-10	
	AVELLANEDA	EXPANSIÓN	SA70125	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO VILLA TRANQUILA	OBRA SECUNDARIA	AYSA	A+T	1.358	EN EJECUCIÓN		-	3.004.355	270	32%	nov-16	abr-17	
	GERLI PIÑEIRO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA70126	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA GERLI - PIÑEIRO	OBRA SECUNDARIA	BID 2 TRAMO 3	AYSA	16.073	CONTRATADA		INARTECO S.A.	107.336.475	720	0%	ene-18		
TOTAL													110.340.830						
OBRAS EN LICITACIÓN / PRÓXIMAS A LICITAR																			
	DOCK SUD AVELLANEDA	EXPANSIÓN	SA70191	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 1 Y 3	OBRA PRIMARIA	PFV	AYSA	20.800	EN LICITACIÓN	EN ANÁLISIS DE OFERTAS		62.317.220	510				
TOTAL													62.317.220						

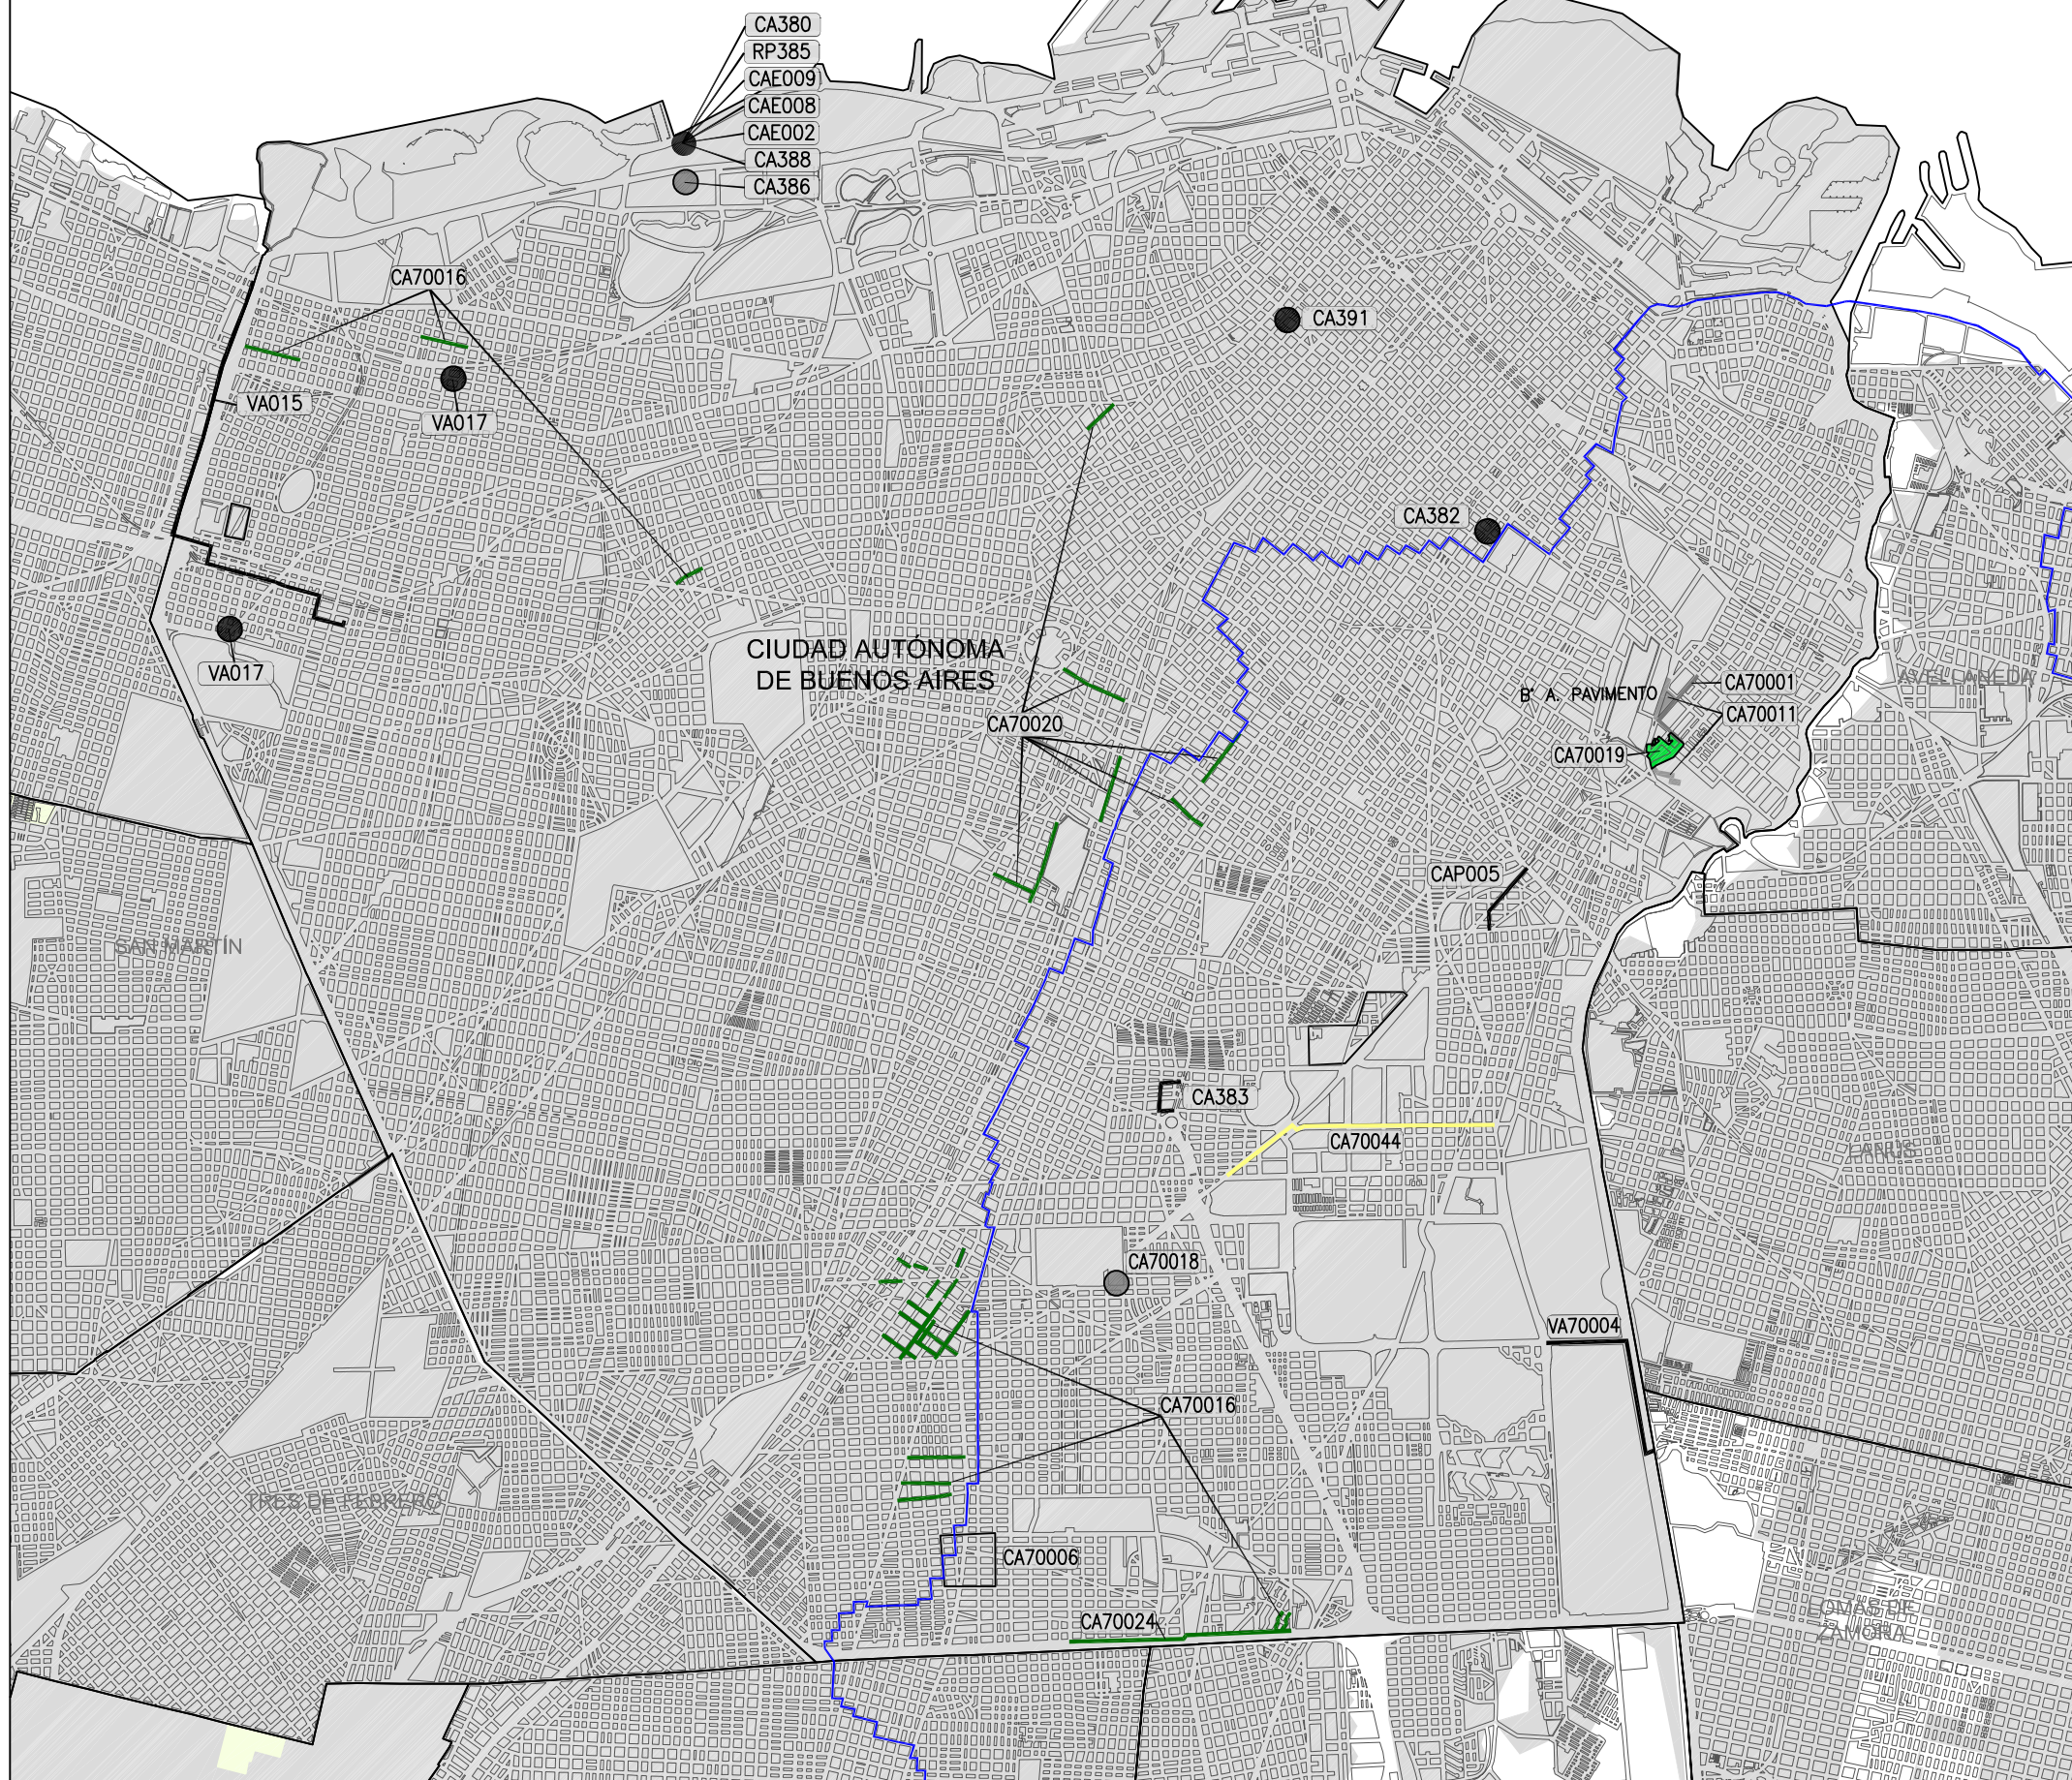

REFERENCIAS

-  RADIO SERVIDO
 NÚMERO DE "P3"
 RED EXISTENTE
 CUENCA MATANZA RIACHUELO
 OBRA BÁSICA
 RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
 -  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
 -  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
 DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
 DB A ELABORAR

 DESVINCULADOS
 RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
 OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

CAPITAL FEDERAL

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG CABA Aqua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE



PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18

C.A.B.A

AGUA

BARRIO / LOCALIDAD		ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL
RADIO SERVIDO																		
	PALERMO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	RP385	A-1-1.1-OB-000-3.5	SIN AFECTACIÓN A CMR	AGUA CRUDA: RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	BID 2 TRAMO 1	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	KSB COMPAÑIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A.	19.209.578	420	100%	ago-11	sep-11	ene-14
	CONSTITUCIÓN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA382	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIÓN ELEVADORA PAITOVÍ - 2° ETAPA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	22.870.633	240	100%	nov-11	nov-11	ene-14
	PALERMO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA388	A-1-1.1-OB-000-2.50	SIN AFECTACIÓN A CMR	PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - DECANTACIÓN III (RENOVACIÓN DE VERTEDEROS)	BID 2 TRAMO 2	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	16.977.592	150	100%	ago-13	sep-13	may-14
	CONSTITUCIÓN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CAP005	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REFUERZO BARRIO POMPEYA	AYSA	AYSA	17.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	2.458.721	180	100%	feb-13	oct-13	oct-14
	PALERMO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CAE009	A-1-1.1-OB-000-4.2	SIN AFECTACIÓN A CMR	TABLEROS DE CALIDAD: INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS	BID 2 TRAMO 1	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	ILUBAIRES S.A.	4.343.412	365	100%	abr-12	may-12	nov-14
	PALERMO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CAE008	A-1-1.1-OB-000-3.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	PROYECTOS ELÉCTRICOS III: RENOVACIÓN TABLEROS SALA ELEVADORAS PRINCIPALES	BID 2 TRAMO 1	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	ILUBAIRES S.A.	23.556.619	270	100%	sep-11	oct-11	oct-14
	FLORES	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA383	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - DESVÍO ALIMENTACIÓN DN800/7000 - PLAZA DE LOS VIRREYES	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	PROBA S.A.C.I.F.I.A.	6.477.076	120	100%	jun-12	ago-12	dic-14
	PALERMO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CAE002	A-1-1.1-OB-000-3.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	PROYECTOS ELÉCTRICOS I: REHABILITACIÓN /RENOVACIÓN DE TABLEROS, MOTORES Y SET	BID 2 TRAMO 1	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	MONTELECTRO S.A.	21.094.462	540	100%	sep-11	oct-11	oct-14
	CENTRO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA391	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CENTRO - NUEVO MOTOR CON VARIADOR	CAF TRAMO 2	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	MONTELECTRO S.A.	10.003.745	561	100%	abr-14	may-14	nov-15
	FLORES	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA70006	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LINIERS 2	AYSA	AYSA	3.116	FINALIZADA	EN SERVICIO	CIMA S.A.	32.349.819	759	100%	jun-15	ago-15	nov-17
	VARIOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	VA015	A-1-1.2-OB-000-3.16.6	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO AL CONDUCTO RIBEREÑO	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	C & E CONSTRUCCIONES S.A. - PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M - UTE	253.002.433	920	100%	nov-13	feb-14	ene-17
	VARIOS	EXPANSIÓN	VA017	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	CÁMARAS DE ACCESO A RÍOS SUBTERRÁNEOS	BID 2 TRAMO 2	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	52.820.329	924	100%	nov-14	abr-15	ene-18
	VARIOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	VA70004	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CAPITAL FIORITO - TRAMO 1	AYSA	AYSA	24.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	89.668.046	715	100%	ago-15	oct-15	oct-17
PALERMO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA380	A-1-1.1-OB-000-3.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	EJECUCIÓN TRANSFORMADORA PRINCIPAL Y RED MEDIA TENSIÓN PTA. SAN MARTÍN	BID 2 TRAMO 1	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO PARCIAL	ELECTROINGENIERIA ICS A.A.	55.727.271	805	100%	sep-13	oct-13	dic-15	
TOTAL													610.559.737					
	PALERMO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA386	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE CLORO	BID 2 TRAMO 2	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	92.388.254	697	100%	oct-14	dic-14	dic-16
	BARRACAS	EXPANSIÓN	CA70011	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA 21-24 MOD 1 - B° ALEGRE PAVIMENTO	AYSA	A+T	2.770	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA.	4.715.677	120	100%	jun-14	may-14	ene-15
	BARRACAS	EXPANSIÓN	CA70001	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REFUERZO VILLA 21 - 24	AYSA	A+T	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA.	1.578.543	120	100%	nov-13	dic-13	may-17
	FLORESTA	EXPANSIÓN	CA70018	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	AMPLIACIÓN ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA FLORESTA	CAF TRAMO 3	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	GTMH ARGENTINA SA	49.547.434	660	100%	may-16	jun-16	oct-17
TOTAL													148.229.908					
	OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																	
	VARIOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA70016	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA TRAMOS DE HF - DRCF - DTOS. BELGRANO y FLORES	AYSA	AYSA	5.800	EN EJECUCIÓN		COMPAÑIA SUDAMERICA DE GAS S.A.	41.131.527	450	77%	sep-16	ene-17	
	BARRACAS	EXPANSIÓN	CA70019	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA VILLA 21 - 24 MÓDULO 3	AYSA	A+T	2.848	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA 15 DE OCTUBRE LTDA	6.593.182	360	8%	mar-17	nov-17	
	CABALLITO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	CA70020	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CABALLITO - DRCF DECRETO 220	AYSA	AYSA	4.200	EN EJECUCIÓN		RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.	23.650.354	400	69%	nov-16	ene-17	
VILLA LUGANO	EXPANSIÓN	CA70024	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED DE AGUA - REFUERZO VILLA OLIMPICA	AYSA	AYSA	18.000	EN EJECUCIÓN		APCO S.A.	22.480.334	390	34%	jun-17	ago-17		
TOTAL													93.855.398					
OBRAS EN LICITACIÓN / PRÓXIMAS A LICITAR																		
	BARRACAS	EXPANSIÓN	CA70044	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LAFUENTE	AYSA	AYSA	20.000	EN LICITACIÓN	PARA APERTURA DE SOBRES 02-08-2018		56.870.295	390				
TOTAL													56.870.295					

PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

AGUA POTABLE

REFERENCIAS

-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR

-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG EE Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE






PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18

E. ECHEVERRÍA
AGUA

BARRIO / LOCALIDAD		ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL
RADIO SERVIDO																		
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SA657	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS BARRIO SAN IGNACIO	PROMEBA	PROMEBA		FINALIZADA	EN SERVICIO	-	-	240	100%	-		
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	RP377	A-2-2.2-OB-000-16	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA SANTA CATALINA - ETAPA 1	CAF TRAMO 1	AYSA	30.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	VODATEC S.A.	11.519.664	269	100%	oct-10	nov-10	mar-15
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	UAP010	A-2-2.2-OB-000-15	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	VINCULACIÓN PLANTA SANTA CATALINA - 9 DE ABRIL	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	22.089.169	510	100%	jun-15	ago-15	ago-17
	VARIOS	EXPANSIÓN	SAP012	A-2-2.5-RP-000-1.10	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA BARRIOS DON MARCELO, SANTA ISABEL, ALLA EN EL SUR Y DON MARIANO	AYSA	AYSA	35.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA M Y T S.A.	7.905.674	360	100%	abr-11	jun-11	mar-14
	9 DE ABRIL CIUDAD EVITA (LM)	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA70092	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA REFUERZO B° SAN SEBASTIÁN	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.	13.253.396	332	100%	dic-15	feb-16	nov-16
TOTAL													54.767.903					
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	UAP006	A-2-2.4-OB-000-1.5.2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CONEXIÓN PLANTA LA LATA CON INTERCONEXIÓN DE POZOS	AYSA	AYSA	30.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ENACSAT CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS S.A.	5.140.122	180	100%	may-11	jun-11	ene-14
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SA741	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 6 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. PERF. BARRIOS MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA	AYSA	AYSA	15.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A.	1.241.856	150	100%	oct-13	ene-14	abr-14
	MONTE GRANDE 9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	SA778	A-2-2.4-OB-000-1.5.2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA LA LATA Y 9 DE ABRIL	AYSA	AYSA		FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L.	6.539.167	150	100%	abr-13	abr-13	mar-14
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SA722	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	INTERCONEXIÓN DE POZOS BARRIO MARIANO MORENO Y LA MORITA	AYSA	AYSA	7.500	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	AGUITEC INTERNACIONAL S.A.	10.767.562	150	100%	dic-13	ene-14	ago-14
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA751	A-2-2.4-OB-000-1.4	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 2 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BAT. LA LATA	AYSA	AYSA	5.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A.	418.874	50	100%	oct-13	mar-14	may-14
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA781	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	INTERCONEXIÓN DE POZOS SG08 Y SG09 A BATERÍA LA LATA	AYSA	AYSA	8.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	STHAN S.A.	3.433.186	180	100%	sep-14	nov-14	abr-15
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA667	A-2-2.4-RP-000-2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA MONTE GRANDE II Y III - ETAPA 1	AYSA	AYSA	60.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C	18.388.939	240	100%	jul-13	sep-13	oct-15
	9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	RP378	A-2-2.2-OB-000-16	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 9 DE ABRIL - ETAPA 1	CAF TRAMO 1	AYSA	30.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	AGUAS & PROCESOS S.A.	18.422.583	270	100%	nov-10	dic-10	abr-16
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	RP380	A-2-2.4-OB-000-1.5.2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA LA LATA - ETAPA 1 - PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	CAF TRAMO 1	AYSA	30.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	AGUAS & PROCESOS S.A.	19.230.889	2.629	100%	nov-10	dic-10	ago-17
	9 DE ABRIL	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	UAE001	A-2-2.2-OB-000-15	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REPOTENCIACIÓN CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL	CAF TRAMO 2	AYSA	7.500	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A.	97.664.454	908	100%	jul-15	sep-15	nov-17
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SA730	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO MARIANO MORENO Y LA MORITA	AYSA	AYSA	7.500	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	INSUTE S.A.	11.243.600	391	100%	abr-15	jul-15	oct-16
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SA783	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA MORITA	AYSA	AYSA		FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	POSE S.A.	3.478.091	150	100%	may-16	jul-16	feb-17
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA865	A-2-2.4-RP-000-3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA AGUA MONTE GRANDE II y III - ETAPA II	AYSA	AYSA	23.300	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C	18.896.342	388	100%	jul-15	sep-15	oct-16
	9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	SA70133	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA B° MANZANAR	AYSA	A+T	888	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA	2.697.459	240	100%	dic-16	jul-17	feb-18
TOTAL													217.563.124					
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA840	A-2-2.2-RS-EE-20.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PFV - 1990 VIVIENDAS MONTE GRANDE - P1	PFV	MUNICIPIO		EN EJECUCIÓN		-	-	-	95%	-	abr-10	
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA841	A-2-2.2-RS-EE-20.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PFV - 1990 VIVIENDAS MONTE GRANDE - P3	PFV	MUNICIPIO		EN EJECUCIÓN		-	-	-	90%	-	abr-10	
	9 DE ABRIL MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA842	A-2-2.2-RP-000-20	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	IMPULSIÓN A CISTERNA 9 DE ABRIL	PFV	MUNICIPIO		EN EJECUCIÓN		-	-	-	96%	-	may-10	
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SAE008	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA SAN IGNACIO	PROMEBA	PROMEBA		EN EJECUCIÓN		TERMAIR S.A.	-	240	88%	-		
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SA766	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA	AYSA	AYSA	14.500	EN EJECUCIÓN		POSE S.A.	112.840.157	300	42%	may-16	jul-16	
	EL JAGÜEL	EXPANSIÓN	SA70014	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA DON MARIANO M3	AYSA	A+T	536	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA EL PORVENIR LTDA	1.328.635	360	97%	ene-14	mar-14	
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA70059	A-2-2.4-RS-EE-3.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III - RESTO I	AYSA	AYSA	7.720	EN EJECUCIÓN		BAUBER S.A.	40.611.812	630	75%	dic-16	feb-17	
	MONTE GRANDE	EXPANSIÓN	SA70094	A-2-2.4-RS-EE-3.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III	AYSA	AYSA	7.194	EN EJECUCIÓN		TRAGVIAL S.R.L.	36.124.984	300	60%	abr-17	jun-17	
	9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	SA70134	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA - REFUERZO ING. HUERGO	AYSA	A+T	-	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA	3.558.973	300	92%	oct-16	ene-17	
	9 DE ABRIL	EXPANSIÓN	SA70135	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA REGULARIZACIÓN B° EL GAUCHITO - M1	AYSA	A+T	1.424	CONTRATADA		-	5.921.789	360	0%	ene-18		
VARIOS	EXPANSIÓN	SA70075	A-2-2.2-OB-000-3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - RIO SUBTERRANEO SUR - TRAMO 2 - ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA (EE N°2)	EXTERNO	AYSA	1.444.850	CONTRATADA		ELECTROINGENIERÍA S.A. - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED - UNIÓN TRANSITORIA	3.482.381.276	1.260	0%	sep-17			
TOTAL													3.682.767.626					

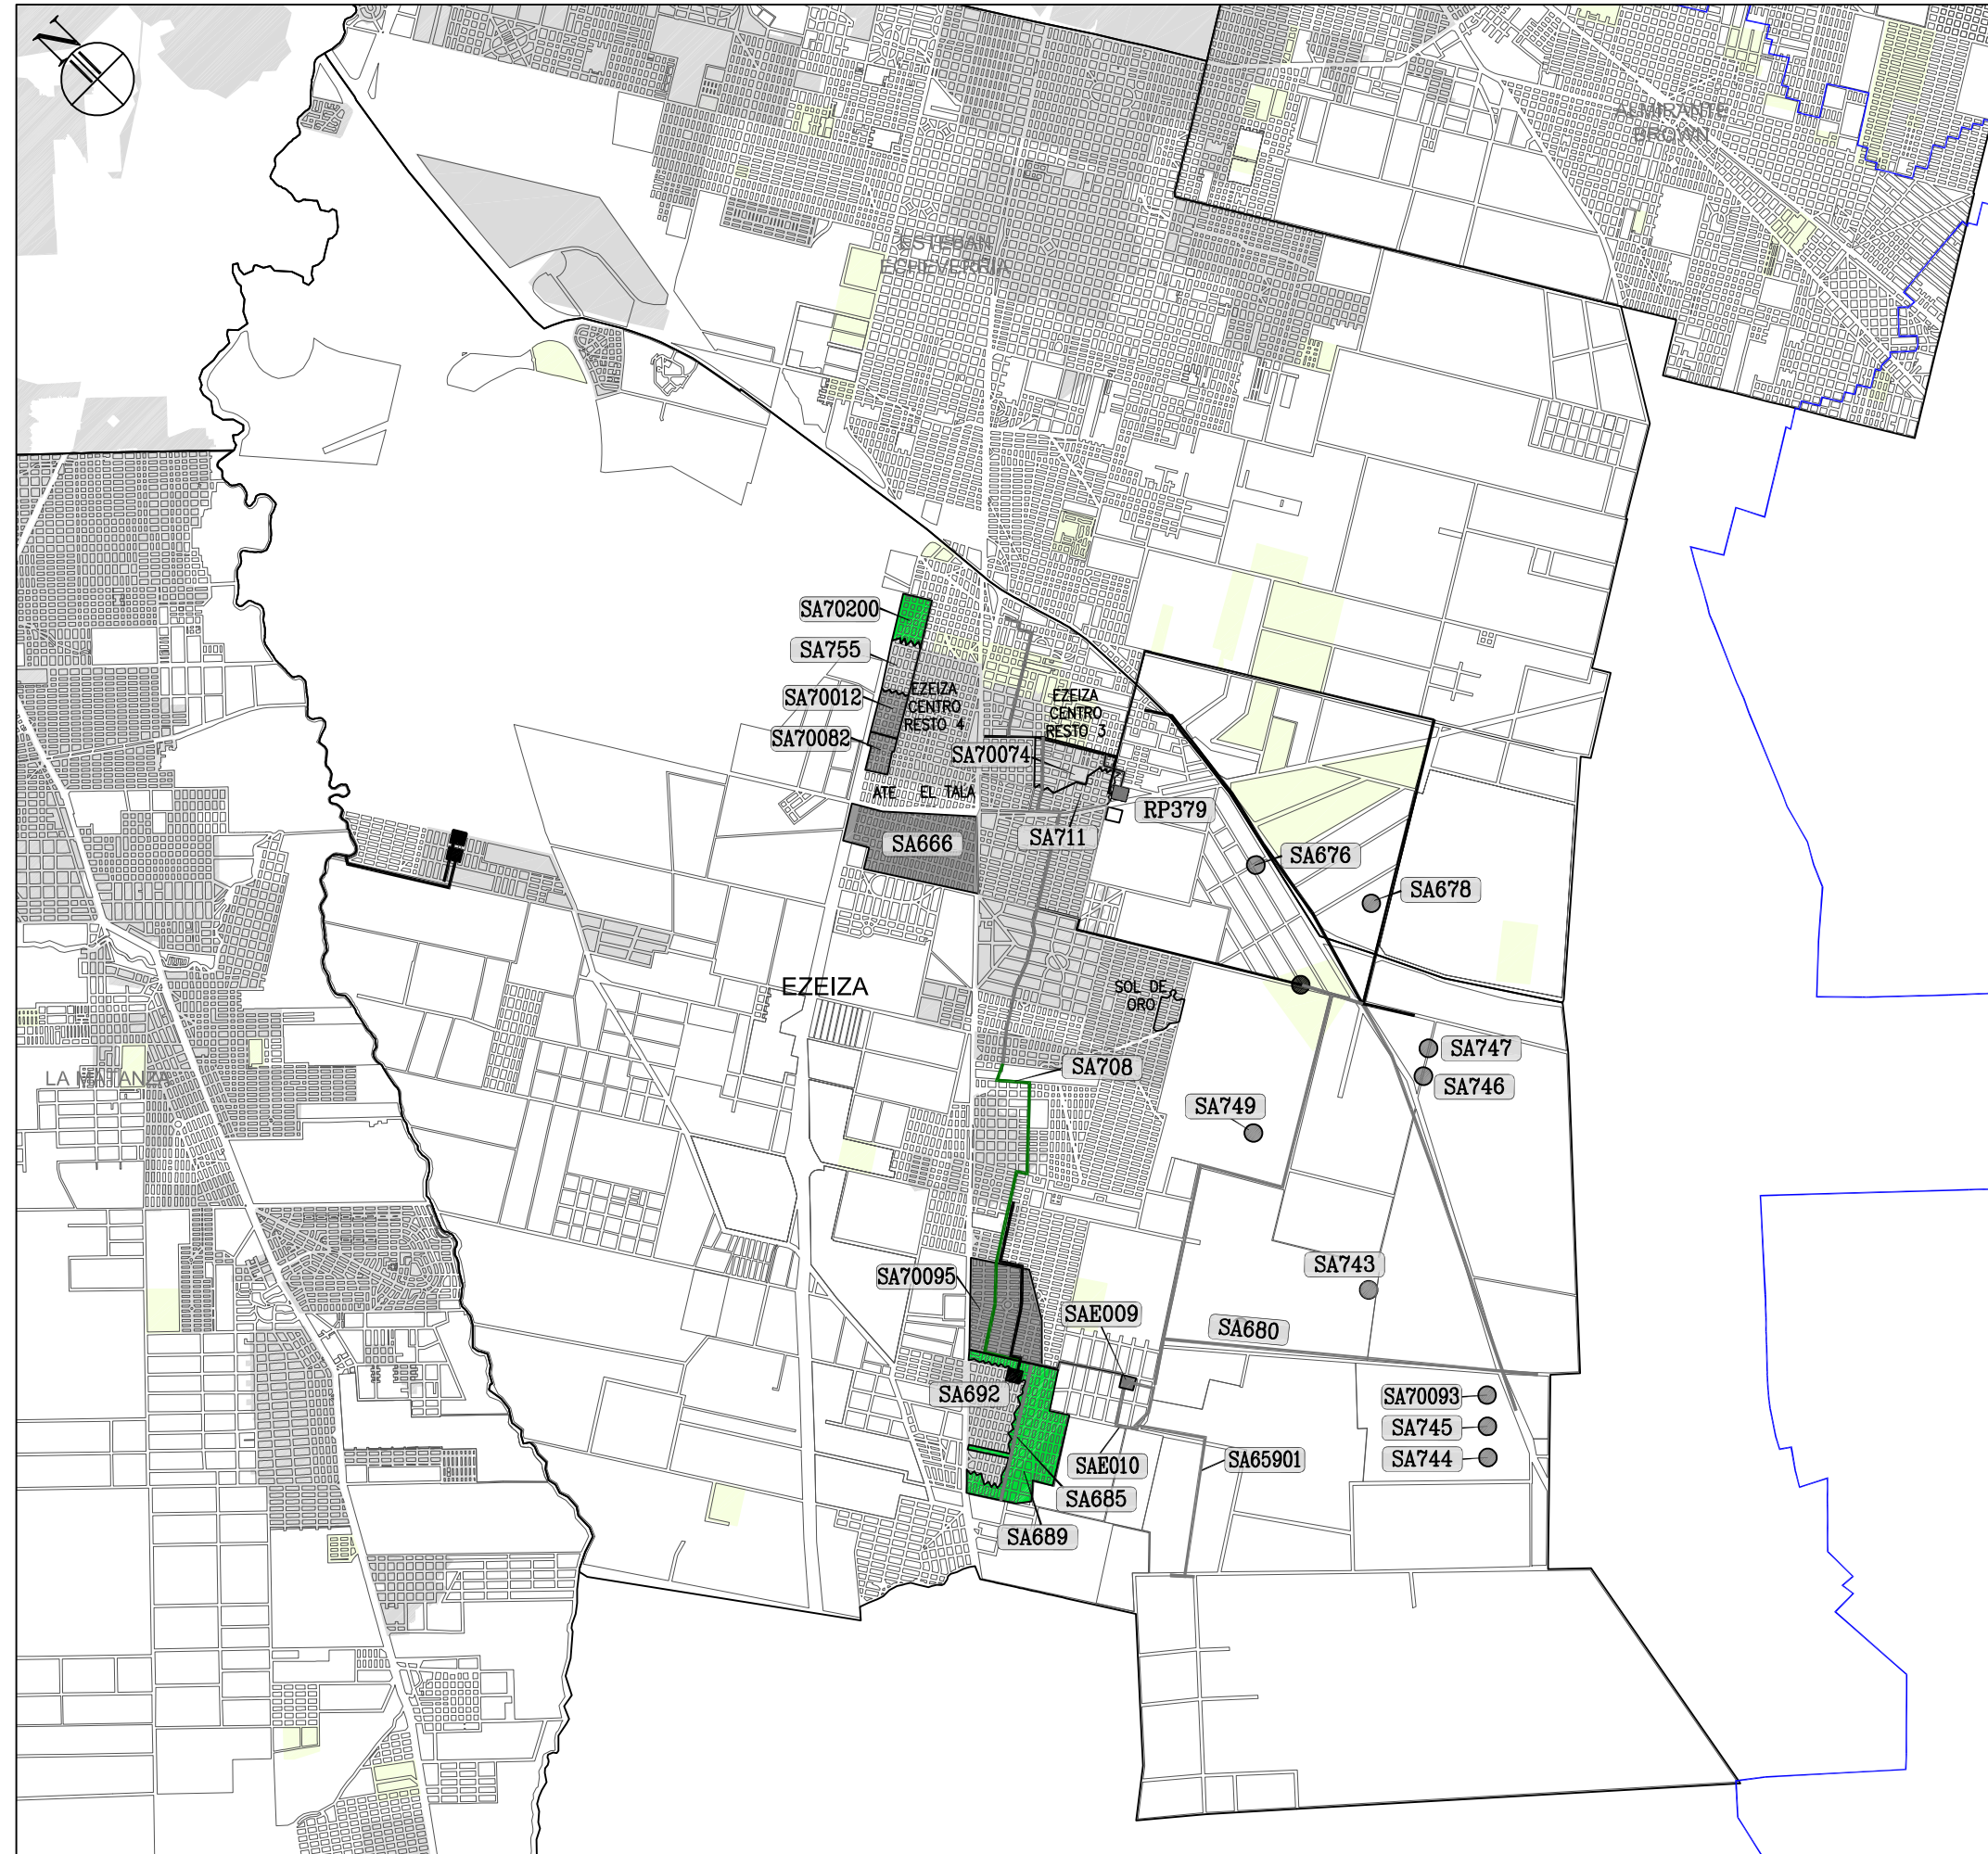

PARTIDO DE EZEIZA

AGUA POTABLE

REFERENCIAS

- RADIO SERVIDO
- NÚMERO DE "P3"
- RED EXISTENTE
- CUENCA MATANZA RIACHUELO
- OBRA BÁSICA
- RED SECUNDARIA

OBRAS:

- FINALIZADAS SIN SERVICIO
- CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
- EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

- PROYECTO REALIZADO
- DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
- DB A ELABORAR

- DESVINCULADOS
- RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
- OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE EZEIZA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG EZE Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE




PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18

EZEIZA

AGUA

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECCIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL	
RADIO SERVIDO																		
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA692	-	AFECCIÓN TOTAL A CMR	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO SPEGAZZINI	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	TECNOLOGÍA DE AGUAS S.A.	1.515.465	120	100%	ago-11	sep-11	mar-14
	EZEIZA	EXPANSIÓN	SA711	-	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA CENTRO RESTO 3 M1	AYSA	A+T	3.414	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA ABRIENDO CAMINOS LTDA	1.497.184	300	100%	oct-12	mar-13	sep-14
	EZEIZA	EXPANSIÓN	SA755	-	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA EZEIZA CENTRO RESTO 4 M1	AYSA	A+T	3.810	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA TALENTO BARRIAL LTDA	1.067.272	240	100%	nov-12	mar-13	feb-16
	EZEIZA	EXPANSIÓN	SA70074	-	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA CENTRO RESTO 3 M2	AYSA	A+T	2.893	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA ABRIENDO CAMINOS LTDA	2.530.290	240	100%	sep-14	ene-16	jun-16
TOTAL												6.610.211						
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
	CANNING	EXPANSIÓN	SA676	A-2-2.5-OB-000-1.2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN 5 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM EN PERF. EXP BAT. UNIÓN - GRUPO 1	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	ARTECO S.A.	947.206	125	61%	oct-12	feb-13	-
	CANNING	EXPANSIÓN	SA678	A-2-2.5-OB-000-1.2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN 6 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM EN PERF. EXP BAT. UNIÓN - GRUPO 2	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	ARTECO S.A.	1.135.036	150	50%	oct-12	abr-13	-
	TRISITÁN SUÁREZ	EXPANSIÓN	SA743	A-2-2.5-OB-000-2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 4 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP BATERÍA EZEIZA GRUPO 1	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	ARTECO S.A.	742.335	100	40%	oct-12	jul-13	-
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA745	A-2-2.5-OB-000-2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 4 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BATERÍA EZEIZA GRUPO 2	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	ARTECO S.A.	742.335	100	45%	oct-12	jul-13	oct-16
	TRISTÁN SUÁREZ	EXPANSIÓN	SA749	A-2-2.5-OB-000-2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 4 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BATERÍA EZEIZA GRUPO 4	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	ARTECO S.A.	742.335	100	20%	oct-12	nov-13	oct-16
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA744	A-2-2.5-OB-000-2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 4 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN BATERÍA EZEIZA - GRUPO 2	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	REYNARD HNOS, JUAN F SOSA, ALICIA BALDONI E HIJOS	1.615.091	75	100%	dic-12	feb-13	ene-14
	TRISITÁN SUÁREZ	EXPANSIÓN	SA746	A-2-2.5-OB-000-2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 4 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN BATERÍA EZEIZA - GRUPO 3	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	REYNARD HNOS, JUAN F SOSA, ALICIA BALDONI E HIJOS	1.676.583	75	100%	dic-12	ago-13	mar-14
	TRISTÁN SUÁREZ / SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA680	A-2-2.5-OB-000-2.3.1	AFECCIÓN TOTAL A CMR	INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA EZEIZA 2" ETAPA	CAF TRAMO 2	AYSA	30.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	93.585.734	400	100%	sep-13	oct-13	ene-15
	CANNING	EXPANSIÓN	RP379	A-2-2.5-OB-000-1.5.1	AFECCIÓN TOTAL A CMR	PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNIÓN - ETAPA 1	CAF TRAMO 1	AYSA	30.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	VODATEC S.A.	12.700.962	269	100%	nov-10	dic-10	mar-15
	TRISTÁN SUÁREZ	EXPANSIÓN	SA747	A-2-2.5-OB-000-2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 4 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BATERÍA EZEIZA GRUPO 3	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A.	1.226.437	100	100%	mar-15	jul-15	sep-15
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SAE010	A-2-2.5-OB-000-2.3.1.1	AFECCIÓN TOTAL A CMR	CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	INSUTE S.A.	6.683.462	180	100%	nov-14	ene-15	dic-15
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA685	A-2-2.5-RP-000-2.4	AFECCIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS EZEIZA - 2" ETAPA	AYSA	AYSA	7.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	AGUITEC INTERNACIONAL S.A.	11.431.434	240	100%	feb-15	abr-15	ene-16
	EZEIZA	EXPANSIÓN	SA70012	-	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA EZEIZA CENTRO RESTO 4 M2	AYSA	A+T	3.290	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA TALENTO BARRIAL LTDA	3.055.015	240	100%	nov-14	may-16	sep-17
	EZEIZA	EXPANSIÓN	SA70082	-	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA EZEIZA CENTRO RESTO 4 M3	AYSA	A+T	1.884	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA ABRIENDO CAMINOS LTDA	2.390.470	210	100%	jul-16	ene-17	nov-17
	SPEGAZZINI TRISTÁN SUAREZ	EXPANSIÓN	SA70093	A-2-2.5-OB-000-2.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	EJECUCIÓN DE 4 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BAT. EZEIZA - REMANENTE GRUPO 2 y 4	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A.	2.101.650	90	100%	jun-16	ago-16	oct-16
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA70095	A-2-2.5-RS-EZ-2.4.1	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA EZEIZA 2 - ETAPA 1	AYSA	AYSA	8.557	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	APCO S.A.	50.401.289	420	100%	dic-16	ene-17	mar-18
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA65901	A-2-2.5-OB-000-2.3.1	AFECCIÓN TOTAL A CMR	INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA EZEIZA 1" ETAPA	CAF TRAMO 2	AYSA	30.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	55.712.664	350	100%	mar-15	may-15	sep-16
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SAE009	A-2-2.5-OB-000-2.3.1.1	AFECCIÓN TOTAL A CMR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO POR ADSORCIÓN BATERÍA EZEIZA	CAF TRAMO 2	AYSA	35.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	LIHUÉ INGENIERÍA S.A.	250.473.122	1.248	100%	abr-14	may-14	oct-17
	LA UNIÓN	EXPANSIÓN	SA666	A-2-2.5-RS-EZ-2.4.3	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA JAGÜEL A	AYSA	AYSA	19.600	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CETACO S.A. - APCO S.A. - U.T.E.	65.770.701	330	100%	feb-15	abr-15	dic-16
TOTAL												563.133.860						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
	TRISTÁN SUÁREZ / SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA708	A-2-2.5-RP-000-2.4	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA EZEIZA ETAPA 3	AYSA	AYSA	30.000	EN EJECUCIÓN		GADES S.A.	60.176.418	420	68%	feb-17	mar-17	
	SPEGAZZINI	EXPANSIÓN	SA689	A-2-2.5-RS-EZ-2.4.4	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA EZEIZA 2A	AYSA	AYSA	16.300	EN EJECUCIÓN		EDISUD S.A. - ACRI CONSTRUCCIONES S.A. EZEIZA - UNIÓN TRANSITORIA	43.913.245	330	0%	dic-17	ene-18	
	EZEIZA	EXPANSIÓN	SA70200	-	AFECCIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA BARRIO ALFONSINA STORNI	AYSA	A+T	2.648	CONTRATADA		-	6.431.848	540	0%	ene-18		
TOTAL												110.521.511						

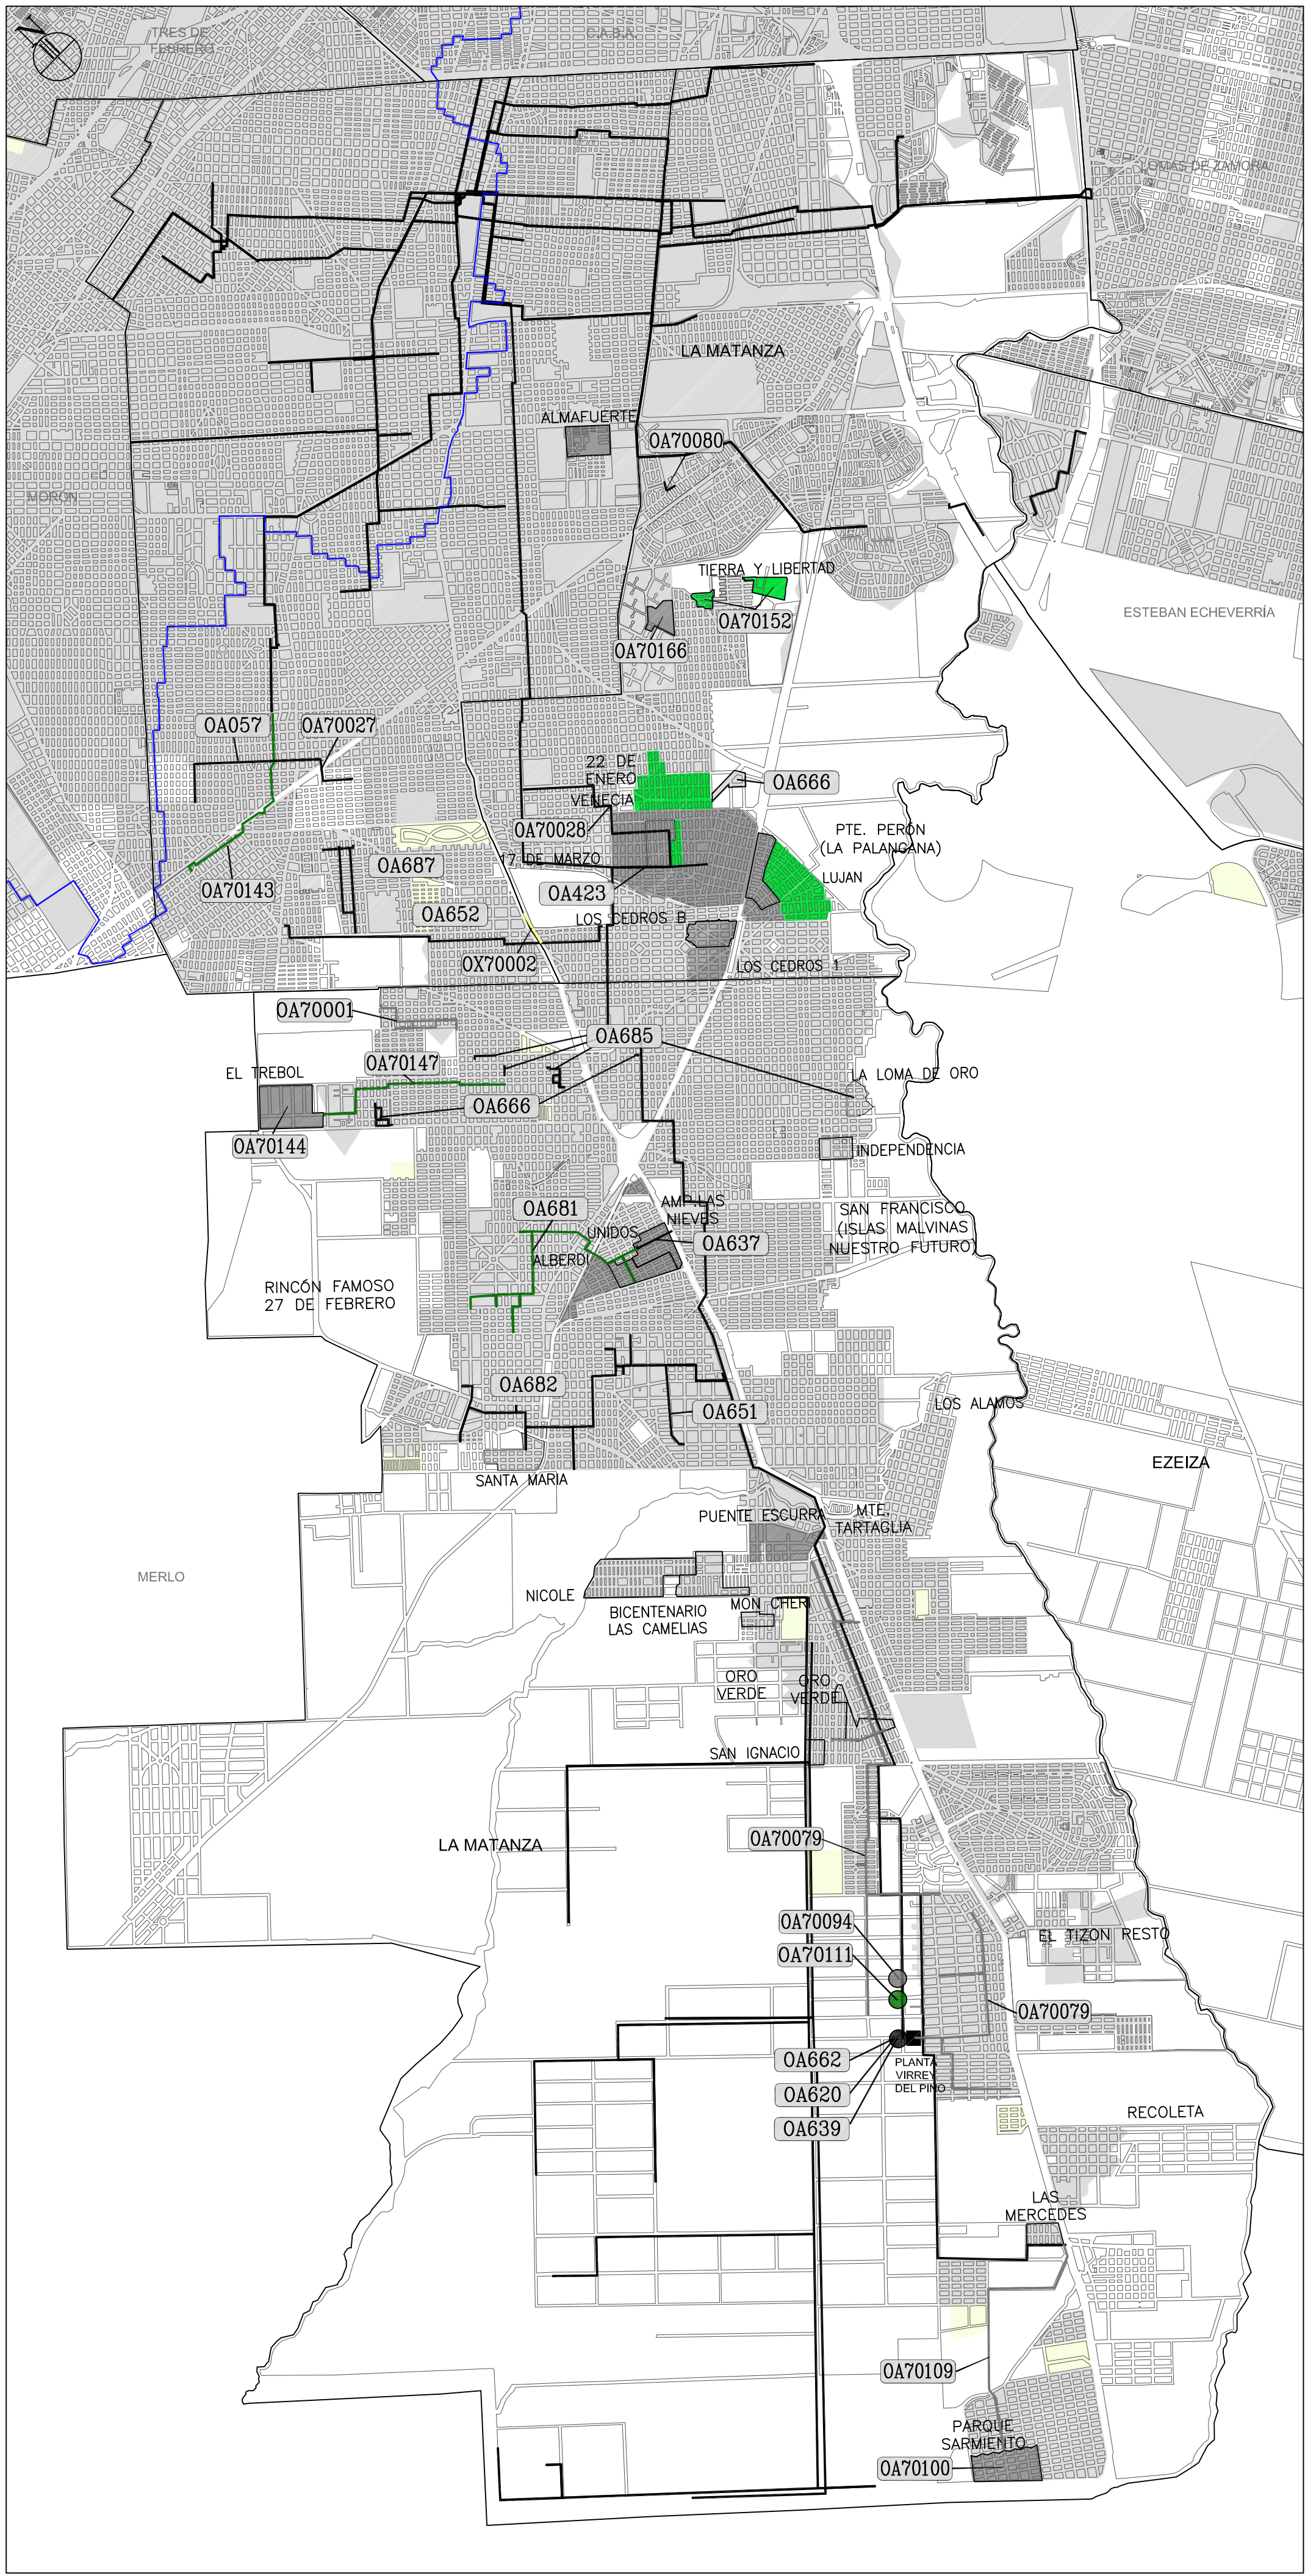

PARTIDO DE LA MATANZA

AGUA POTABLE

REFERENCIAS

- RADIO SERVIDO
- NÚMERO DE "P3"
- RED EXISTENTE
- CUENCA MATANZA RIACHUELO
- OBRA BÁSICA
- RED SECUNDARIA

OBRAS:

- FINALIZADAS SIN SERVICIO
- CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
- EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

- PROYECTO REALIZADO
- DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
- DB A ELABORAR

- DESVINCULADOS
- RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
- OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE LA MATANZA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG LM Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE



PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL	
RADIO SERVIDO																		
	LAFERRERE	EXPANSIÓN	OA423	A-1-1.3-RP-000-45	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS LOS CEDROS B	AYSA	AYSA	20.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	IN.PA.CO. S.A.	5.469.136	270	100%	nov-10	dic-10	sep-14
	VIRREY DEL PINO	EXPANSIÓN	OA639	A-1-1.3-OB-000-37	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CENTRO DE CONTROL DE PLANTA VIRREY DEL PINO	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	DAMEZ ELECTRÓNICA PROFESIONAL S.R.L.	1.178.441	60	100%	sep-11	oct-11	mar-14
	GONZÁLEZ CATÁN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA651	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SAN ENRIQUE	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	SADEMEC S.A.	14.865.894	210	100%	jul-13	ago-13	mar-14
	RAFAEL CASTILLO LAFERRERE ISIDRO	EXPANSIÓN	OA666	A-1-1.3-RP-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA - INCLUYE VINCULACIÓN POZOS LMO 068 - LMO 062; VINCULACIÓN BATERÍA GIARDINO CON PRIMARIA OA 483 Y SECTORES	AYSA	A+T	345	FINALIZADA	EN SERVICIO	BARRIOS UNIDOS LTDA	572.419	180	100%	may-12	jun-12	dic-12
	RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OA687	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA VINCULACIÓN POZOS LMN173; LMN034 Y LMN036 Y REFUERZO IMPULSIÓN CATAN III	AYSA	A+T	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA EL TRIUNFO LTDA.	1.122.129	240	100%	oct-12	dic-12	ago-13
	GONZÁLEZ CATAN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA637	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES	AYSA	AYSA	17.143	FINALIZADA	EN SERVICIO	RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.	5.993.550	240	100%	sep-12	nov-12	jul-14
	LAFERRERE	EXPANSIÓN	OA70028	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS LOS CEDROS B - ETAPA 2	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	SADEMEC S.A.	14.499.201	150	100%	mar-14	abr-14	sep-14
	VIRREY DEL PINO	EXPANSIÓN	OA620	A-1-1.3-OB-000-37	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	AGUAS & PROCESOS S.A.	4.005.832	450	100%	abr-11	may-11	sep-14
	VIRREY DEL PINO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA662	A-1-1.3-OB-000-37	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO. MEDICIÓN DE CAUDAL DE RECHAZO Y TOMA DE MUESTRAS. TABLERO DE CALIDAD	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	VODATEC S.A.	1.996.983	90	100%	mar-13	may-13	abr-15
	LAFERRERE RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OA652	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA RAFAEL CASTILLO	AYSA	AYSA	30.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	94.974.037	300	100%	jul-14	oct-14	ago-15
	ISIDRO CASANOVA	EXPANSIÓN	OA70027	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS CASTILLO - CRISTANÍA - ETAPA 2	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	CHAMBEO S.A.	7.714.013	90	100%	abr-14	jun-14	oct-15
	CIUDAD EVITA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA70080	A-2-2.2-OB-000-2.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO TANQUE EL TIBURÓN	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	BERENGUEL S.A.	4.855.397	273	100%	oct-16	dic-16	nov-17
	GONZÁLEZ CATAN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA682	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SAN ENRIQUE - E II	AYSA	AYSA	25.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	SADEMEC S.A.	52.371.453	310	100%	jun-16	jun-16	mar-18
	LAFERRERE	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA685	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	VINCULACIONES Y MEJORA DE POZOS - LOMA DE ORO	AYSA	A+T	630	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA.	1.261.420	240	100%	ene-13	ene-13	abr-14
	ISIDRO CASANOVA RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OA057	A-1-1.3-RP-000-45	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PRIMARIAS CASTILLO - CRISTANIA	AYSA	AYSA	47.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	FUSIÓN OPERACIONES ESPECIALES S.A.	6.636.444	180	100%	nov-10	feb-11	oct-15
	TOTAL												217.516.348					
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
	RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OA70001	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	VINCULACION POZOS LMO77-LMO65-LMO88	AYSA	A+T	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPETARIVA EL TRIUNFO LTDA.	954.703	240	100%	feb-14	abr-14	nov-14
	VIRREY DEL PINO	EXPANSIÓN	OA70079	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA VIRREY DEL PINO II	AYSA	AYSA	40.000	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A.	43.163.593	240	100%	sep-16	sep-16	jul-17
	VIRREY DEL PINO	EXPANSIÓN	OA70094	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN HIPOPUELCHE. PLANTA OSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	AGUAS CORLETTI S.R.L.	2.103.106	240	100%	-	-	ago-17
	VIRREY DEL PINO	EXPANSIÓN	OA70109	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN PARQUE SARMIENTO	AYSA	A+T		FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA 8 DE OCTUBRE LTDA	6.873.449	330	100%	jun-16	jul-16	oct-17
	VIRREY DEL PINO	EXPANSIÓN	OA70100	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M3	AYSA	A+T	1.778	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA INDEPENDENCIA II LTDA	3.354.880	450	100%	jul-16	ago-16	abr-17
	RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OA70144	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TREBOL	AYSA	A+T	2.192	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA	4.166.923	540	100%	may-17	ago-17	mar-18
	CIUDAD EVITA	EXPANSIÓN	OA70166	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA BARRIO 21 DE MARZO	AYSA	A+T	1.624	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA	2.241.699	300	100%	jun-17	ago-17	mar-18
TOTAL												62.858.352						
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
	GONZÁLEZ CATAN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA681	A-1-1.3-OB-000-45.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II	AYSA	AYSA	17.500	EN EJECUCIÓN		GADES S.A.	45.450.546	390	45%	oct-16	nov-16	
	VIRREY DEL PINO	EXPANSIÓN	OA70111	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CISTERNA PLANTA VIRREY DEL PINO	AYSA	AYSA	168.000	EN EJECUCIÓN		LIHUÉ INGENIERÍA S.A.	118.358.570	270	0%	dic-17	abr-18	
	RAFAEL CASTILLO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OA70143	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO DE CALIDAD RAFAEL CASTILLO - POZOS MN186 Y MN110	AYSA	AYSA	7.270	EN EJECUCIÓN		RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.	14.943.604	270	35%	jul-17	nov-17	
	RAFAEL CASTILLO	EXPANSIÓN	OA70147	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN B° EL TREBOL	AYSA	A+T	-	EN EJECUCIÓN		COOPERATIVA 7 DE MAYO LTDA	6.463.430	365	89%	mar-17	may-17	
	CIUDAD EVITA	EXPANSIÓN	OA70152	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD	AYSA	A+T	1.786	CONTRATADA		-	2.359.591	300	0%	jun-17		
TOTAL												187.575.741						
OBRAS EN LICITACIÓN / PRÓXIMAS A LICITAR																		
	RAFAEL CASTILLO LAFERRERE	EXPANSIÓN	OX70002	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REDES SECUNDARIAS A HOSPITALES LAFERRERE Y RAFAEL CASTILLO	AYSA	AYSA		EN LICITACIÓN	PARA APERTURA DE SOBRES 12-07-2018		4.564.151	180				
TOTAL												4.564.151						

PARTIDO DE LANÚS
AGUA POTABLE

REFERENCIAS

- RADIO SERVIDO
- NN000 NÚMERO DE "P3"
- RED EXISTENTE
- CUENCA MATANZA RIACHUELO
- OBRA BÁSICA
- RED SECUNDARIA

OBRAS:

- FINALIZADAS SIN SERVICIO
- CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
- EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR


DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

- PROYECTO REALIZADO
- DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
- DB A ELABORAR
- DESVINCULADOS
- RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
- OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE LANÚS

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG LAN Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE

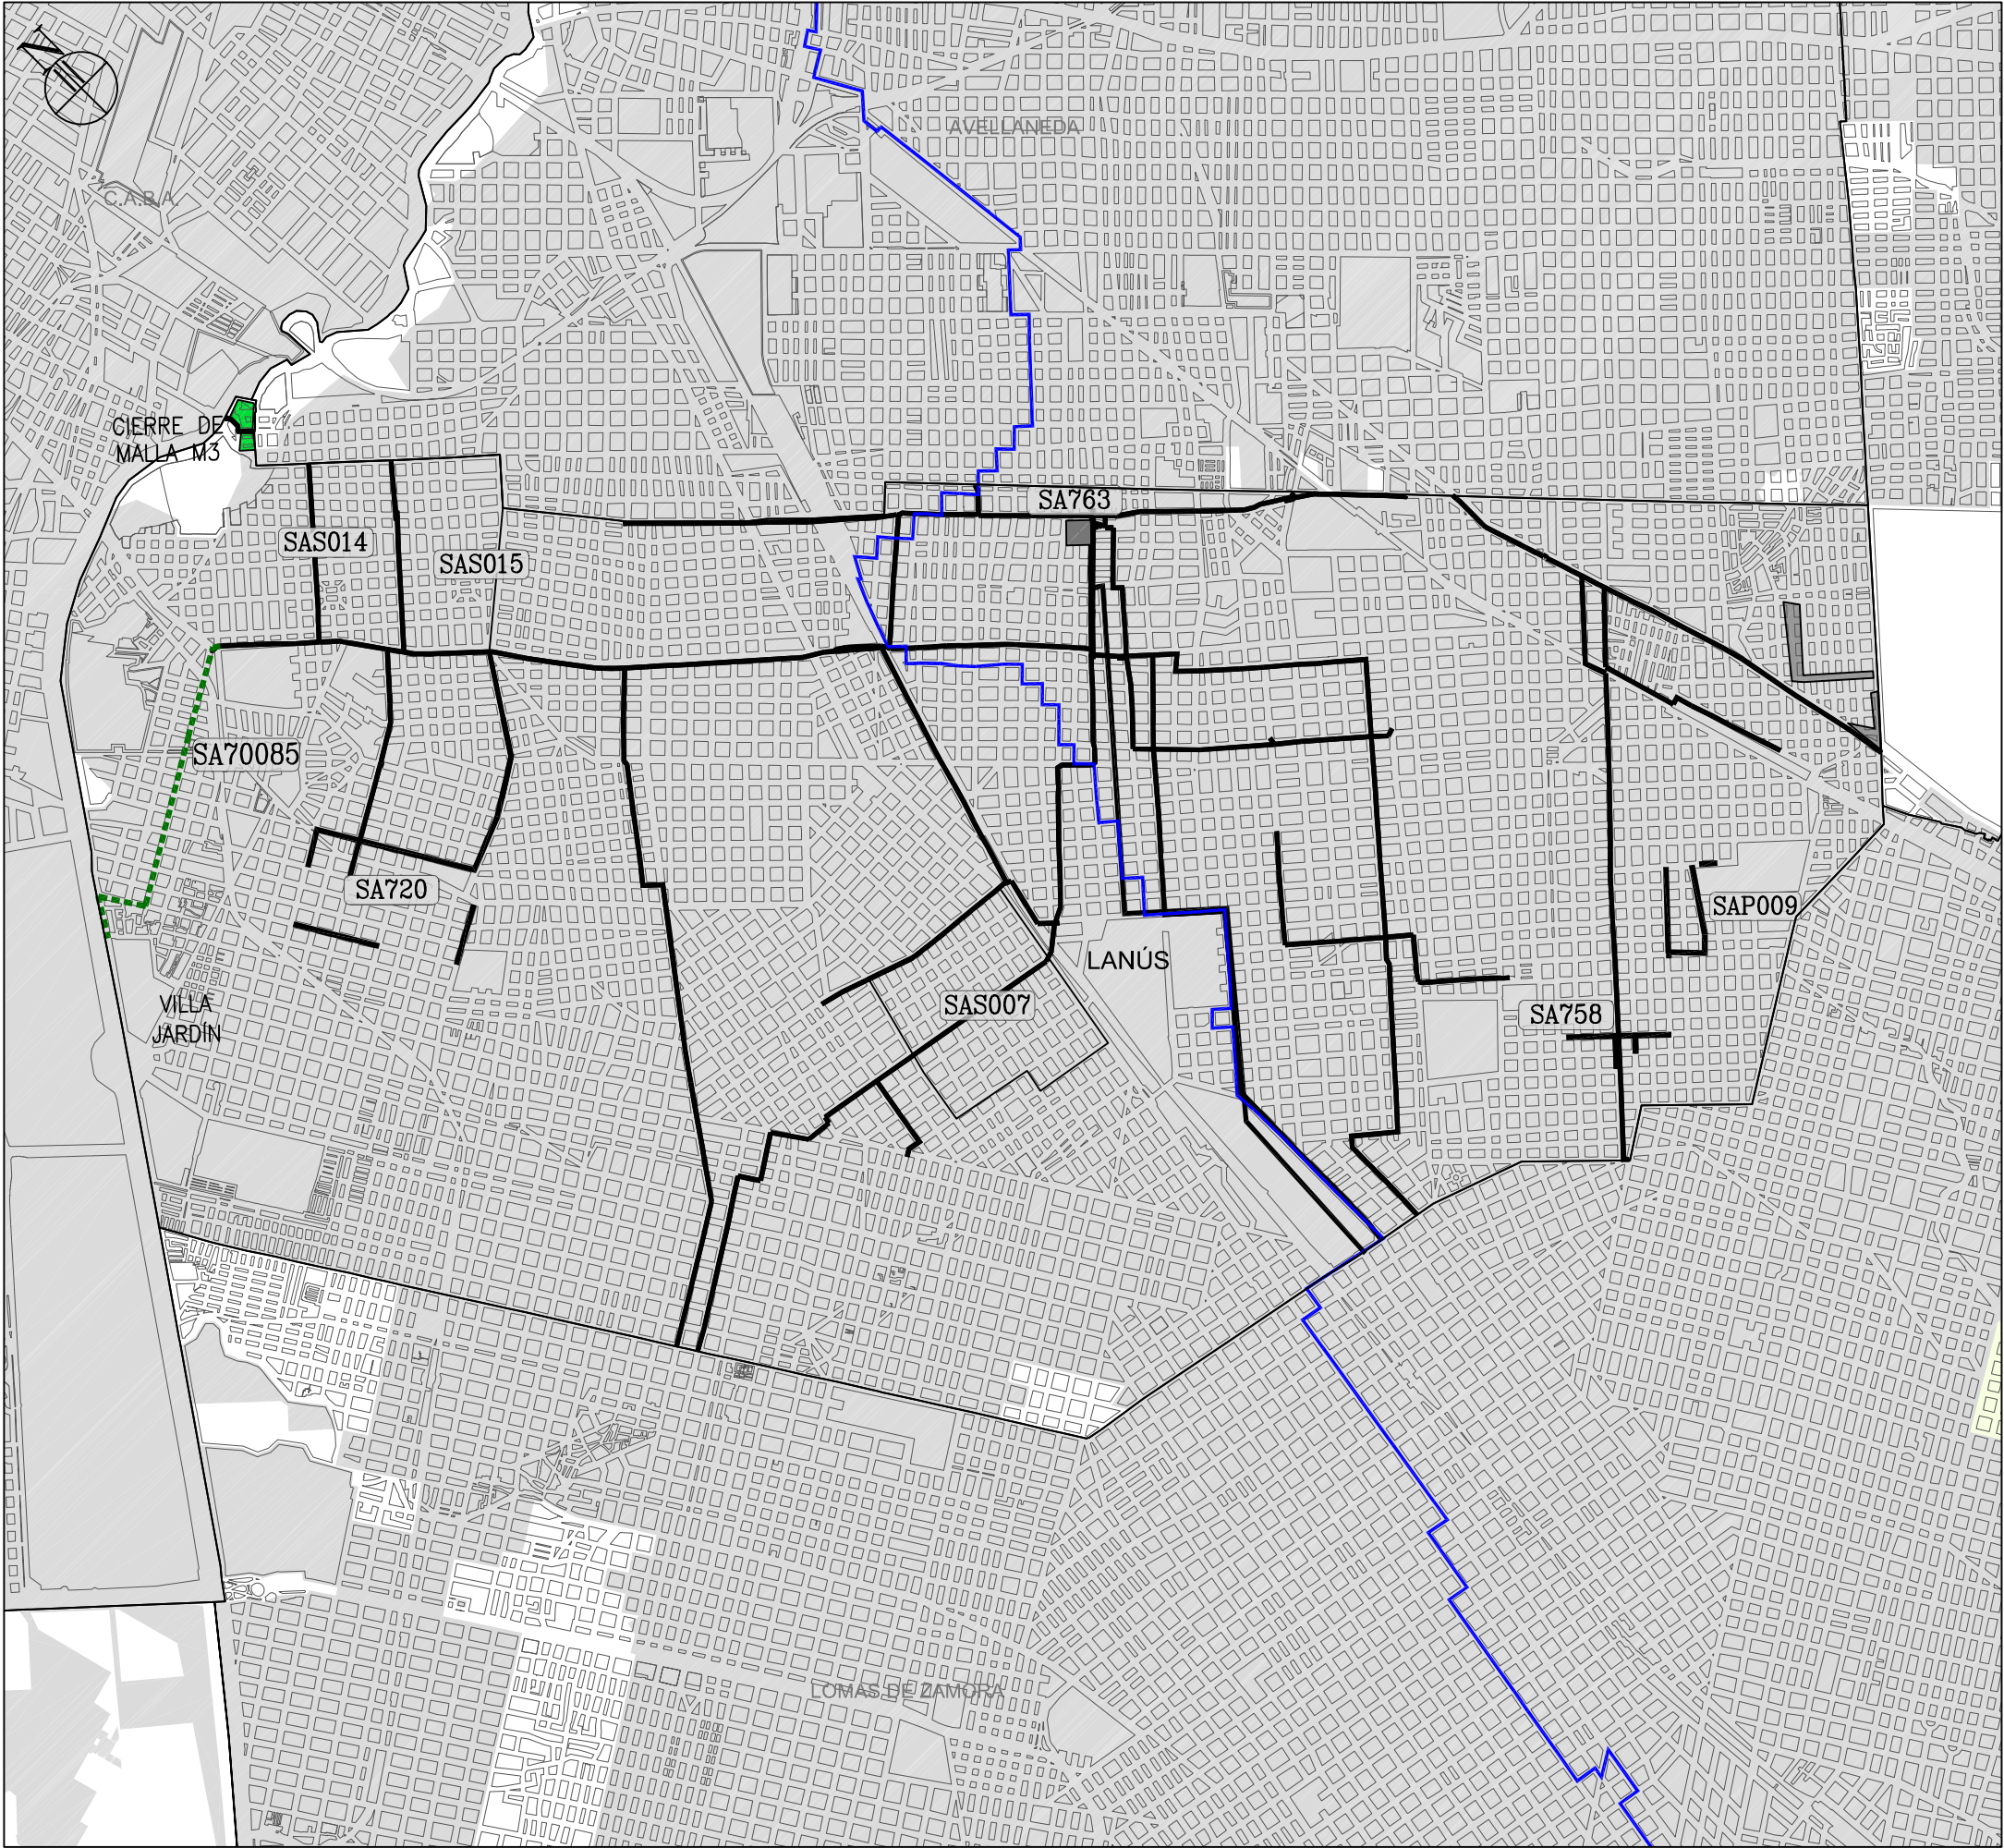



PROYECTOS Y OBRAS AySA



Estado al 30/06/18

BARRIO / LOCALIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL
RADIO SERVIDO																	
MONTE CHINGOLO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA758	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA - REFUERZO ALBARIÑOS	AYSA	AYSA	256	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPANÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	2.357.383	85	100%	jul-13	ago-13	feb-14
MONTE CHINGOLO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SAP009	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	REFUERZO CONDARCO ETAPA 2	AYSA	AYSA	328	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPANÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	2.046.594	90	100%	jul-13	ago-13	ene-14
VALENTÍN ALSINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SAS015	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS - VALENTÍN ALSINA - ETAPA 3	BID 2 TRAMO 2	AYSA	6.120	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPANÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. - C & E CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E.	19.809.177	260	100%	jun-13	ago-13	sep-14
VALENTÍN ALSINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SAS014	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS - VALENTÍN ALSINA - ETAPA 2	BID 2 TRAMO 2	AYSA	5.756	FINALIZADA	EN SERVICIO	MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A.	16.624.412	200	100%	may-13	jul-13	nov-14
LANÚS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SAS007	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS OESTE CENTRO	AYSA	AYSA	10.892	FINALIZADA	EN SERVICIO	FUSIÓN OPERACIONES ESPECIALES S.A.	15.285.602	600	100%	nov-10	ene-11	oct-16
VALENTÍN ALSINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA720	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA REFUERZO RUCCI - COMPLEMENTO	AYSA	AYSA	2.108	FINALIZADA	EN SERVICIO	ELECNR DE ARGENTINA S.A.	9.648.994	150	100%	jul-13	sep-13	dic-14
TOTAL												65.772.161					
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																	
LANÚS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA763	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	EMPALME ESTACIÓN ELEVADORA LANÚS CON ACUEDUCTO DN 1000 LANÚS - TEMPERLEY	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	STHAN S.A.	4.551.849	120	100%	feb-13	may-13	nov-15
TOTAL												4.551.849					
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																	
VALENTÍN ALSINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA70085		AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO VILLA JARDÍN	MUNICIPIO	MUNICIPIO	10.500	EN EJECUCIÓN		-	-	-	95%	-	-	
TOTAL												-					

PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA

AGUA POTABLE

REFERENCIAS

-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR

-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG LZ Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA
AGUA POTABLE



PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18


LOMAS DE ZAMORA

AGUA

BARRIO / LOCALIDAD		ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO (C/IVA)	PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL
RADIO SERVIDO																		
	LOMAS DE ZAMORA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA769	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CALLE LAPRIDA - TEMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA - ETAPA 2	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	XAPOR S.A.	3.304.505	100	100%	abr-13	jun-13	mar-14
	LOMAS DE ZAMORA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA716	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CALLE PEREYRA LUCENA - TEMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	INSUTE S.A.	6.096.223	120	100%	ene-13	abr-13	may-14
	LOMAS DE ZAMORA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA715	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CALLE LAS HERAS - TEMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	XAPOR S.A.	5.504.492	120	100%	abr-13	jun-13	jun-14
	TEMPERLEY	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA713	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LA PERLA - SAN JOSÉ - TEMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	CETACO S.A.	17.635.877	230	100%	feb-13	abr-13	oct-14
	BANFIELD	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA067	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RENOVACIÓN MALLA 68 LOMAS DE ZAMORA	BID 2 TRAMO 1	AYSA	2.204	FINALIZADA	EN SERVICIO	P.C.C. S.R.L.	4.276.016	150	100%	may-10	sep-10	oct-16
	VILLA ALBERTINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA498	A-2-2.2-RP-000-11.1	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REFUERZO VILLA ALBERTINA 1A - ETAPA 1	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN SERVICIO	FUSIÓN OPERACIONES ESPECIALES S.A.	382.522	60	100%	nov-07	ene-08	mar-16
	VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SA669	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA BARRIO MIRÓ M1	AYSA	A+T	4.698	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA AGOSTO LTDA	1.039.073	180	100%	ene-11	ene-11	may-12
	VILLA FIORITO	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA70089	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CAPITAL FIORITO TRAMO 2	AYSA	AYSA	24.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	ORESTE DURANTE S.A.	75.756.881	408	100%	dic-15	feb-16	sep-17
	VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SA70128	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LIBRE AMANECEER	AYSA	A+T	1.956	FINALIZADA	EN SERVICIO	COOPERATIVA CATALINA LTDA	3.252.273	360	100%	jul-16	nov-16	jul-17
	VIARIOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	VA70004	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CAPITAL FIORITO - TRAMO 1	AYSA	AYSA	24.000	FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	89.668.046	715	100%	ago-15	oct-15	oct-17
TOTAL													206.915.910					
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
	LOMAS DE ZAMORA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	SA661	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	VÁLVULA REGULADORA A PLANTA 9 DE ABRIL	AYSA	AYSA	-	FINALIZADA	EN FORMA PARCIAL	ARTECO S.A.	1.539.609	150	28%	sep-12	ene-13	-
	VILLA FIORITO	EXPANSIÓN	SA70129	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA BARRIOS LA LONJA Y 2 DE MAYO	AYSA	A+T	892	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	COOPERATIVA CATALINA LTDA	3.819.389	270	100%	jul-17	sep-17	ene-18
	VILLA ALBERTINA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	UAP009	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	REFUERZO VILLA ALBERTINA 1A - ETAPA 2	AYSA	A+T	-	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	TORASSO CONSTRUCCIONES S.R.L. - CYCO ASOCIADOS S.A.	1.028.645	60	100%	abr-11	jun-11	feb-13
TOTAL													6.387.643					
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
	VILLA ALBERTINA	EXPANSIÓN	SA731	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CAMARA REGULADORA REFUERZO BRIGADIER ROSAS	AYSA	AYSA	24.000	EN EJECUCIÓN		EMICO S.A.	6.652.602	270	47%	sep-16	nov-16	
	VILLA ALBERTINA	EXPANSIÓN	SA70070	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CAMARA REGULADORA CALLE GARCIA DE LOYOLA	AYSA	AYSA	53.000	EN EJECUCIÓN		EMICO S.A.	7.482.047	270	39%	sep-16	nov-16	
	LOMAS DE ZAMORA	EXPANSIÓN	SA70062	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CAMARA REGULADORA CALLE URUNDAY	AYSA	AYSA	58.800	EN EJECUCIÓN		EMICO S.A.	7.128.559	270	33%	sep-16	nov-16	
	VIARIOS	EXPANSIÓN	VX70003	-	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL Y VÁLVULAS REGULADORAS	AYSA	AYSA	-	EN EJECUCIÓN		APCO S.A.	52.892.328	270	87%	sep-16	nov-16	
	VILLA ALBERTINA	EXPANSIÓN	SA70058	-	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	CAMARA REGULADORA REFUERZO BARRIO SANTA CATALINA	AYSA	AYSA	22.500	EN EJECUCIÓN		EMICO S.A.	8.024.054	270	38%	sep-16	nov-16	
	VIARIOS	EXPANSIÓN	SA70075	A-2-2.2-OB-000-3	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA - RIO SUBTERRANEO SUR - TRAMO 2 - ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA (EE N°2)	EXTERNO	AYSA	1.444.850	CONTRATADA		ELECTROINGENIERIA S.A. - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED - UNION TRANSITORIA/	3.482.381.276	1.260	0%	sep-17		
TOTAL													3.564.560.866					

PARTIDO DE MORÓN
AGUA POTABLE

REFERENCIAS



-  RADIO SERVIDO
-  NÚMERO DE "P3"
-  RED EXISTENTE
-  CUENCA MATANZA RIACHUELO
-  OBRA BÁSICA
-  RED SECUNDARIA

OBRAS:

-  FINALIZADAS SIN SERVICIO
-  CONTRATADO/EN EJECUCIÓN
-  EN LICITACIÓN/PROX A LICITAR

DISEÑOS BÁSICOS / PROYECTOS

-  PROYECTO REALIZADO
-  DB/ PROYECTO EN ELABORACIÓN
-  DB A ELABORAR


-  DESVINCULADOS
-  RESTO (ÁREA EN EXPANSIÓN)
-  OBRAS OPCT / OTROS ORGANISMOS

PARTIDO DE MORÓN

FECHA DE CIERRE: 30/06/2018
CÓDIGO ARCHIVO: DG MOR Agua 06.18

PROYECTOS Y OBRAS AYSA

AGUA POTABLE

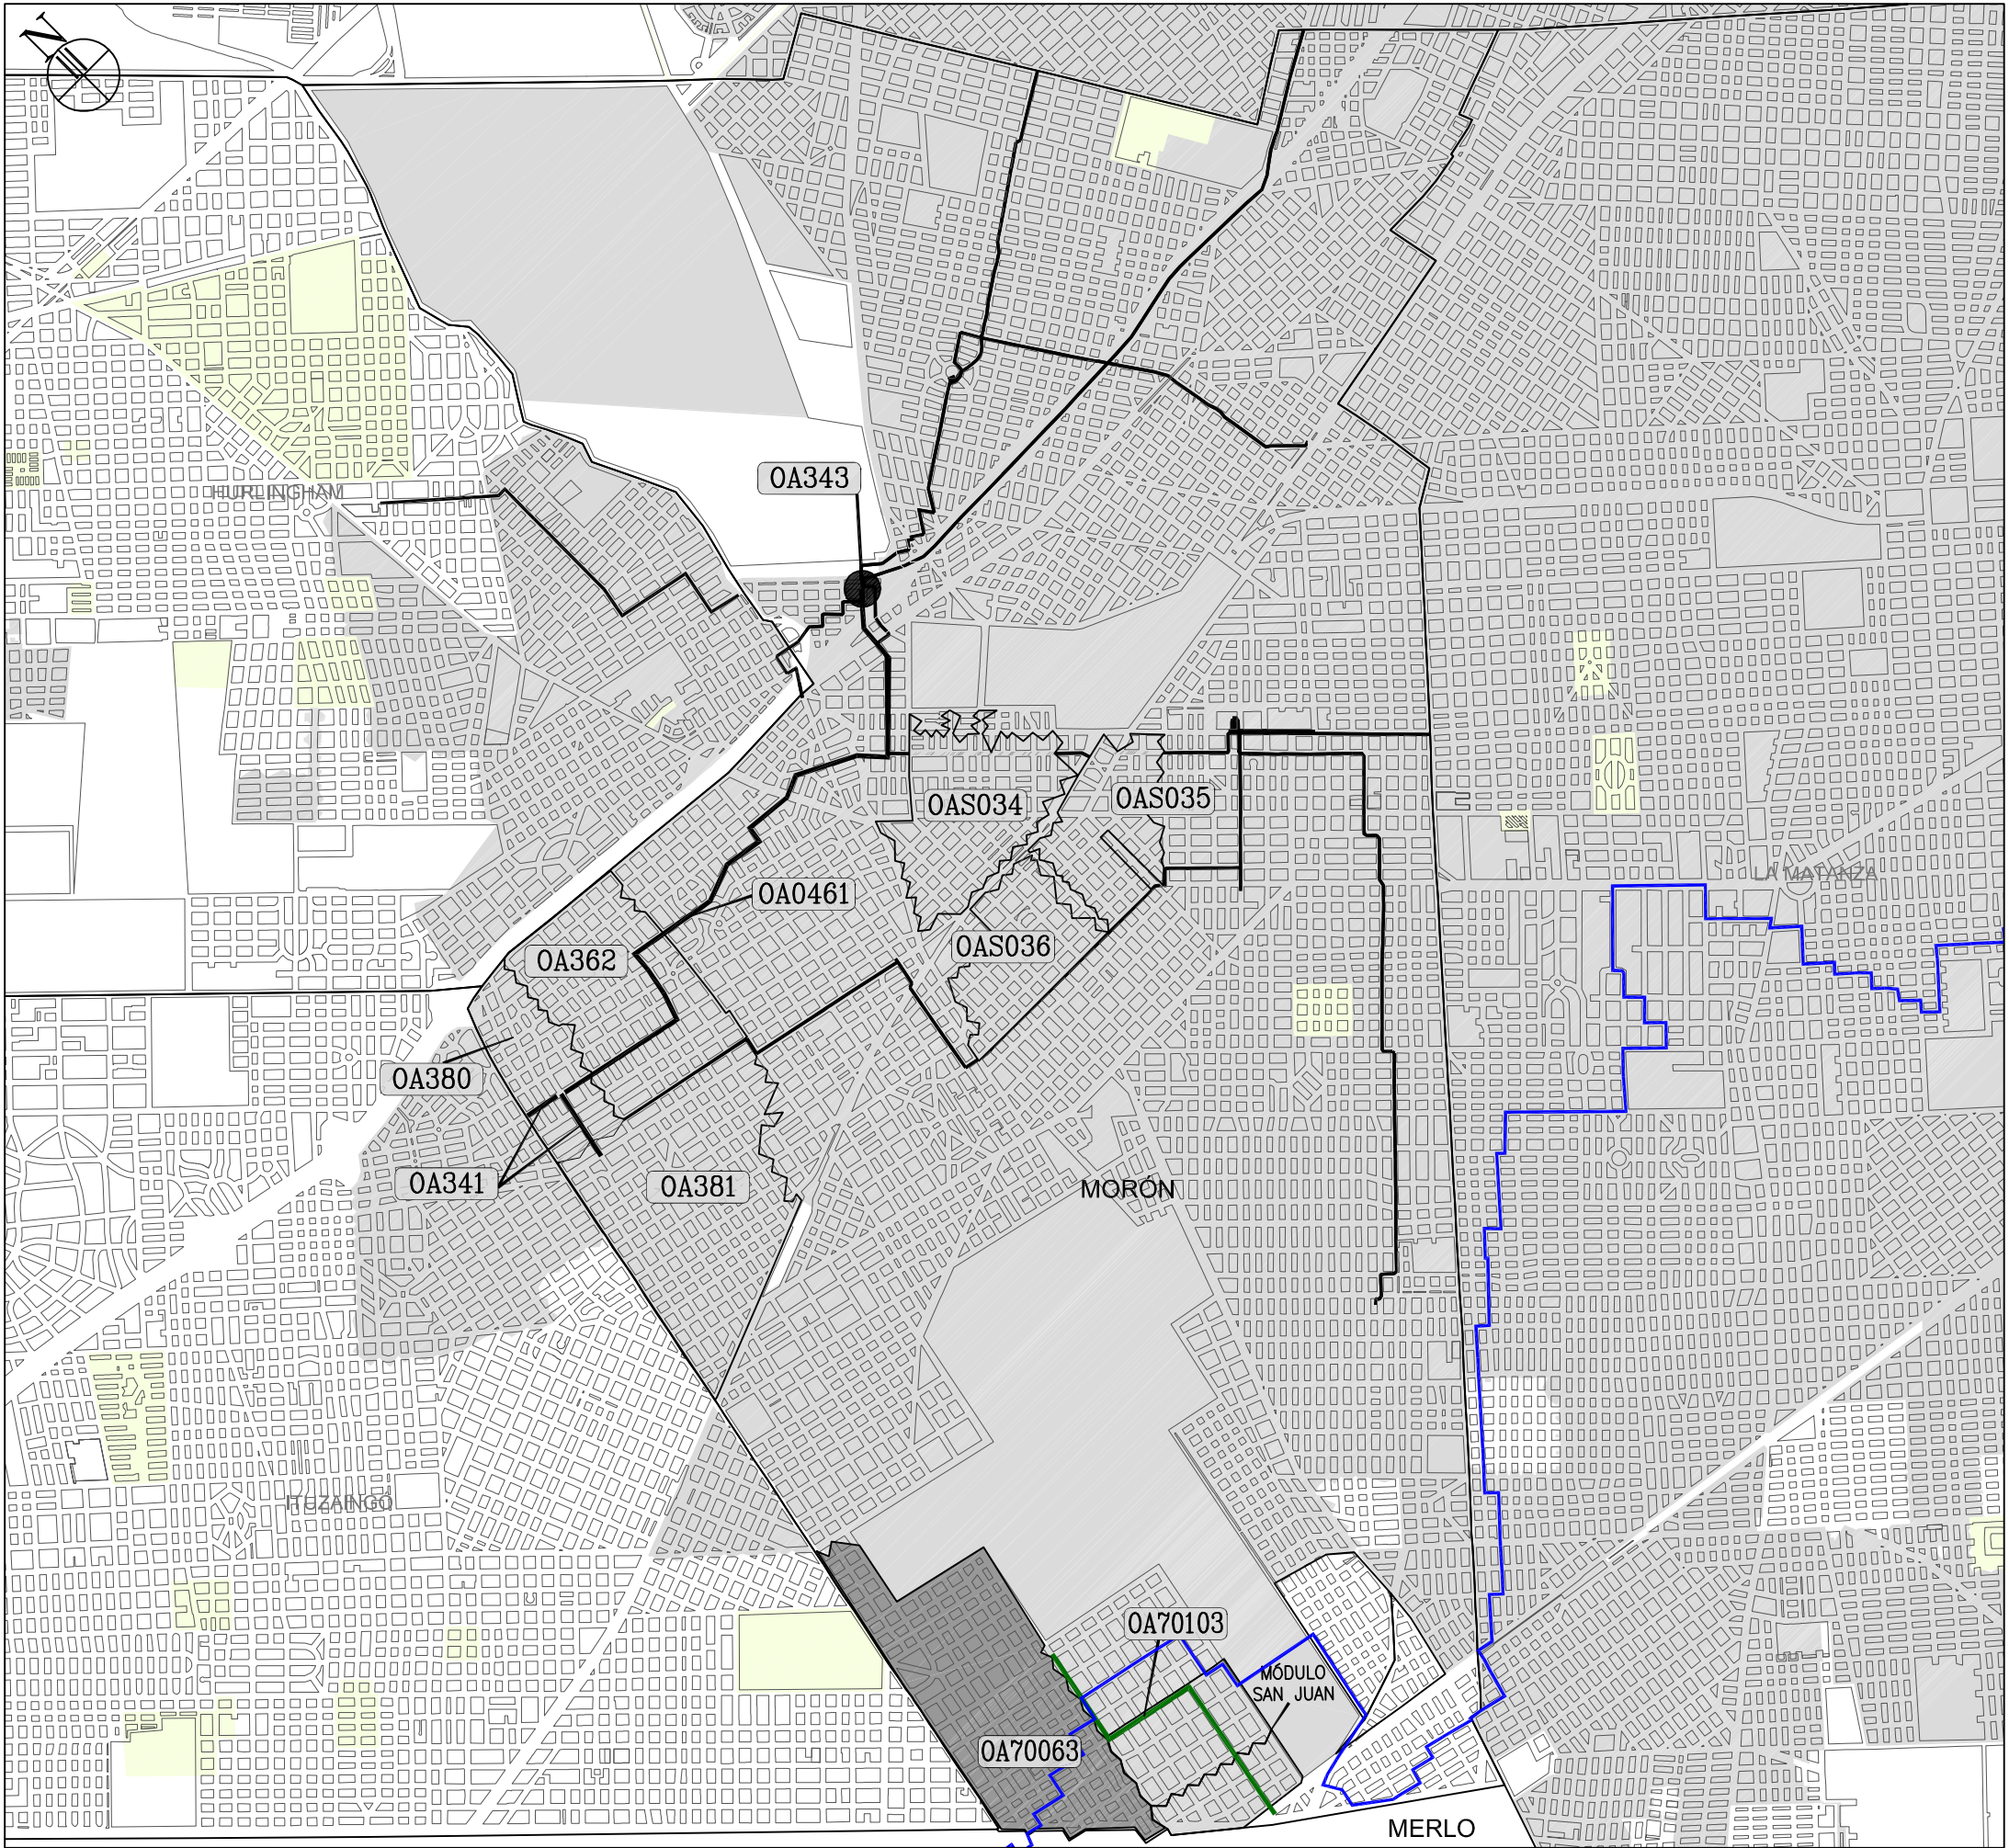



PROYECTOS Y OBRAS AySA

Estado al 30/06/18

BARRIO / LOCALIDAD		ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	P3	CÓDIGO PLAN DIRECTOR 63	AFECTACIÓN DE LA CUENCA	NOMBRE DE LA OBRA	FINANCIA	EJECUTA	HABITANTES	ESTADO	SUB-ESTADO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA)	PLAZO	OBSERVACIONES	FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	FIN REAL
RADIO SERVIDO																		
	MORÓN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OAS034	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA OESTE - MORÓN CENTRO 1	BID 2 TRAMO 2	AYSA	7.560	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPANÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. - C & E CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E.	25.994.192	300	100%	jun-13	ago-13	jul-14
	MORÓN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OAS035	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA OESTE - MORÓN CENTRO 2	BID 2 TRAMO 2	AYSA	4.176	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPANÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. - C & E CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E.	14.482.373	225	100%	jun-13	ago-13	sep-14
	MORÓN	MANTENIMIENTO Y MEJORAS	OAS036	-	SIN AFECTACIÓN A CMR	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA OESTE - MORÓN CENTRO 3	BID 2 TRAMO 2	AYSA	3.976	FINALIZADA	EN SERVICIO	COMPANÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. - C & E CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E.	12.772.102	210	100%	jun-13	ago-13	sep-14
	CASTELAR	EXPANSIÓN	OA0461	A-1-1.2-OB-000-3.4	SIN AFECTACIÓN A CMR	IMPULSIÓN ITUZAINGÓ - MERLO GÓMEZ	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	C & E CONSTRUCCIONES S.A.	105.730.372	350	100%	abr-13	ago-13	nov-14
	CASTELAR	EXPANSIÓN	OA341	A-1-1.2-OB-000-3.5	SIN AFECTACIÓN A CMR	IMPULSIÓN MERLO GÓMEZ 1 AYERZA E ITUZAINGÓ UDAONDO RESTO	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	GADES S.A.	28.231.900	549	100%	jul-14	sep-14	mar-16
	EL PALOMAR	EXPANSIÓN	OA343	A-1-1.2-OB-000-3.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	AMPLIACIÓN ESTACIÓN ELEVADORA MORÓN	AYSA	AYSA		FINALIZADA	EN SERVICIO	CONORVIAL S.A.	59.144.690	612	100%	dic-12	mar-13	ago-16
	CASTELAR	EXPANSIÓN	OA362	A-1-1.2-RS-MO-3.3.2.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA AYERZA 2A	AYSA	AYSA	8.900	FINALIZADA	EN SERVICIO	TECNIPISOS S.A. - ALESTE S.A. - U.T.E.	50.461.579	280	100%	may-14	ago-14	jul-15
	CASTELAR	EXPANSIÓN	OA380	A-1-1.2-RS-MO-3.3.2.2	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA AYERZA 2B	AYSA	AYSA	2.352	FINALIZADA	EN SERVICIO	VNP SANITARIOS S.A.	16.969.062	180	100%	dic-13	ene-14	oct-14
	CASTELAR	EXPANSIÓN	OA381	A-1-1.2-RS-MO-3.7.1	SIN AFECTACIÓN A CMR	RED SECUNDARIA DE AGUA AYERZA 1	AYSA	AYSA	11.600	FINALIZADA	EN SERVICIO	GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - OSHI S.A. - U.T.E.	88.805.477	599	100%	jul-14	sep-14	dic-17
TOTAL													402.591.746					
OBRAS FINALIZADAS EN PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO																		
	CASTELAR	EXPANSIÓN	OA70063	A-1-1.2-RS-MO-3.7.6.2	AFECTACIÓN TOTAL A CMR	RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA MERLO GOMEZ	AYSA	AYSA	12.500	FINALIZADA	FALTA PUESTA EN SERVICIO	APCO S.A.	76.243.964	390	100%	oct-16	dic-16	may-18
TOTAL													76.243.964					
OBRAS CONTRATADAS / EN EJECUCIÓN																		
	CASTELAR	EXPANSIÓN	OA70103	A-1-1.2-RS-MO-3.8.1	AFECTACIÓN PARCIAL A CMR	RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO PAZ	AYSA	AYSA	3.600	EN EJECUCIÓN		COMPANÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A.	17.890.273	300	84%	mar-17	may-17	
TOTAL																		
